

INFORME DE GESTION

El objetivo fundamental de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, es el de mantener, mejorar, diseñar, y construir obras de infraestructura de uso público, haciendo un uso óptimo y eficiente de los recursos asignados. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante lo corrido del año 2017, la Secretaria de Infraestructura ha realizado ha continuado ejecutando las gestiones pertinentes para el control del avance de los diferentes proyectos.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el Segundo trimestre de 2017.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos, a la fecha la Secretaria de Infraestructura ha realizado los análisis de precios unitarios de 40 Barrios de 65 que se deben realizar.

Se espera que al finalizar el mes se pueda tener el unificado, para poder conocer el valor a invertir.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	0

La Secretaria de infraestructura adelanta todo el proceso para que en el segundo semestre se pueda realizar la contratación y poder dar cumplimiento a este indicador.

1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

La Secretaría de Infraestructura, en el primer semestre de 2017 no ha requerido ningún predio para los proyectos desarrollados, por lo tanto el % de cumplimiento es del 100%.

1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentra todos los **diseños, estudios, consultorías e interventorías** para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
203 de 2017	ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES PARQUE DE LOS NIÑOS, SECTOR CANCHA DE TENIS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 49.950.797,00	22/06/2017	21/07/2017

Igualmente se continua con la supervision de las siguientes obras:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
080 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES DE DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE	\$ 104.999.928,8	27/03/2017	24/07/2017

	BUCARAMANGA.			
092 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 88.372.425	14/09/2016	20/08/2017

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" por valor de \$ 2.191.797.569,18, valor que comprende Obra e interventoria, actualmente se encuentra en pagina WEB y sera adjudicado la obra el día 04 de Julio de 2017 y la Interventoria el 05 de Julio de la presente vigencia.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	0

Se espera darle cumplimiento a este indicador, en el segundo semestre de la presente vigencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
175 de 2017	"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y PAISAJÍSTICOS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 2.070.279.719	16/06/2017	15/10/2017

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	1	1

Con la contratación de los estudios y diseños, se da cumplimiento a este indicador, además este proceso también se reportó a los siguientes indicadores:

- ✓ Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. (1)

- ✓ Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. (100%)

3.2. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
356 de 2015	CONSTRUCCION FASE I DE OBRAS DE MITIGACION GEOTECNICA EN EL BARRIO DE VILLAS DE SAN IGNACIO Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER CONVENIO MUNICIPIO DE BUACARAMANGA Y DPS - FONADE	\$ 1.889.653.032,5	17/04/2017	16/08/2017

Estado: en ejecución, avance de obra; 35%

Las principales actividades realizadas en cumplimiento de este contrato; excavaciones, rellenos, construcción de anclajes y construcción de muros anclados y pantallas ancladas.



- ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	20	1	1

El cumplimiento de este indicador obedece a la ejecución del contrato antes mencionado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000,00	03/05/2017	02/11/2017

Estado: En ejecución, avance del 15%

El objeto del presente convenio es el Sistema audiovisual, amplificación de sonido y obras civiles y acabados del vestíbulo,

En cumplimiento se están haciendo los pedidos de importación involucrados en el objeto del contrato. Una vez realizada esta importación, se suspenderá el contrato y se reanudará cuando los equipos lleguen al sitio de obra, para proceder a su instalación.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2017	LOGRO 2017
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	1	1

El cumplimiento de este indicador obedece a la ejecución del contrato antes mencionado.

4.2 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
19 de 2017	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	§ 3.321.213.590,53	15/02/2017	29/12/2017

Estado: En ejecución, avance del 42.8%

Se ha continuado realizando las labores de Mantenimiento a través de 30 parqueros distribuidos en 42 Parques y Zonas verdes que se relacionan a continuación:

COMUNA	NOMBRE DEL PARQUE	DIRECCION	BARRIO
1	PARQUE DEL KENNEDY	CALLE 1C CON CRA 14	KENNEDY
3	SAN FRANCISCO	CRA 21 ENTRE BOULEVAR SANTANDER Y BOLIVAR	SAN FRANCISCO
3	CRISTO REY	CRA 18 ENTRE CALLE 9 Y 10	COMUNEROS
4	PARQUE GIRARDOT Y GLORIETA DE LA CRA 9	CARRERA 6 CON CALLE 26 Y CARRERA 9 CON QUEBRADA SECA	GIRARDOT Y CENTRO
5	LA VIDA	CALLE 45 CRR 1	CAMPOHERMOSO
6	PARQUE LAS TRES B Y PARQUE PERIODISTAS	CARRERA 17 CON CALLE 47	CENTRO
6	PARQUE CORONA, CEIBA Y MARCELINO GILBERT	CARRERA 28A CON CALLE 67A	LA SALLE

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal


10	PARQUE EL DIAMANTE 2	CALLE 86 CON CARRERA 24	DIAMANTE 2
10	PARQUE LOS ENAMORADOS, PATINODROMO Y MERCARUSAN DE PROVENZA	CARRERA 21B CALLE 110	PROVENZA
11	PARQUE PORVENIR I Y II	CALLE 105 CON CARRERA 9	PORVENIR
12	PARQUE SAN PIO	Cra 33 CII 45	CABECERA
12	PARQUE LOS SARRAPIOS	Cra 38 CII 45	CABECERA
12	PARQUE DE LOS LEONES	Cra 39 CII 41	CABECERA
12	PARQUE DE LAS PALMAS	CARRERA 32 CALLE 49	CABECERA
12	PARQUE TURBAY	CARRERA 27 CALLE 49	SOTOMAYOR
12	PARQUE DIVINO NIÑO, ZONA VERDE BANCOMEVA, ZONA VERDE OFTALMOLOGICA Y ZONA VERDE CLUB UNION	Cra 32 CII 63	CONUCOS
13	PARQUE BOLIVAR	Cra 22 CII 37	BOLIVAR
13	PARQUE ANTONIA SANTOS	Cra 22 CII 33	ANTONIA SANTOS
13	PARQUE DE LOS NIÑOS	Cra 27 CII 32	ANTONIA SANTOS
13	PARQUE LAS AMERICAS	Cra 38 CII 33	ALVAREZ
13	GLORIETA ESTADIO Y GLORIETA UIS	CARRERA 30 CALLE 14 Y CARRERA 27 CALLE 14	SAN ALONSO
15	ROMERO	CALLE 45 CON CRR 11 Y 12	GARCIA ROVIRA
15	GARCIA ROVIRA	CALLE 36 Y 37 ENTRE CRR 10 Y 11	GARCIA ROVIRA
15	CENTENARIO	CALLE 32 Y 33 ENTRE CRR 18 Y 19	CENTRO
15	SANTANDER	CALLE 35 Y 36 ENTRE CRR 19 Y 20	CENTRO
17	LAS PALMAS-LOS VENADOS	CALLE 55 CON CRR 6 OCC-Y - CALLE 57 CON CRR 7 OCC	MUTIS
17	ESTORAQUES I - II	CALLE 58 A CON CRR 43 W-CALLE 59 CON CRR 42 W	ESTORAQUEZ
17	JORGE ARENAS PEREZ-LOS FUNDADORES	CRR 3W CALLE 63- CALLE 62 CRR 7W	MUTIS

✓ **Parqueros:**

Parque Cristo Rey:

Informe de **GESTIÓN**


Ante el Honorable
Concejo Municipal

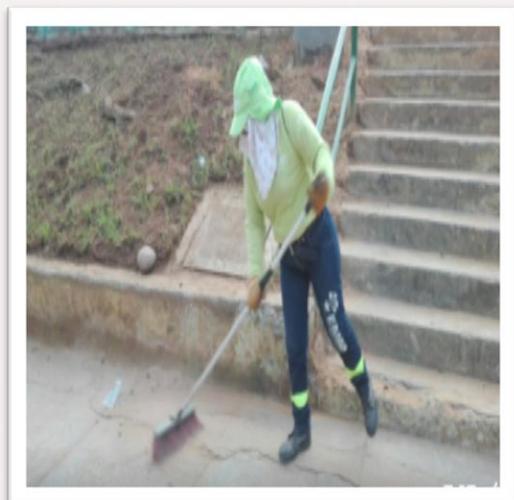

Parque Girardot:



Parque las Cigarras:




Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



✓ **Cuadrillas:**


Zona Verde Hospital Norte

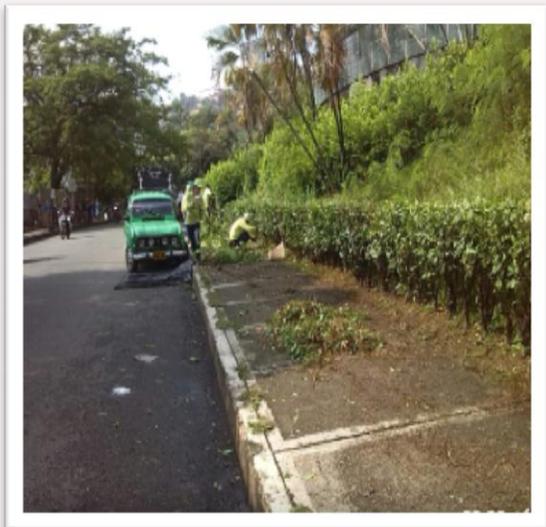

Zona Verde y Parque la Independencia

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

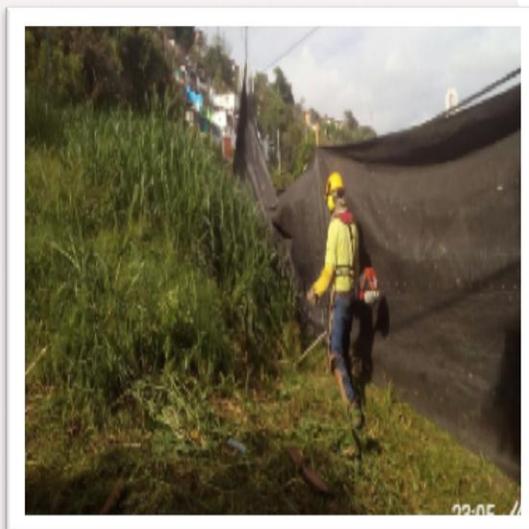

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
62 DE 2017	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 200.519.602	29/03/2017	28/09/2017

Estado: En ejecución, avance del 23.5%

De los 34 parques a intervenir, se han intervenido los siguientes parques:

- ✚ Parque de los Niños
- ✚ Parque de las Palmas
- ✚ Parque San Pio
- ✚ Parque Turbay
- ✚ Parque Benjamín Herrera
- ✚ Parque las Cigarras
- ✚ Parque San Francisco
- ✚ Parque Antonia santos

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Parque Cigarras:



Parque las Palmas:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
169 DE 2017	PODA Y TALA DE ÁRBOLES DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 488.039.812,62	30/05/2017	29/12/2017

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Este contrato cuenta con dos cuadrillas coordinadas por un Ing. Forestal, un Tecnólogo en Salud Ocupacional, 4 podadores, 12 repicadores, vehículo para transporte de herramienta y personal, camión para recolección de residuos vegetales, camión carro canasta contratado parcialmente para trabajos especiales.

Con corte a 30 de Junio de 2017, se han realizado 99 podas y 22 talas de árboles.

📍 Villa Helena



📍 Carrera 26 con 33



✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

El cumplimiento de este indicador obedece a los contratos que se encuentran en ejecución.

- **Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
556 de 2015	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN 12 BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.499.371.237,74	27/03/2017	22/05/2017

Estado: en ejecución, avance de obra: 70%

SALONES COMUNALES INTERVENIDOS:

- El Rocío: 100%
- Porvenir: 90%
- Santander: 80%
- Provenza: 65%
- Kennedy: 15%
- Regaderos Norte: 10%

SALONES COMUNALES PRÓXIMOS A INTERVENIR:

- La Esperanza II
- San Cristóbal

SALONES COMUNALES CONTRATADOS QUE NO SE VAN A INTERVENIR

(problemas jurídicos, técnicos y/o de legalidad de la propiedad)

- La Feria
- Pan de Azúcar
- Ciudad Bolívar
- Norte Bajo

Después de realizar una evaluación económica respecto al alcance de los trabajos, se pudo precisar que los recursos disponibles en el presupuesto contractual no son

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

suficientes para atender las necesidades de la totalidad de los salones, y así mismo se detectó inconvenientes de tipo jurídico y de propiedad que no permiten la inversión en varios de los salones comunales mencionados. En la actualidad se está trabajando de manera conjunta para detallar el alcance final de las obras a ejecutar.


Dentro de las principales actividades ejecutadas están: Demoliciones de piso, andenes, enchapes, mampostería, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de cubiertas existentes, desmonte de carpintería metálica requerida, revisión de redes eléctricas, redes hidrosanitarios, mantenimiento de carpintería metálica, lavado de mampostería a la vista, limpieza de elementos estructurales, pintura, descapote y replanteo de piso base, suministro e instalación de sub-base granular, construcción de andén en concreto, desmonte de cerramiento metálico, mantenimiento y pintura de carpintería metálica, mantenimiento, ajustes y/o construcción de redes hidrosanitarias, puntos hidrosanitarios, friso de muros, suministro e instalación de enchape cerámico para baños, instalación de aparatos sanitarios, construcción de andenes, instalación de pisos en porcelanato, y cambio de cubiertas, entre otras.

A continuación el registro fotográfico de algunos centros de salud intervenidos:

EL ROCÍO



PORVENIR

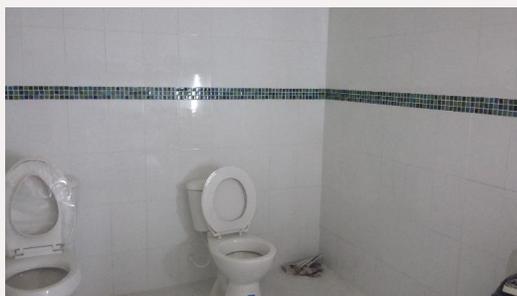

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

 **SANTANDER**



 **PROVENZA**



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos.	100	30	0

A la fecha se adelantan varios procesos los cuales podrán ser reportados en el segundo semestre de la presente vigencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- **Mantenimiento Malla Vial Urbana**

La Secretaria de Infraestructura adelanta el proyecto SI-LP-004-2017 “OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. Por valor \$ 1.253.322.464, igualmente la Interventoría SI-CM-005-2017 “INTERVENTORIA A LAS OBRAS” por valor \$ 113.994.563,00, a la fecha estos proceso se encuentran en evaluación de propuestas.

✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	16.500	0

Se espera realizar el reporte de cumplimiento a este indicador en el segundo semestre de la presente vigencia.

- **Megaobras de Infraestructura Vial**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	7 de ABRIL de 2017

Estado: Avance de Obra: 89.94% ejecutado

En virtud de la orden judicial mencionada y ante la imposibilidad de continuar con las obras en el sector de la Escuela La Normal de Bucaramanga y la Glorieta, el Municipio de Bucaramanga suspendió la ejecución de las obras INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, documento de fecha 24 de Marzo de 2017.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000,00 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 Adicional 3. \$ 279.998.312,00 Adicional 4. \$ 503.068.682,00 Valor Total 14.239.454.413,02	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

Estado: Avance de obra: 95%

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR EL CONTRATISTA

Tramo 1. Intercambiador de la Puerta del Sol – Acceso Norte Viaducto García Cadena.

- Localización, replanteo y control topográfico permanente con una comisión.
- Aplicación de pintura en barandas aproche Nor-Occidental, puente de la Cra 33.
- Aplicación de pintura en barandas de muros ubicados en el lote CP-06 (Autopista Sur-Norte).
- Instalación de barandas en aproche Sur-Occidental del puente de la Cra 33.
- Instalación de barandas escaleras junto a puente de la Cra 33.
- Instalación de barandas en escaleras Barrio Antonia Santos.
- Estabilización de talud Pila 1 del viaducto la Unión.
- Empradizado de talud sobre aleta Sur-Oriental del puente de la Cra 33.
- Empradizado de lote CP-06.
- Construcción de muro de contención en mampostería estructural (Autopista Sur-Norte).

Tramo 2. Acceso Norte Viaducto García Cadena - Acceso Sur Viaducto García Cadena.

- Aplicación de pintura en barandas del Viaducto García Cadena, (Autopista Norte-Sur).

Tramo 3. Acceso Sur Viaducto García Cadena – Puente de Provenza.

- Localización, replanteo y control topográfico permanente a lo largo de todo el tramo.
- Fresado de pavimento existente en la entrada al Barrio Diamante.
- Instalación de mezcla densa en caliente MDC-2 modificado en la entrada al Barrio Diamante.
- Fresado de pavimento existente en la salida del Barrio Diamante.
- Instalación de mezcla densa en caliente MDC-2 modificado en la salida del Barrio Diamante.
- Instalación de pintura para señalización de vía en la salida del Barrio Diamante.
- Reparación de pavimento nuevo, (Autopista Norte - Sur) sector Motoreste.
- Instalación de mezcla densa en caliente MDC-2 modificado, frente al Colegio 1,2,3, sector del deprimido.
- Construcción de separador en los accesos al barrio Diamante.
- Instalación de espacio público en los accesos al barrio Diamante.
- Instalación de acero de refuerzo para construcción de New Jersey ubicado en el sector del deprimido (Sentido Sur - Norte).
- Instalación de acero de refuerzo para construcción de New Jersey ubicado en el sector del deprimido (Sentido Norte - Sur).
- Construcción de New Jersey ubicado en el sector del deprimido (Sentido Norte-Sur).
- Tensionamiento de pantallas ubicadas en el sector del deprimido (Sentido Sur-Norte).
- Construcción de muro de contención ubicado en la entrada al barrio San Pedro, sector del Deprimido.
- Instalación de acero de refuerzo y construcción de canal para recolección de aguas lluvias junto a cerramiento del conjunto residencial Colseguros (Autopista Norte-Sur).
- Construcción de bordillo en concreto frente al colegio 1,2,3.

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Foto 1: Instalación de mezcla densa en caliente MDC-2 modificado en la entrada al Barrio Diamante.



Foto 2: Instalación de mezcla densa en caliente MDC-2 modificado en la salida del Barrio Diamante (Sentido Sur – Norte).



Foto 3: Instalación de acero de refuerzo para construcción de New Jersey ubicado en el sector del deprimido (Sentido Sur - Norte).

✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	2	0

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador le Mesón de los Búcaros, se espera poder dar cumplimiento al finalizar la vigencia.

6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaria de Infraestructura realizó: Mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural que contempla la Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas, actividades realizadas con la Maquinaria disponible (3 Minicargador, 1 Motoniveladora y 2 Volquetas) Adscrita a este Despacho.

Informe de **GESTIÓN**


Ante el Honorable
Concejo Municipal

SEMANA	LUGAR - VEREDA - CORREGIMIENTO - URBANO (U)	C N°	ACTIVIDADES
ABR 3-7	V. SAN PEDRO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. LOS SANTOS	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. RETIRO GRANDE	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
ABR 10-12	V. SAN PEDRO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. LOS SANTOS	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. RETIRO GRANDE	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
ABR 17-21	V. SAN PEDRO BAJO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. LOS SANTOS Y RAMALES	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. RETIRO GRANDE	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
ABR 24-28	V. LOS ANGELINOS Y RAMALES	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. EL PEDREGAL	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

SEMANA	LUGAR - VEREDA -CORREGIMIENTO - URBANO (U)	C N°	ACTIVIDADES
MAY 2-5	V. BOLARQUI BAJO	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. SANTA BARBARA -UDES	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
MAY 8-12	V. BOLARQUI BAJO	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	BARRIO EL CRISTAL BAJO	U	Recogida de escombros.
	CALLE 45	U	Limpieza de cunetas y Derrumbes
	VIA A MORRORICO	U	Limpieza de cunetas y Derrumbes
MAY 15-19	V. BOLARQUI BAJO	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. SANTA BARBARA -UDES	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
MAY 22-26	V. SANTA BARBARA -UDES	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	BARRIO ALBANIA-DERRUMBE	U	Limpieza de cunetas y Derrumbes
	VIA A CUCUTA-DERRUMBE	U	Limpieza de cunetas y Derrumbes
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

SEMANA	LUGAR - VEREDA -CORREGIMIENTO - URBANO (U)	C N°	ACTIVIDADES
JUN 5-9	V. CUCHILLA ALTA	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
JUN 12-16	V. CUCHILLA ALTA	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	V. BOLARQUI ALTO	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	PARQUE SANTANDER	U	Transporte de estibas y material Parque Santander
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
JUN 20-23	V. BOLARQUI ALTO	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos
JUN 27-30	V. BOLARQUI ALTO	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de vías Internas.
	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SECTOR V. LA MALAÑA- LA ESCUELA	3-U	Suministro y transporte en Carrotanque de agua potable a comunidad de Sector Occidental V. La Malaña. Y riego de Parques Urbanos

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140

El cumplimiento a este indicador obedece al mantenimiento rutinario con la maquinaria del Municipio, de acuerdo a la programación por parte de este Despacho.

1.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
50 de 2016	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.971.561.921,00	04/10/2016	03/06/2017

Estado: Avance de obra: 85.55% en ejecución

Comprende la construcción del alcantarillado pluvial y sanitario y la canalización de aguas lluvias esta obra requiere recursos adicionales por valor de \$ 900.000.000, para desarrollar las siguientes actividades:

- ✚ Terminar la construcción del alcantarillado y construcción de gradería con tres (3) peatonales.
- ✚ Construcción del alcantarillado y gradería de seis (6) peatonales faltantes
- ✚ Recuperación del pavimento de la vía principal con diseño nuevo de estructuras y pavimento alfastico en caliente y mejoramiento de sub-rasante.



6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES
Enero	1160	1037	2	109
Febrero	1029	970	2	129
Marzo	1188	1055	2	61
Abril	998	557	4	113
Mayo	1039	681	3	438
Junio	902	548	3	397
TOTAL	6316	4848		1247
TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS				6316
TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS				6095

Se continúa con la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
54 de 2016	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN	EICON LTDA (\$473.843.532)	16 de Junio de 2016	15 de Abril de 2017
55 de 2016	DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	EME INGENIERIA S.A.(\$829.386.532)		
57 de 2016		IGS INGENIERIA E.U.(\$446.808.720)		

Estado: Avance de obra: 95% en ejecución

SECTORES A INTEVENIR

- ✓ **GRUPO EICON** Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2
- ✓ **GRUPO EME** Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ✓ **GRUPO IGS** Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
003 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL –GRUPO 1 –CENFER INTERCAMBIADOR EL BUENO	\$ 3.296.758.330,00	15/02/2017	14/07/2017

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Estado: Avance de obra: 80% en ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
004 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL. GRUPO 2 – INTERCAMBIADOR EL BUENO INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL	\$ 2.881.620.453,00	15/02/2017	17/07/2017

Estado: en ejecución 60% avance de obra



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
008 de 2017	PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5	\$ 1.239.726.530,00	16/02/2017	15/07/2017

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Porcentaje Ejecución:
Porcentaje Ejecución:

Bavaria II - 70%
Villa del Prado – 90%



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
164 de 2017	CONTRATAR ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 529.288.455,09	23/05/2017	23/12/2017

Porcentaje Ejecución: 15%



PROCESOS ADJUDICADOS PROXIMOS A INICIAR

- SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ETAPA 1 COMUNA 2

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Valor: \$ 1.181.332.040
Fecha de Adjudicación: Marzo 22 de 2017
Contratista: CELSA S.A.S
Barrios a Intervenir: Esperanza I, II, III, Villa Helena - San Cristóbal, Vía Matanza desde CAI la Virgen, Lizcano I y II, Los Ángeles, Mirador del Norte Y Norte Club.

✚ INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ETAPA 1 COMUNA 2

Valor: \$ 257.193.399,00
Fecha de Adjudicación : Mayo 02 de 2017
Contratista: CIVAREL LTDA
Zona a intervenir: Calle 33 a la Calle 37 Y Carrera 11 a la Carrera 19

✚ PLAN ILUMINADOS CENTRO



Luminarias a Cambiar: 363 de tecnología Led de 80W
Inversión: \$ 388.033.824
Ahorro en Energía: 36,3 Kw 56% - 13,068 Kw-hr /mes

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

PROYECTOS PROXIMOS A INICIAR

❖ CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 CENTROABASTOS – CAFÉ MADRID

Valor Grupo 1 – EICON LTDA \$ 2.621.711.740,95

Valor Grupo 2 – EME INGENIERIA S.A. \$ 1.813.213.811,70

Proceso: SI-LP-002-2017

Fecha de Adjudicación: Junio 22 de 2017

Plazo de Ejecución: 5 meses



PROCESOS PUBLICADOS EN LA PAGINA SECOP

🚦 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A LED - ETAPA 2 DEL BARRIO CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Valor: \$ 2.207.406.662,85

Proceso: SI-LP-009-2017

Fecha de Adjudicación: Agosto 22 de 2017

Plazo de Ejecución: 4 meses



PROYECTOS EN PROCESO PRE-CONTRACTUAL

CONCEPTO	VALOR
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CANCHAS DE LOS BARRIOS BETANIA, VILLALUZ CAMPESTRE, CAMPO MADRID, VILLA ALEGRÍA II, BOCAPRADERA, PARQUE CAFÉ MADRID, CRISTAL ALTO Y CRISTAL BAJO.	\$ 2.015.560.959
PARQUE LINEAL RIO DE ORO	\$ 900.581.787

PROYECTOS EN PROCESO DE DISEÑO

- ✚ SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A LED, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 5
- ✚ ILUMINACIÓN INTERACTIVA EN LA CRA 22 – ZONA DEL CALZADO
- ✚ ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA E INTERACTIVA – CALLE DE LOS ESTUDIANTES
- ✚ ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA E INTERACTIVA – PLAZOLETA IMCUT
- ✚ ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA – TANQUE DEL AMB PUERTA DEL SOL
- ✚ ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ARQUITECTÓNICA – PARQUE MORRORICO
- ✚ MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS: ESTADIO DE ATLETISMO, CANELOS, EL PORVENIR, VILLA ROSA, NUEVA GRANADA, BRISAS DEL MUTIS, MONTERREDONDO, CIUDAD VENECIA, CONQUISTADORES.
- ✚ ILUMINACIÓN DEL PARQUE LOS VENADOS EN EL BARRIO MUTIS.
- ✚ PROYECTO PILOTO ENERGÍA SOLAR.
- ✚ EXPANSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIIO	META 2017	LOGRO 2017
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	1.963
	Número de luminarias expandidas.	1.000	200	456
	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	15	4

Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	8	6
Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	98%

Se espera que en el segundo semestre de la presente vigencia, se realicen los reportes correspondientes a la contratación que se encuentra en página WEB para poder dar cumplimiento a los indicadores.

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
83 de 2016	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.727.512,65	14/09/2016	13/02/2017

Estado: en ejecución 82% avance de obra

La obra se encuentra en el piso 3 en detalles de acabados, en el piso 2 finaliza la parte eléctrica y se realizan acabados, en el piso 1 se trabaja en la parte eléctrica, banco de ductos, cielo raso y acabados.

Detalle de Actividades

- Se terminaron actividades de estuco, Pintura
- Se hizo cableado en bandejas porta cables,
- Se instalaron canaletas para cableado en el piso 3
- Se instalan las piezas sanitarias en los baños.
- Se instalan las lámparas
- Se colocan las divisiones en acero inoxidable en los baños del primer y segundo piso.
- Se instalan los sensores de movimiento.
- Se hace cableado interno en tubería, al igual se instalan las correspondientes bandejas porta cables.
- Se hacen excavaciones en el patio para el tendido de tubería eléctrica de 3" y comunic. de 2".
- Se hacen cajas de inspección en el patio.
- Se tiende cableado eléctrico 4.0 y 1.0.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

- En los salones del armerillo se adecuan baños, tuberías eléctricas externas, estuco y pintura.
- En las áreas de los parqueaderos se estuca, lija y Pintan las áreas del acceso.
- Se brecha la baldosa de porcelanato 60x60.
- Se hacen trabajos de detalles en obra.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
48 de 2017	COSNTRUCCIÓN DE 29 ALBERGUES TEMPORALES EN EL SECTOR EL CABLE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 969.608.469,00	21/05/2017	20/06/2017

Estado: en ejecución 99.9% avance de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

El día 30 de Junio se recibe la obra al Contratista y de igual manera se hace entrega de los albergues a cada una de las 29 familias beneficiarias del proyecto. Con la entrega física se hizo también la entrega y socialización del manual de convivencia, con el fin de garantizar la convivencia pacífica de los residentes.

Forma parte de la infraestructura entregada las siguientes actividades:

- Albergue provisional tipo mono espacio con salón, cocina, área de camas y baño.
- Servicios públicos de Agua/Alcantarillado, Gas (en trámite de instalación) y Energía, incluyendo los respectivos medidores.
- Obras de Urbanismo: Andenes, zonas verdes empradizadas y arborizadas, Bancas y Redes de servicios públicos.
- Manual de Convivencia

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Se realizaron los Convenios Interadministrativos, con el fin de GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS EXTRATOS 1, 2 Y 3 Y PILAS PUBLICAS.

Las empresas con las cuales ya cuentan con convenio son:

- EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A
- EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P
- LIMPIEZA URBANA S.A.

8. RELACIÓN DE PROCESOS EN CURSO EN EL SECOP EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

No.	No. PROCESO	TIPO PROCESO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	SI-LP-005-2017	LICITACIÓN PUBLICA	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 759.265.244	Pliego de Condiciones
2	SI-CM-006-2017	CONCURSO DE MERITOS	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 77.656.925	Proyecto de Pliegos
3	SI-LP-006-2017	LICITACIÓN PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CICLISTA UIS-PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.184.172.864	Proyecto de Pliegos
4	SI-SAMC-004-2017	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA CAM FASE I	\$ 183.602.886	Evaluación de Propuestas
5	SI-CMC-005-2017	MINIMA CUANTÍA	ADECUACIONES FÍSICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL ESPECIALIZADO CAME QUEBRADASECA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 29.309.961	Evaluación de Propuestas

9. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Enero a Junio de 2017, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

1. ACCIONES DE TUTELA:

Procesos Notificados:	14
Procesos tramitados	14
Fallos a favor de primera instancia	14
Procesos pendientes de fallo	01

Durante este periodo se cumplieron los siguientes fallos, con la ejecución de las obras ordenadas en las sentencias.

2009-0002	Juzgado 15 Administrativo	2009-0357	Juzgado 15 Administrativo
2009-0371	Tribunal Administrativo	2010-0365	Juzgado 1º Administrativo
2009-0001	Tribunal Administrativo	2003-1431	Juzgado 15 Administrativo
2010-0375	Juzgado 15 Administrativo	2009-0389	Juzgado 15 Administrativo

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el periodo

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2017-0029	16 P.M. con F.C.G.	Expedito Quijano	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2017-0050	5 C.M. Ejec.Sent.	Marciana Carrillo	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2017-0389	29 Civil Municipal	Defensoría del Pueblo	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado.
2017-0210	21 Civil Municipal	Luis Eduardo Carreño	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado..
2017-0197	8º Civil Municipal	Diseños y Montajes	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2017-0084	7º P.M. con ----- F.C.	Juan Sepúlveda	Se encuentra previo a decisión de 1ª instancia	En curso

2. ACCIONES POPULARES:

Procesos vigentes a cargo de la secretaria de infraestructura:	111
Procesos de Infraestructura, pendientes de cumplimiento:	28
Procesos de Infraestructura CUMPLIDOS	04

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2010-0171	6°	FALLO A FAVOR	No se condenó al Municipio	EJECUTORIADO
2016-0021	2°	FALLO EN CONTRA	En Apelación ante Tas	APELADO
2004-1043	15°	FALLO EN CONTRA	FALLO CUMPLIDO cierra Incidente Desacato	Archivado
2010-0167	6°	FALLO CUMPLIDO	FALLO CUMPLIDO	Archivado
2008-0273	6°	FALLO CUMPLIDO	FALLO CUMPLIDO	Archivado
2013-0288	1°	En Contra	FALLO CUMPLIDO	Archivado
2015-0205	8	EN CONTRA	En apelación ante el Tas	APELADO

En la Oficina Jurídica durante el periodo de Octubre a Diciembre se tramitaron las siguientes funciones relacionadas con la defensa judicial del Municipio:

DOCE (12) procesos de Acciones Populares. Se logró el **archivo** de estos procesos

CINCO (5) Demandas nuevas contestadas durante el periodo.

DOCE (12) diligencias de audiencias en los Juzgados (Audiencia de pacto de cumplimiento, audiencia de testimoniales, inspecciones judiciales)

CUATRO (4) tramites de pago a los actores Populares (Solicitud de CDP,RP proyección Resolución de Pago, Notificación)

NUEVE (9) procesos entregados para contratar obras

OCHO (5) Reuniones. Se asistió en representación de la Sec. Infraestructura

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

CUATRO (04) Comités. Asistencia a citación para Comité de Conciliación.

TRES (03) REUNIONES comités de Verificación cumplimiento fallos

Las funciones adelantadas para ejercer la defensa judicial del Municipio se resumen así:

Fallos a favor en acciones constitucionales	13
Fallos en Contra en acciones constitucionales	02
Trámite para cumplimiento judiciales (respuesta incidentes)	13
Asistencia a diligencias judiciales	23
Asistencia a Comités de Verificación	05
Asistencia a reuniones	17

10. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE JUNIO DE 2017

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 950.986.666,66	3,04
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	\$ 1.368.639.528,00	4,37
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 2.500.000.000,00	7,98
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 7.330.074.971,47	23,39
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 1.387.664.813,52	4,43%
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 17.795912515.80	56,80
TOTAL	\$ 31.333.278.495,45	100 %

11. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTUALIZACION REGISTROS PRESUPUESTALES	\$ 15.986.294.920,48

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 1.948.774.088,00
TOTAL	\$ 17.935.069.008.48
TOTAL INVERSION	\$ 49.268.347.503,83
