

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Enero 1 a Junio 30 de 2018

**SECRETARÍA
DE
INFRAESTRUCTURA**



INFORME DE GESTION

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante el Segundo Trimestre de la vigencia 2018.

La Secretaria de Infraestructura ejecutó y realizo las gestiones pertinentes para el control del avance de los diferentes proyectos.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el semestre de la vigencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos en las diferentes comunas:

Actualmente se encuentran en ejecución dos contratos con cargo a presupuestos participativos vigencia 2016, los cuales se relacionan a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
411 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 903.596.605,74 Adicional \$ 433.294.420,98	02/02/2018	23/08/2018

Estado: Avance de Obra: 43,76%

✓ ESCENARIO QUEBRADA LA IGLESIA

Avance de ejecución: 40.67%

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Piso en adoquín, bordillo placa juegos infantiles



Aplicación de Asfalto en caliente y mantenimiento
De módulos en malla

✓ **ESCENARIO BARRIO SAN LUIS**

Avance de ejecución **47.41%**



Bordillo confinamiento, piso en adoquín



Aplicación de Asfalto en caliente y
Mantenimiento de mallas

✓ **ESCENARIO BARRIO CONDADO DE GIBRALTAR**

Avance de ejecución: **24.47%**

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Mantenimiento de mallas



Construcción canaleta aguas lluvias

✓ ESCENARIO BARRIO EL ROCIO

Avance de ejecución **48.93%**



Demolición de andenes, pintura malla



Aplicación de Asfalto en caliente, Mantenimiento de cubierta, pintura graderías

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
412 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 613.301.169,82 Adicional \$ 306.845.384,58	02/02/2018	23/08/2018


Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Estado: Avance de obra: 34,61%

✓ **ESCENARIO BARRIO COMUNEROS**

Avance de ejecución: **29.99%**

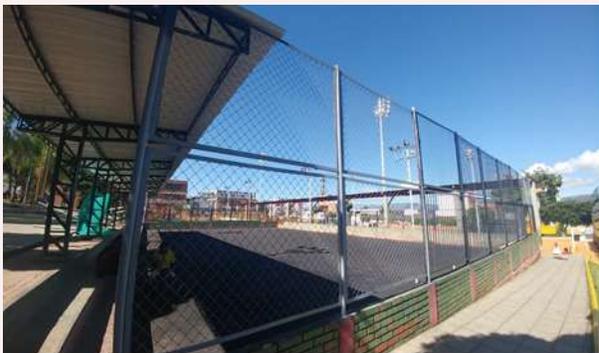

Mantenimiento de mallas – Cubierta gradería



Aplicación de Asfalto en caliente

✓ **ESCENARIO BARRIO ALFONSO LOPEZ**

Avance de ejecución **60.44%**



Aplicación de Asfalto en caliente y
Pintura gradería- Canaleta



Mantenimiento y pintura de mallas
y Modulo rejas-pintura muros

✓ **ESCENARIO BARRIO VILLA DEL PRADO**

Avance de ejecución **47.53%**

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Mantenimiento cerramiento y pintura de Graderías



Aplicación de Asfalto en caliente Pintura de muros –
Canaleta

✓ ESCENARIO BARRIO SAN MIGUEL

Avance de ejecución **33.11%**



Mantenimiento cerramiento en malla



Nivelación y conformación - Relleno compactado

✓ ESCENARIO BARRIO EL PRADO (SAN PIO)

Avance de ejecución **12.52%**



Adecuaciones Muro y acceso a cancha Costado occidente cancha basquetbol



Construcción canaleta aguas lluvias

A la fecha se encuentra estructurada la atención de necesidades con relación a las obras viabilizadas en los grupos de presupuestos participativos vigencias 2016 y 2017. En la presente vigencia se tiene programada la contratación de dichas obras, las cuales se realizaran en nueve grupos de acuerdo a actividades afines, como se relacionan a continuación:

1. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER.

No. Proceso SI-LP-003-2018

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 930.028.923,00	LICITACION	SECTOR URBANO	SECTOR URBANO
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 58.932.414,00	LICITACION	SAN CRISTOBAL	COMUNA 2
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 71.793.490,00	LICITACION	TRANSICION	COMUNA 2
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 117.980.357,00	LICITACION	GOMEZ NIÑO	COMUNA 6
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 68.106.106,00	LICITACION	JARDINES DE COAVICONSA	COMUNA 11
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 101.508.839,00	LICITACION	ANTONIA SANTOS CENTRO	COMUNA 13
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 50.015.452,00	LICITACION	ALBANIA	COMUNA 14
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 82.221.369,00	LICITACION	MORRORRICO	COMUNA 14
ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS	\$ 72.588.201,00	LICITACION	EL DIVISO	COMUNA 14
VALOR TOTAL MALLA VIAL URBANA	\$ 1.553.175.151,00			

2. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

No. Proceso SI-LP-002-2018

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 66.179.088,64	ADJUDICADO	VEREDA LA SABANA (SECTOR HOBO EL PARAISO)	CORREGIMIENTO I
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 66.179.088,64	ADJUDICADO	VEREDA ANGELINOS SECTOR BOSCONIA	CORREGIMIENTO I
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 66.179.088,64	ADJUDICADO	VEREDA ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO	CORREGIMIENTO I
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 91.988.639,44	ADJUDICADO	VEREDA LA MALAÑA SECTOR HOGAR SANTA TERESITA	CORREGIMIENTO III
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 92.195.086,14	ADJUDICADO	VEREDA SANTOS PARTE ALTA - SECTOR EL ESPINO	CORREGIMIENTO II
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 75.392.370,98	ADJUDICADO	VEREDA RETIRO CHIQUITO CURVA LA CRUZ	CORREGIMIENTO III
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 98.055.769,78	ADJUDICADO	VEREDA LA ESMERALDA (BENJAMIN FLOREZ)	CORREGIMIENTO I
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 43.508.538,72	ADJUDICADO	VEREDA LA ESMERALDA (RAIMUNDA DELGADO)	CORREGIMIENTO I
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 87.134.243,06	ADJUDICADO	VEREDA PEDREGAL (SECTOR LA PENDIENTE)	CORREGIMIENTO III
REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	\$ 158.479.038,94	ADJUDICADO	VEREDA GUALILO ALTO - SECTOR COLMUNDO RADIO	CORREGIMIENTO III
MALLA VIAL RURAL 2018				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 432.067.682,72	ADJUDICADO		CORREGIMIENTO I, II Y III
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS	\$ 1.277.358.635,70			

3. "MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

GRUPO No 1	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
PROYECTO				
MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 175.482.650,00	VIABILIDAD JURIDICA	VILLA ROSA	COMUNA No 1
MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 177.146.005,00	VIABILIDAD JURIDICA	GIRARDOT	COMUNA No 4
INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	\$ 67.350.421,00	VIABILIDAD JURIDICA	GIRARDOT	COMUNA No 4
MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 61.921.935,00	VIABILIDAD JURIDICA	LA CEIBA	COMUNA No 6
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	\$ 104.496.144,00	VIABILIDAD JURIDICA	LA CEIBA	COMUNA No 6
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	\$ 95.296.885,00	VIABILIDAD JURIDICA	BRISAS DEL MUTIS	COMUNA No XX
INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	\$ 66.812.652,00	VIABILIDAD JURIDICA	BRISAS DEL MUTIS	COMUNA No XX
INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	\$ 129.496.328,00	VIABILIDAD JURIDICA	VILLA HELENA I	COMUNA No 2
VALOR GRUPO No 1	\$ 878.003.020,00			
GRUPO No 2	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
PROYECTO				
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	\$ 69.878.565,00	VIABILIDAD JURIDICA	VEINTE (20) DE JULIO	COMUNA No 1
MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 197.418.253,00	VIABILIDAD JURIDICA	DIAMANTE I	COMUNA No 9
MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO	\$ 137.883.663,00	VIABILIDAD JURIDICA	LA LIBERTAD	COMUNA No 9
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	\$ 111.469.356,00	VIABILIDAD JURIDICA	LA LIBERTAD	COMUNA No 9
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	\$ 178.871.134,00	VIABILIDAD JURIDICA	ALTOS DEL CACIQUE	COMUNA No 9
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	\$ 96.043.600,00	VIABILIDAD JURIDICA	BOSQUES DEL CACIQUE	COMUNA No 9
VALOR GRUPO No 2	\$ 791.564.571,00			
VALOR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017	\$ 1.669.567.591,00			

4. OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

No. Proceso SI-LP-005-2018

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MALLA VIAL URBANA	\$ 152.500.151,00	LICITACION	BUENA VISTA	COMUNA 14
MALLA VIAL URBANA	\$ 37.814.894,00	LICITACION	CIUDAD VENECIA	COMUNA 11
MALLA VIAL URBANA	\$ 33.417.594,00	LICITACION	DELICIAS ALTAS	COMUNA 11
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MALLA VIAL URBANA	\$ 88.822.713,00	LICITACION	PUERTO RICO	COMUNA 3
MALLA VIAL URBANA	\$ 257.427.779,00	LICITACION	SAN RAFAEL	COMUNA 3
MALLA VIAL URBANA	\$ 59.771.608,00	LICITACION	PABLO VI	COMUNA 8
MALLA VIAL URBANA	\$ 46.341.205,00	LICITACION	SAN GERARDO I	COMUNA 8
MALLA VIAL URBANA	\$ 147.260.703,00	LICITACION	ALVAREZ LAS AMERICAS	COMUNA 13
MALLA VIAL URBANA 2018				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MALLA VIAL URBANA 2018	\$ 1.926.127.153,00	LICITACION	AREA URBANA	CORREGIMIENTO I, II Y III
VALOR TOTAL MALLA VIAL URBANA	\$ 2.749.483.800,00			

5. MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	\$124'200.000,00 (VALOR APROBADO POR COMITÉ)}	SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO	VEREDA PEDREGAL BAJO SECTOR LAS GRANJITAS	CORREGIMIENTO 3
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	\$130'500.000,00 (VALOR APROBADO POR COMITÉ)}	SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO	VEREDA MAGUEYES	CORREGIMIENTO 2
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	\$ 94'250.000,00 (VALOR APROBADO POR COMITÉ)}	SE ESTA REALIZANDO PRESUPUESTO	VEREDA MONSERRATE	CORREGIMIENTO 2
VALOR TOTAL ACUEDUCTOS VEREDALES	\$ 348.950.000,00			

Actualmente se está realizando diseño por el taller de arquitectura para los siguientes proyectos:

6. MANTENIMIENTO DE SALONES COMUNALES, COMEDORES INFANTILES Y ESCUELAS
7. MANTENIMIENTO DE PARQUES, KIOSKOS Y PLAZOLETAS
8. MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES

Así mismo se está realizando diseño por consultoría para el siguiente proyecto:

9. CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	0

Una vez se realice la contratación a los diferentes grupos de presupuestos participativos vigencia 2016 y 2017, se actualizará el reporte a las metas del plan de desarrollo en harás de dar cumplimiento a este indicador.

1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

La Secretaría de Infraestructura, durante el primer semestre de 2018 no ha requerido la adquisición de ningún predio para la ejecución de los proyectos, ya que estos se están realizando en predios del municipio, por lo tanto el % de cumplimiento es del 100%.

1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
139 de 2018	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 196.204.820,00	Por Iniciar	Por iniciar

Igualmente se continúa con la supervisión y control a través de proceso de interventorías de los siguientes proyectos:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
231 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 144.743.787,00 Adicional \$ 68.750.773 \$ 10.770.204	01/08/2017	30/07/2018
260 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 77.634.648,00 Adicional \$ 15.732.990	01/09/2017	04/02/2018
283 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 67.121.782,00 Adicional \$ 33.560.891	12/10/2017	13/04/2018
296 de 2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA EN EL BARRIO CIUADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 81.950.778,00 Adicional \$ 25.701.858	29/09/2017	26/03/2018
322 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 44.616.254,00 Adicional \$ 48.495.202	30/12/2017	15/04/2018
379 de 2017	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 116.521.031,00 Adicional \$ 122.185.453,00	19/12/2017	03/05/2018

341 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS EN LA FORMULACION DE POLITICAS CICLO- INCLUSIVAS PARA BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ESTRATEGIA DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y DISEÑO DE 20 KILOMETROS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA.	\$ 850.450.389,00	10/11/2017	31/12/2018 % Avance: 55%
414 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 153.020.612,5 Adicional \$ 84.063.087,5	02/02/2018	23/08/2018
417 de 2017	INTERVENTORIA CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 125.761.818,00	01/02/2018	30/07/2018

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios, diseños, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

La Secretaria de Infraestructura continúa con la ejecución del contrato relacionado a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
229 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.024.528.836,64 Adicional \$ 520.033.939,2	01/08/2017	30/07/2018

Estado: Avance de Obra 91%



Fachada principal



Área de comedor tercer piso

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	0

Se tiene proyectado realizar el Mejoramiento Centro Vida Años Maravillosos – Real de Minas, el cual se encuentra en curaduría para aprobación, para dar cumplimiento a este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
330 de 2017	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA LA HABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR GRAN BOSQUE DE LOS CERROS ORIENTALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.160.000.000,00	10/11/2017	30/08/2018

Estado: Avance de la consultoria: 75%

AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra con anteproyecto aprobado, y así mismo, se encuentra en trámite la solicitud del cambio de categoría a uso público dentro del DRMI, ante la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	0	0

Para la vigencia 2018 no existe meta programada, el cumplimiento a este indicador se realizó con el contrato en mención durante la vigencia 2017.

3.2. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Este programa contempla todas las obras de mitigacion y/o estabilizacion en las diferentes comunas del Municipio de Bucaramanga.

Teniendo en cuenta la declaratoria de calamidad publica de las areas afectadas por la erosion en las comunas 3, 4, 5, 8 y 17 en el Municipio de Bucaramanga y el Desarrollo del Plan de Accion Especifico para la Reduccion y Recuperacion de estos Sectores se presento ante la UNGRD, los diseños, memoricas de calculos y presupuestos y ejecucion de la obra del Barrio San Rafael obras que fueron contratadas y que se encuentran en ejecucion.

A través de la UMGRD se presentaron ante el DNP los siguientes proyectos que se encuentran en proceso de cumplimiento de requisitos para los siguientes Barrios:

1. Monte Redondo
2. Estoraques
3. Nariño
4. Santander Sector del Colegio Francisco de Paula Santander y el Barrio XXIII de junio, Calle 32 Cra 2 y 1 Occ.
5. Don Bosco

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	20	9	0

Una vez estas obras sean contratadas, se realizara el reporte para poder dar cumplimiento a este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA


4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000 Adicional \$ 1.249.000.000	03/05/2017	13/07/2018

Estado: Avance de Obra 75%

Se adelantó, por solicitud de la Fundación Teatro Santander adición en valor y plazo del convenio, con el fin de realizar actividades que puedan dar como resultado la apertura inicial del Teatro Santander, al público este año.

La obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 75%, representado en las actividades de mecánica teatral, equipos de sonido, cielo raso, aislamiento acústico.

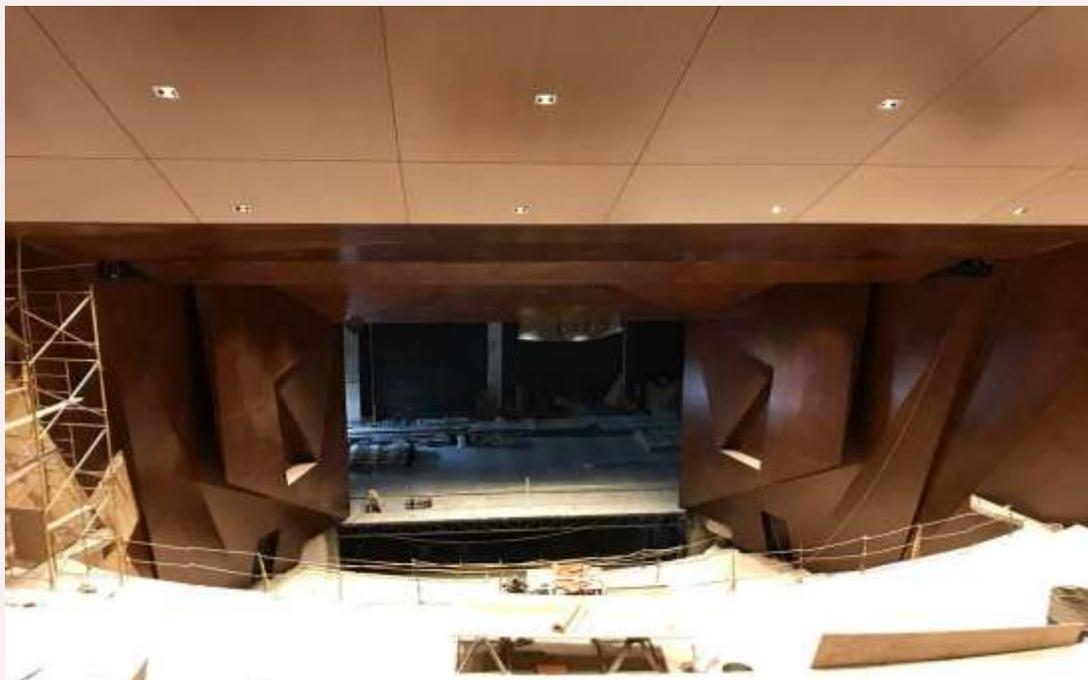

Terminación en madera al interior de la Gran Sala

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2018	LOGRO 2018
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	0	0

Para la actual vigencia no existe programada meta, toda vez que ya se dio cumplimiento durante la vigencia 2017.

4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

Se realizó el giro por valor de \$ 4.000.000.000, de acuerdo a la vigencia futura aprobado mediante acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2017, para adicionar el convenio FNT – 328 de 2014 “Construcción y dotación del Centro de Convenciones NEOMUNDO de Bucaramanga.

El gran salón se encuentra con un porcentaje de avance del 99% y se espera sea inaugurada en el mes de julio.

La construcción para la unificación de las dos fachadas mediante una columnata, así como la construcción de un puente que une los edificios en su costado occidental, se encuentra con un avance del 60% y se espera poder terminar para el mes de Noviembre del presente año.



Fachada Gran Salón – Centro de Convenciones

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	0	0

Este indicador presenta un cumplimiento del 0.5 de la vigencia 2016, el reporte total se hará una vez el Centro de Convenciones sea terminado, el cual se tiene proyectado entregar el gran salón en la presente vigencia fiscal.

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

✓ **Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes**

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura se encuentra ejecutando los siguientes contratos:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
7 de 2018	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.241.198.080,00	30/01/2018	29/12/2018

Estado: Avance de Obra: 45.45%

Como se había indicado dentro del presente Contrato Interadministrativo se está realizando rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, asignación de 53 parqueros distribuidos en 45 Parques y Zonas verdes, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado, a continuación se relaciona como se encuentra distribuido las zonas de trabajo:

- ✓ 25 Cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas de reacción conformadas por 4 personas cada una, como apoyo a las diferentes zonas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- ✓ 3 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, para siembra y mantenimiento de prado japonés.

Durante el Primer Trimestre de la presente vigencia el proceso de siembra de prado se aplazó por las condiciones climáticas que se presentaron.

Registro Fotográfico:

- ✓ **Rocería:**

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Rocería Antes y Después Separador y Parque Colseguros Norte



Rocería Antes y Después Parque B. San Martin Carrera 32



✓ **Parqueros:**



Limpieza Patinodromo Roberto García Peña Ciudadela Real de Minas

✓ **Instalación de Prado Japonés**



Parque Guayacanes B. Ciudad Bolívar (45 m2)

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Av Quebrada Seca Carrera 18 a la Carrera 22 (130 m2)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
09 DE 2018	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 251.100.819,00	01/02/2018	30/09/2018

Estado: Avance de Obra: 14%

En el informe anterior se manifestó que para llevar a cabo la instalación de los puntos de agua en los diferentes sitios; se necesitaba realizar los procesos licitatorios para la compra de suministro y materiales para la ejecución del proyecto por parte del Acueducto y el cual se había efectuado desde el inicio del Contrato, por tal motivo durante los primeros dos meses Febrero y Marzo de ejecución el Avance de obra fue 5%; de igual manera se realizó durante los dos primeros meses mediciones en los Parques Nacuma, Parque Manzanares, Rompoy de la Quebrada seca con Carrera 9ª para proceder a la respectiva instalación del Sistema de Riego.

✓ **Puntos de Agua Instalados en el primer Semestre de 2018:**



Antes y Después Parque Nacuma Barrio Monterredondo



SEPARADOR ACRÓPOLIS

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

El cumplimiento de este indicador obedece a los contratos que se encuentran en ejecución.

- **Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).**

La Secretaria de Infraestructura ha continuado ejecutando los siguientes contratos:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
259 DE 2017	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 750.154.116,33 Adicional \$ 275.693.091,90	01/09/2017	04/02/2018

Estado: Avance de obra: 100% - Recibido en proceso de liquidación



Plazoleta principal y área juego de niños



Mini cancha sintética, sendero peatonal y área verde iluminados

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
269 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA HABILITACIÓN Y	\$ 2.033.989.525	26/10/2017	30/12/2018

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

	PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET A TRAVÉS DE LAS ZONAS WI-FI QUE INTEGRAN LAS TIC PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
--	---	--	--	--

Estado: Avance Físico: 100% - Instalación: 100% - Zonas en Operación: 100%, las zonas fueron instaladas en 16 de las 17 comunas del Municipio.

Con este proyecto se atienden parques, separadores, canchas etc, con servicio de Internet a través de zonas WIFI en beneficio de toda la ciudadanía.




Zonas WIFI – Parque García Rovira

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 de 2017	CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA DEL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.146.494.931,76 Adicional \$ 275.693.091,9	29/09/2017	26/03/2018

Estado: Avance de Obra 100% - Recibido en proceso de liquidación



Área de juego de niños, zonas verdes en deck y teatrino

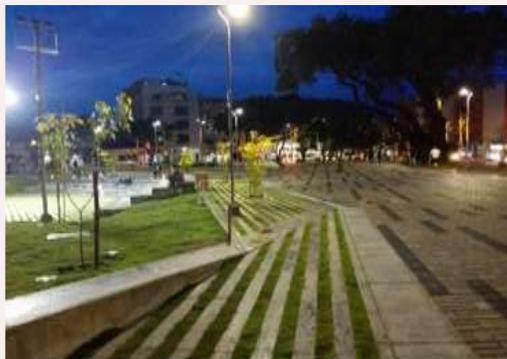

Senderos peatonales y teatrino iluminados

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
308 de 2017	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 391.107.653,00 Adicional \$ \$ 185.926.107,00	10/10/2017	18/05/2018

Estado: Avance de Obra 100%

La obra está terminada y entregada a la comunidad (100%). La intervención se realizó en **Cancha la joya**, reconstrucción de cerramiento, mantenimiento de la cubierta de la gradería adecuación de muros y cerramiento metálico, reposición de friso y piso de graderías.



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

En Cancha de Café Madrid movimiento de tierra, construcción de filtro para manejo de aguas lluvia de la cancha, conformación de la superficie de la cancha, construcción de andenes perimetrales, adecuación de espacio para zona de juegos.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
320 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.450.558.948,5 Adicional \$ 456.073.945,00 \$ 269.014.610,84	30/10/2017	06/05/2018

Estado: Avance de obra 100%

La obra se encuentra ejecutada en un 100% y debidamente entregada a la comunidad. En este momento se está realizando el proceso de certificación RETIE y RETILAB, ante la ESSA, del alumbrado público del proyecto.



VIA VEHICULAR (POMPEYANO) – AREA JUEGOS INFANTILES



ACCESO A TERRAZA EN DECK CON MOBILIARIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
370 de 2017	ADECUACIÓN PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 1.088.325.855,00	11/12/2017	05/06/2018

Estado: Avance de Obra 100%

Los trabajos presentan un avance del 100%, y entregado al servicio de la comunidad del sector.



JUEGOS INFANTILES ZONA 2: ASTRONAVE
(13 USUARIOS: 2-5 AÑOS)



JUEGOS INFANTILES ZONA 1: MINIMO 1621 – RED MINI
(26 - 15 USUARIOS: 2-5 AÑOS)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
374 de 2017	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 1.580.052.824,88 Adicional \$ 319.971.774,16	13/12/2017	17/04/2018

Estado: Avance de Obra 100%

La obra se encuentra 100% terminada y en uso por parte de la comunidad. En este momento se está realizando la revisión y pruebas de unas luminarias que estaban pendientes por arreglar, y así mismo se va a iniciar el proceso de certificación RETIE y RETILAB, ante la ESSA, del alumbrado público del proyecto.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal



AREA DE GIMNASIO, ZONA VERDE Y GRADERIAS



CANCHA EN GRAMILLA SINTETICA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
378 de 2017	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 724.856.089,78 Adicional \$ 84.317.096,12	13/12/2017	29/06/2018

Estado: Avance de Obra 100%

La obra se encuentra 100% terminada y en uso por parte de la comunidad. Ya se instalaron las luminarias que estaban pendientes por llegar y un cerramiento adicional solicitado por la comunidad para evitar la salida de los balones hacia la vía vehicular. En este momento se está realizando el proceso de certificación RETIE y RETILAB, ante la ESSA, del alumbrado público del proyecto.



CANCHA EN PISO DE CONCRETO CON CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA (BARRIO PORVENIR-SALON COMUNAL)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
136 de 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 912.840.262,83	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance de Obra 0% - En proceso de legalización

PROYECTO	VALOR	BARRIO	COMUNA
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO ALVAREZ	91.528.601,00	ALVAREZ	COMUNA 13
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO HACIENDA SAN JUAN	40.073.010,00	HACIENDA SAN JUAN	COMUNA 15
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO CANDILES	76.297.240,00	CANDILES	COMUNA 6
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO CANELOS	74.888.518,00	CANELOS	COMUNA 8
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO LA FLORESTA	79.601.143,00	FLORESTA	CAMUNA 12
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS SANTANDER	95.114.592,00	SANTANDER	COMUNA 4
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO PARQUE DE LOS NIÑOS	252.917.953,00	ANTONIA SANTOS CENTRO	COMUNA 13
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO LOS LEONES	105.985.636,00	ALVAREZ	COMUNA 13
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO SAN GERARDO	85.057.996,00	SAN GERARDO	COMUNA 8

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
138 de 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 851.084.220,48	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance de Obra 0% - En proceso de legalización

PROYECTO	VALOR	BARRIO	COMUNA
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO ALTOS DEL PROGRESO	78.377.983,00	ALTOS DEL PROGRESO	COMUNA 1
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO BRISAS DEL MUTIS (DOS CANCHAS)	118.147.439,00	MUTIS	COMUNA 17
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO BUCARAMANGA	99.248.208,00	BUCARAMANGA	CAMUNA 8
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO KENNEDY	139.064.983,00	KENNEDY	COMUNA 1
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO CAMPO MADRID (DOS CANCHAS)	219.734.956,00	CAMPO MADRID	COMUNA 17
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVO MONTERREDONDO (DOS CANCHAS)	187.112.453,00	MONTERREDONDO	COMUNA 17

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.	100	30	20

Para dar cumplimiento a este indicador, actualmente se encuentra en procesos de contratación No. SI-LP-007-2018 Remodelación de canchas y obras complementarias en el Municipio de Bucaramanga, una vez sea adjudicado se realizara el reporte a este indicador.

PROYECTO	VALOR	BARRIO	COMUNA
REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	469.704.304,10	Barrio Alfonso López Ubicada en la Calle 41 con Carrera 40	COMUNA 5
REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	500.758.366,33	Barrio la Esperanza II ubicada en la Carrera 22 con Calle 12N	COMUNA 2
REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	594.362.133,09	Barrio la Concordia ubicada en la Carrera 21 con Calle 53	COMUNA 6
REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	1.327.059.953,23	Barrio Napoles ubicada en la Calle 28 entre Carreras 10 - 20	COMUNA 4
REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	1.322.432.036,34	Barrio Pan de Azucar ubicada en la Carrera 54 con Calle 52	COMUNA 12
REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	798.380.610,59	Tejar Norte ubicada en la Carrera 7 con Calle 18N	COMUNA 12

REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	1.827.558.387,67	Barrio Dangond ubicada en la Carrera 15 con Calle 109	COMUNA 11
REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	1.108.463.463,53	Barrio Coaviconsa ubicada en la Carrera 13 entre Calle 103C y 103D	COMUNA 11
VALOR TOTAL PROYECTO	7.948.719.254,88		

- **Mantenimiento a Plazas de Mercado**

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
359 de 2017	REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 585.620.639,85	23/11/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 0% - Suspendido

Pendiente trámite antes las empresas de telecomunicaciones el traslado de redes, toda vez que están se encuentran colgadas a la estructura metálica que soportan la estructura de la cubierta.

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	4	1	0

Se espera terminar con la intervención a la plaza de mercado Guarín y realizar las gestiones para lograr dar cumplimiento a este indicador.

- **Andenes Construidos**

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
376 de 2017	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.982.938.940,48 Adicional \$ 870.848.763	19/12/2017	30/07/2018

Estado: Avance de Obra 86%

Se están realizando las adecuaciones en el costado norte, el acceso al parqueadero por la carrera 33, y los costados oriental, occidental y sur ya están siendo disfrutados por la ciudadanía.



✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de M2 de andenes construidos.	30.000	10.400	0

Para dar cumplimiento a este indicador, la Secretaria de infraestructura se encuentra adelantado el proyecto de andenes, escalera y pasamanos, una vez contratado se realizara el reporte a este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
281 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CICLISTA UIS-PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.171.015.163,58 Adicional \$ 433.232.617,99	12/10/2017	11/05/2018

Estado: Avance de obra 100% - En proceso de liquidación



Acabados Conexión – Caballo Bolívar - Uis



Acabados Carrera 30 Calle 31 -32

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	20	7	0

Para dar cumplimiento a este indicador, se encuentra en ejecución el Convenio de Cooperación Internacional No. 341 de 2017 “Diseño definitivo de 20 Kilómetros de Cicloruta”, una vez se pueda realizar la contratación se realizara el reporte a este indicador.

6.2. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- **Mantenimiento Malla Vial Urbana**

Se continuó ejecutando el siguiente contrato:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
246 de 2017	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.228.092.616,57 Adicional \$ 223.813.732,98	18/09/2017	09/03/2018

Estado: Avance de Obra: 100% - Liquidado

Igualmente se encuentra en proceso de licitación No. SI-LP-005-2018 el mantenimiento de la malla vial urbana para la vigencia 2018.

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	10.000	0

Se espera que una vez se realice la contratación del proyecto del mantenimiento y mejoramiento de la malla vial de la presente vigencia se pueda dar cumplimiento a este indicador.

- **Megaobras de Infraestructura Vial**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	24 de Noviembre de 2018

Estado: Avance de Obra: 89.94%

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL REINICIO DE LA OBRA

- Con motivo de la providencia que ordenó el levantamiento de la medida cautelar impuesta quedo ejecutoriada el día seis (6) de Febrero de 2018.
- El acta de Reinicio de Obra fue a partir del 17 de Mayo de 2018
- De acuerdo de la resolución del AMB se procedió a la tala de árboles el día 19 de Mayo de 2018.
- Excavaciones para la construcción de los ejes viales que conforman la glorieta.
- Definición en sitio del trazado del muro de cerramiento en la plazoleta contiguo al acceso de la escuela normal superior.
- Se reanudaron las actividades de tala de árboles en el área de plazoleta No. 1, los cuales fueron aprobados mediante resolución 000509 del 15 de Mayo de 2018, la cual revoca la resolución No. 000203 de 21 de Febrero de 2018. Se autorizó la tala de 113 árboles y el traslado el 4.
- Se inicia la instalación del concreto ciclópeo para la cimentación del muro de contención.
- Se realiza la demolición de los salones de la escuela Normal Superior de Bucaramanga
- Construcción de Micropilotes Zona 2
- Construcción de Micropilotes Zona 1
- Red Interna Acueducto Diámetro: 2 1/2



Demolición de Muro de Cerramiento existente



Construcción de Muro de Contención



Tala de Aboles

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000,00 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 Adicional 3. \$ 279.998.312,00 Adicional 4. \$ 503.068.682,00 Adicional 5 \$ 576.556.101,00 Adicional 7 \$ 576.411.857,00 Valor Total 15.392.422.371,02	01 de Octubre de 2014	07/07/2018

Estado: Avance de obra: 97.82% - Se reinició el 21 de Mayo de 2018

Entre las actividades pendientes se encuentran:

Actividades eléctricas de la variante, maniobras aéreas entre las torres de noemundo y la subestación eléctrica conucos, construcción de la vía 1, 2,3, construcción de la rampa de acceso del constado occidental del puente peatonal del Barrio Antonia Santos y Adecuación del espacio público para la implantación de la signografía Guane, adicionalmente se requiere recuperación de la carpeta asfáltica y señalización.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	0	0

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador del Mesón de los Búcaros que debió ser reportado en la vigencia 2017, pero como no ha sido posible la terminación de dichas obras, durante la vigencia 2018 se espera realizar el reporte.

6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaria de Infraestructura realizó: Mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural que contempla la Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas, actividades realizadas con la Maquinaria

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

disponible (1 Minicargador, 1 Motoniveladora, 2 Volquetas y Carrotanque) Adscrita a este Despacho, A continuación algunos sectores intervenidos.

Descripción: Transporte de material (arena) y traslado Escombros al Carrasco



Material de Bocas

Descripción: Limpieza y Recolección de material suelto sobre canaletas de aguas lluvias, traslado al Carrasco.



Calle 45- Carrasco

Descripción: Instalación de Urbanismos Tácticos




Calle parque de los Niños

Cra. 20 parque Santander

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Descripción: Mantenimiento vías terciarias. Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas.

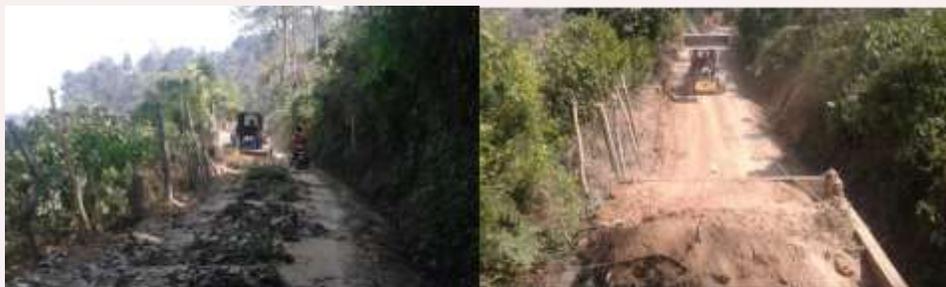

Vereda Gualilo C3 Vías Internas



Vereda Santa Rita C1 – Capilla Alta C2

Descripción: Apoyo logístico Comunidad JAC El Pablón. Transporte de material (piedra y arena)



Bocas – El Pablón.



Vereda Santa Rita C1 – Seilan Tramo superior

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140
	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	500	0

El cumplimiento a este indicador obedece al mantenimiento rutinario con la maquinaria del Municipio, de acuerdo a la programación por parte de este Despacho y con respecto a las placas huellas, este proceso ya se encuentra adjudicado y dará inicio en el mes de julio.

1.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

La Secretaria de Infraestructura ha continuado ejecutando el siguiente convenio:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
352 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN ENTRE EMPAS S.A, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN COLECTOR CALLE 5 ENTRE	\$ 3.152.925.698,21	15/12/2017	14/12/2018

CARRERAS 10 Y 15, Y CALLE 6 ENTRE CARRERAS 15 Y 15B DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.			
---	--	--	--

El Municipio de Bucaramanga, realizo el desembolso único para la Empresa de Alcantarillado de Santander –EMPAS, el cual es la ejecutora del proyecto ya realizo el proceso de contratación, el cual ya fue adjudicado y se encuentra en ejecución.

6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

INDICADORES 2018									
MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	% ATENCION PQR'S DELMES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES	ACUMULADA PQR'S RECIBIDAS	ACUMULADA PQR'S ATENDIDAS	% ATENCION PQR'S ACUMULADO	
Enero	1120	655	58%	5	446	1120	1101	98%	
Febrero	846	428	51%	4	310	1966	1839	94%	
Marzo	806	469	58%	5	262	2772	2570	93%	
Abril	1090	644	59%	5	190	3862	3404	88%	
Mayo	925	545	59%	5	251	4787	4200	88%	
Junio	648	401	62%	5	260	5435	4861	89%	
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
TOTAL	5435	3142			1719				
TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS						11729			
TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS						11213			
PORCENTAJE DE ATENCION PQR'S						96%			

Se continúa con la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
302 de 2017	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN	COINGESER LTDA \$ 810.496.307,50	18 de Octubre de 2017	18 de Octubre de 2018
303 de 2017	DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	EME INGENIERIA \$671.856.316,58		
304 de 2017		CIVAREL INGENIERIA \$651.732.060,00		

Estado: Avance de obra: 66%

SECTORES A INTEVENIR

- ❖ GRUPO COINGESER Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ❖ GRUPO EME Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1
- ❖ GRUPO CIVAREL Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2



Mantenimiento alumbrado público barrio el Kennedy



Mantenimiento alumbrado público barrio Morrarrico

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
360 de 2017	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.515.125.426,36	20/11/2017	20/02/2018

Estado: Liquidado



MATERIAL EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 12 #33-51

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
003 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL –GRUPO 1 –CENFER INTERCAMBIADOR EL BUENO	\$ 3.296.758.330,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: Avance de obra: 100% ejecutado – En proceso de Liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
004 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL. GRUPO 2 – INTERCAMBIADOR EL BUENO INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL	\$ 2.881.620.453,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: Avance de Obra: 100% - Ejecutado en proceso de liquidación



ALUMBRADO LED VIA CENFER – PUERTA DEL SOL ENCENDIDO Y TELEGESTIONADO Y CON MEDIDOR DE ENERGIA EXCLUSIVO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
008 de 2017	PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5	\$ 1.239.726.530,00	16/02/2017	15/07/2017

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Porcentaje Ejecución: Bavaria II - 100%
Porcentaje Ejecución: Villa del Prado – 100% - **LIQUIDACION**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
2019 de 2017	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 – CENTRO ABASTOS CAFÉ MADRID	\$ 2.621.711.740,95	27/07/2017	09/06/2017
220 de 2017		\$ 1.813.213.811,70	27/07/2017	09/06/2017

Estado: En proceso de liquidación

Grupo 1 – EICON LTDA Porcentaje de Avance: 100%
Grupo 2 – EME INGENIERÍA S.A Porcentaje de Avance: 100%



ALUMBRADO LED CENTRO-ABASTOS ENCENDIDO Y TELEGESTIONADO Y CON MEDIDOR DE ENERGIA EXCLUSIVO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
312 de 2017	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 – BARRIO CIUDAD BOLÍVAR	\$ 2.176.343.155,91	21/06/2018	30/08/2018

Estado: en ejecución, 10% de avance de obra



CIUDAD BOLIVAR CON LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO AUMENTARA LA SEGURIDAD DEL SECTOR Y DARA CONFORT A SUS HABITANTES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
117	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 593.923.343.45	15/05/2018	29/12/2018

Estado: Avance de Obra: 20%



PODAS EN EL BARRIO PAN DE AZUCAR PARA DESPEJAR LUMINARIAS Y RECUPERAR ILUMINACION EN EL SECTOR

PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION POR ALUMBRADO PUBLICO PARA LA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO

❖ SI-SASI-001-2018 SUBASTA 24300 LUMINARIAS LED \$23,964 '965,719

- ❖ SI-LP-008-2018 PARQUE LINEAL RIO DE ORO \$977'185,114
- ❖ SI-LP-009-2018 EXPANSION AP RURAL \$929'061,838

OTROS PROCESO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

- AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Se adelanta la gestión con la ELECTRIDORA DE SANTANDER ESP SA para realizar convenio de instalación del alumbrado navideño para lo cual el municipio invertirá \$1.000'000.000.

- CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DISEÑO FACHADA PLAZA SAN MATEO, POR VALOR \$ \$ 3.261.336.426,00

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	0
	Número de luminarias expandidas.	1.000	300	0
	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	15	0
	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	5	0
	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	0%
	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	89%

Para el cumplimiento de estos indicadores se adelantan:

- ✓ **Número de Luminarias Sustituidas a Led:** Esta en desarrollo proceso de subasta inversa para la adquisición de las 24300 luminarias led.
- ✓ **Proyecto Piloto Energía Solar:** Está en diseño Parque Contemplativo El Carrasco

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Co ntrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
339 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. (GRUPO III AREA SUR)".	\$ 883.194.102,9	20/11/2017	28/02/2018

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
340 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. ORIENTE (GRUPO II AREA CENTRAL)".	\$ 817.434.952,46	20/11/2017	28/02/2018

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
355 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. (GRUPO I AREA NORTE)".	\$ 813.655.567,13	20/11/2017	28/02/2018

Estado: Avance de Obra 100%

Se adelantaron los arreglos a los detalles y observaciones realizadas por los rectores de las diferentes instituciones que estaban pendientes por corregir en los grupos 1 y 3 (en el grupo 2 ya se habían realizado todos los arreglos en el período anterior), y se suscribieron las respectivas actas de recibo a satisfacción por parte de los rectores y/o coordinadores.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2017	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.565.682,8	01/02/2018	30/07/2018

Estado: Avance de Obra: 30%



Estructura en pórticos terminada



Instalaciones sanitarias y cuchillas de cubierta

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
71 de 2018	RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UN LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.254.823.459.69	12/03/2018	11/11/2018

Estado: Avance de Obra: 8,03%

Se realizó la cimentación y columnas el costado sur del inmueble, del costado norte se realizó la demolición de los frisos. Se va a inicial la demolición de la placa de cubierta existente, por recomendación del Ingeniero estructural, como consecuencia del incendio que sufrió la antigua estación del Ferrocarril.



COSTADO SUR DE LA LUDOTECA



ESTRUCTURA NUEVA DEL COSTADO SUR

PROCESOS DE CONTRATACION QUE ACTUALMENTE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIETO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVAS. SI-LP-012-2018				
GRUPO I	VALOR	BARRIO	COMUNA	FECHA DE ENTREGA
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIETO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL SEDE C	571.275.960,16	CIUDAD NORTE	COMUNA 1	21 DE DICIEMBRE DE 2018
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIETO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL SEDE D. TRANSICION	1.047.229.054,91	TRANSICION	COMUNA 2	21 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR GRUPO I	1.618.505.015,07			
GRUPO II	VALOR	BARRIO	COMUNA	FECHA DE ENTREGA
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIETO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURELIO MARTINEZ MUTIS	974.341.731,57	CIUADELA REAL DE MINAS	COMUNA 7	21 DE DICIEMBRE DE 2018
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIETO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE	577.308.222,60	LA CONCORDIA	COMUNA 6	21 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR GRUPO II	1.551.649.954,17			
GRUPO III	VALOR	BARRIO	COMUNA	FECHA DE ENTREGA

REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAIPORE SEDE C	731.669.241,00	KENNEDY	COMUNA 1	21 DE DICIEMBRE DE 2018
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE CLUB UNION SEDE D OLAS BAJAS	758.212.571,79	OLAS BAJAS	COMUNA 1	21 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR GRUPO III	1.489.881.812,79			
GRUPO IV	VALOR	BARRIO	COMUNA	FECHA DE ENTREGA
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL PAULON	1.424.174.360,88	VEREDA EL PAULON	CORREGIMIENTO 1	21 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR GRUPO IV	1.424.174.360,88			
VALOR TOTAL	6.084.211.142,91			

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. SI-LP-006-2018				
GRUPO I	VALOR	BARRIO	COMUNA	FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CLUB UNIO CEDE C	116.615.938,30	LOS COLORADOS	COMUNA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CLUB UNIO CEDE E	111.613.971,96	CAFÉ MADRID	COMUNA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTO ANGEL	148.958.524,30	VILLA ROSA	COMUNA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2018

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CLAVERIAN FE Y ALEGRIA	71.516.252,32	CLAVERIANO	COMUNA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR GRUPO I	448.704.686,88			
GRUPO II		BARRIO	COMUNA	FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS GUSTAVO COTE URIBE	211.632.676,63	MARIA PAZ	COMUNA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA JUVENTUD	86.597.220,51	LA JUVENTUD	COMUNA 2	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAMPO HERMOSO	42.794.251,75	JOSE ANTONIO GALAN	COMUNA 5	31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR GRUPO II	341.024.148,89			
GRUPO III				
PROYECTO	VALOR	BARRIO	COMUNA	VIGENCIA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DAMASO ZAPATA SEDE D	250.710.100,21	SAN ALONSO	COMUNA 13	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTANDER SEDE D	240.085.024,52	INDEPENDENCIA		31 DE DICIEMBRE DE 2018
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS LAS AMERICAS	261.405.549,34	ALVAREZ	CAMUNA 13	31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR GRUPO III	752.200.674,07			
VALOR TOTAL	1.541.929.509,84			

8. INFORME DE PROCESOS CONSOLIDADO

No.	OBJETO	No. PROCESO	TIPO PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 1.798.100.263,97
2	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2018	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 604.312.372,00
3	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION CERRAMIENTO Y RELLENO DE TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª - 132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-003-2018	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 355.000.192,00
4	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA PARA PREVENIR EL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD QUE CIRCULA POR EL SECTOR Y CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR FALLO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA CON EL No 680013333009-2017-00178-00 EMANANDO DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-002-2018	MINIMA CUANTÍA	SE DECLARÓ DESIERTO	\$ 5.781.943,00
5	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	ADJUDICADO	\$ 1.277.358.628,60
6	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	SI-LP-003-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 1.553.175.389,00

7	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	ADJUDICADO	\$ 2.397.714.936,81
8	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	ADJUDICADO	\$ 2.827.830.619,00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-006-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 1.541.933.624,00
10	REMODELACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 7.948.719.254,88
11	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II	SI-LP-008-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 977.185.114,00
12	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2018	SI-LP-009-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO DE PLIEGO	\$ 929.061.838,00
13	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-010-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO DEPLIEGO	\$ 5.518.618.108,00
14	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO DEPLIEGO	\$ 1.225.397.026,84
15	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNION SEDE D, RURAL EL PAULON, MAIPORE SEDE C, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS.	SI-LP-012-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO DEPLIEGO	\$ 6.088.211.143,36
16	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A LED – ETAPA 2 DEL BARRIO CIUDAD BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-002-2018	CONCURSO DE MERITOS	ADJUDICADO	\$ 194.462.541,00

17	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-003-2018	CONCURSO DE MERITOS	ADJUDICADO	\$ 220.566.078,00
18	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-004-2018	CONCURSO DE MERITOS	ADJUDICADO	\$ 196.449.960,00
19	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-005-2018	CONCURSO DE MERITOS	ADJUDICADO	\$ 222.698.385,00
20	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-006-2018	CONCURSO DE MERITOS	ADJUDICADO	\$ 272.368.687,50
21	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-006-2018	CONCURSO DE MERITOS	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 318.314.588,00
22	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-004-2018	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 334.830.339,00
23	CONSULTORIA PARA DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOBILIARIO DEL CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES DE BUCARAMANGA NEOMUNDO-GRAN SALON	SI-CMC-003-2018	MINIMA CUANTÍA	ADJUDICADO	\$ 38.080.000,00
24	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA REALIZAR INTERVENCIONES DE URBANISMO TÁCTICO EN ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-004-2018	MINIMA CUANTÍA	ADJUDICADO	\$ 14.779.900,00
25	OBRA CIVIL EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM FASE II-PISO I PARA LA ADECUACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS REGULADA Y NORMAL	SI-CMC-005-2018	MINIMA CUANTÍA	ADJUDICADO	\$ 49.996.168,00

26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL CAMION CANASTA GRUA DE PLACA OSA 790 CON BRAZO ARTICULADO HIDRAULICO PROPIEDAD DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-006-2018	MINIMA CUANTÍA	ADJUDICADO	\$ 34.802.621,00
27	CONSULTORÍA PARA DEFINIR LA COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO ZONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-008-2018	MINIMA CUANTÍA	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 22.276.800,00
28	COMPRAVENTA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TONERES PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-009-2018	MINIMA CUANTÍA	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 15.746.116,89
29	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION CERRAMIENTO Y RELLENO DE TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª - 132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-010-2018	MINIMA CUANTÍA	ADJUDICADO	\$ 65.577.330,00
30	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA PARA PREVENIR EL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD QUE CIRCULA POR EL SECTOR Y CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR FALLO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA CON EL No 680013333009-2017-00178-00 EMANADO DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-011-2018	MINIMA CUANTÍA	ADJUDICADO	\$ 44.159.897,00
31	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	SI-CMC-012-2019	MINIMA CUANTÍA	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 66.155.135,00

9. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.563.200.000,00	Certificado - Actualización
2	20160680010088	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 17.933.000.000,00	Certificado - Actualización
3	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 864.250.000,00	Certificado - Actualización
4	20170680010118	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 317.509.812,84	Certificado - Actualización
5	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 1.008.735.035,13	Certificado - Actualización
6	20170680010090	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOCAPRADERA DEL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 501.661.954,67	Certificado - Actualización
7	20170680010141	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COLUMNATA Y PUENTE DE INTEGRACIÓN EDIFICIOS EXISTENTE Y NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUENDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.000.000.000,00	Certificado - Actualización Vigencias Futuras
8	20180680010010	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 105.932.922,80	Certificado - Proyecto Nuevo
9	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACION DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.552.898.870,00	Certificado - Actualización
10	20170680010174	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 154.989.631,00	Certificado - Proyecto Nuevo
11	20170680010084	CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS - PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 466.793.508,99	Certificado - Actualización
12	20170680010093	ADECUACIÓN DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARAMANGA	\$ 127.923.589,32	Certificado - Actualización

13	20170680010133	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.449.984.504,67	Certificado - Actualización
14	20170680010057	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 999.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
15	20180680010013	MATENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.977.910.290,37	Certificado - Proyecto Nuevo
16	20160680010245	CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.109.208.202,83	Certificado - Actualización
17	20160680010154	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 4.541.798.899,48	Certificado - Actualización
18	20170680010111	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DE BUCARAMANGA	\$ 89.084.660,00	Certificado - Actualización
19	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 599.555.869,61	Certificado - Actualización
20		MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 96.841.447,00	Proyecto Nuevo, en espera de ser certificado.
21	20170680010165	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 88.017.400,27	En Actualización
22	20180680010030	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FASE III EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.242.467.100,00	Certificado - Proyecto Nuevo
23	20180680010023	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 32.213.762.885,00	Certificado - Proyecto Nuevo
24	20180680010024	REMODELACION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.900.224.580,99	Certificado - Proyecto Nuevo
25	20180680010025	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.670.083.624,31	Certificado - Proyecto Nuevo
26	20180680010028	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.146.145.207,00	Certificado - Proyecto Nuevo

27	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 2.313.417.707,11	Certificado - Actualización
28	20180680010049	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.089.462.658,32	Certificado - Proyecto Nuevo
29	20180680010036	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.101.039.013,00	Certificado - Proyecto Nuevo
30	20180680010041	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS ARTERIALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y DETERMINACIÓN DE COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO DE ZONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 85.150.354,00	Certificado - Proyecto Nuevo
31	20180680010031	REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.706.773.585,37	Certificado - Proyecto Nuevo
32	20170680010139	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.102.623.391,00	Certificado - Actualización
33	20170680010137	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.494.116.686,62	Certificado - Actualización
34	20170680010137	APOYO PARA LA INTERVENCIÓN, RESTAURACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL TEATRINO DEL ESTADIO, FACHADAS DE LA CARRERA 20 Y LA CALLE 31, Y ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO BUCARAMANGA	\$ 499.900.000,00	Certificado - Actualización
35	20180680010052	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 313.711.370,55	Certificado - Proyecto Nuevo
36	20180680010051	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.493.871.261,00	Certificado - Proyecto Nuevo
37	20180680010054	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.652.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
38	20180680010050	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 135.502.973,00	Certificado - Proyecto Nuevo
39	20180680010035	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO, LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA	\$ 66.155.135,00	Certificado - Proyecto Nuevo

10. DEFENSA JUDICIAL

Durante el periodo de Enero a Junio 30 de 2018, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

-Respuesta a requerimientos, trámites y solicitudes de los despachos Judiciales en acciones constitucionales	267
- Acciones de Tutela notificadas y tramitadas	24
-Fallos a favor en acciones de tutela	07
-Fallos en contra en acciones de tutela	00
-Fallos pendientes por notificar en acciones de Tutela	00
-Fallos de Acciones de tutela pendientes de cumplimiento	08
-Acciones Populares notificadas y tramitadas	10
-Fallos en contra en acciones populares	03
-Fallos cumplidos en acciones populares	13
-Fallos en acciones populares pendientes de cumplimiento	30

Durante este periodo se adelantaron trámites en cumplimiento de la medida cautelar ordenada dentro del proceso de Acción Popular No. 2017-0178 (Refugio Social)

Igualmente se cerraron incidentes de desacato, sin sanción, en los siguientes procesos:

Acción Popular No. 2014-0225 Intercambiador Mesón de los Búcaros
 Acción Popular No. 2017-0178 Se dio por terminado sin sancionar
 Acción de Tutela No. 2017-1439 Se dio por terminado sin sancionar
 Acción de Tutela No. 2016-0232 Se dio por terminado sin sancionar

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el periodo

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2018-0048	15 Penal Municipal	Luis Alberto Sánchez	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0044	1º Penal Municipal con F.C.	Myriam Rodríguez	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0061	1º Penal Municipal Adolescentes C.G.	Cielo del Rosario Quintero	Fallo a favor del Municipio	Archivado

2018-0183	9º Civil Municipal	Henry Martínez	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0334	2º Civil Municipal	Débora López	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0087	7º. Penal F.C.G.	Licerio Cortes	Fallo a favor de Sec. Infraestr.	Cumple: Of. Gestión Riesg

ACCIONES POPULARES

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2012-0569	TAS	FALLO EN CONTRA	En Apelación ante Tas	APELADO
2016-0137	5º	FALLO SEGUNDA INSTANCIA A FAVOR	Tribunal revoca sentencia de primera Instancia	FALLO A FAVOR
2016-0021	TASº	FALLO SEGUNDA INSTANCIA A FAVOR	Tribunal revoca sentencia de primera Instancia	FALLO A FAVOR
201-0087	J 14º	FALLO A FAVOR	Juzgado Primera Instancia emite A Favor del Municipio	FALLO A FAVOR
2015-0271	J 3º	FALLO A FAVOR	Tribunal Administrativo confirma Fallo	FALLO A FAVOR
2014-0336	J 12º	FALLO A FAVOR	Juzgado Primera Instancia emite A Favor del Municipio	FALLO A FAVOR
2016-0021	J 2º	FALLO A FAVOR	Tribunal Revoca fallo de primera instancia	FALLO A FAVOR

11. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE JUNIO DE 2018

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 1.684.080.000,00	8,00
OBSERVAR Y SER OBSERVADO FOMENTO AL TURISMO	\$ 4.000.000.000,00	20,00
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 12.170.819.191,10	43,00
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 466.793.508,00	2,00
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 1.274.598.376,80	0,00
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 9.418.901.374,48	27,00
TOTAL (1)	\$ 29.015.192.450,38	100%

12. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTUALIZACION REGISTROS PRESUPUESTALES	\$ 116.684.400,00
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 2.934.927.008,00
TOTAL (2)	\$ 3.051.611.408,00
TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 32.066.803.858,38
