INFORME DE GESTION
VIGENCIA 2015

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FEBRERO DE 2016

Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

INFORME DE GESTION

Durante la vigencia 2015, la Secretaria de Infraestructura realizo la gestión, publicación, evaluación y adjudicación de un número significativo de contratos destinados a la construcción de obras civiles, generación de estudios técnicos especializados, y el establecimiento de acuerdos y/o convenios con diferentes entidades públicas, en las áreas de inversión, conservación, y mantenimiento de su competencia, tales como: Obras Comunitarias, Obras Rurales, Urbanas, Roturas, Parque y Zonas Verdes, Alumbrado Público y Mega Proyectos, los cuales tienen como fin contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Dentro de los aspectos más importantes de la gestión de la Secretaria en el año 2015 cabe destacar:

- Las obras de carácter civil tendientes al mejoramiento de la estructuras de los andenes y senderos peatonales.

- Mantenimiento de plazas de mercado, recuperación del espacio público y mantenimiento de puentes.

- Mantenimiento de calzadas vehiculares y construcción de estructuras de pavimento flexible y rígido, en los sectores rurales y urbanos.

- Mantenimiento y recuperación de parques y zonas verdes, mediante la intervención del componente arbóreo y separadores viales, siembra de pasto, así como las obras de reposición y compensación de especies arbóreas de diferentes clases en sitios predeterminados de la ciudad. De igual forma se ha adelantado la construcción y adecuación de juegos infantiles, bancas y gimnasios al aire libre.

- Mantenimiento, remodelación y construcción de escenarios deportivos.

- Adjudicación de Obras de Construcción e interventorías de Grandes proyectos como: Construcción del Intercambiador de la avenida quebrada seca de la carrera 15, Construcción del Intercambiador de la carrera 27 (Mesón de los Búcaros), Ampliación del corredor vial primario Bucaramanga-Floridablanca sector puerta del sol – puente Provenza del Municipio de Bucaramanga y Construcción del Centro de Convenciones Neomundo Fase I.

- De igual forma, se suscribieron convenios con la Gobernación de Santander, Electrificadora de Santander - ESSA y con la nación convenios con el

departamento para la prosperidad social (DPS), Fondo nacional de gestión de riesgo de desastre, Coldeportes y Aeronáutica Civil.

- Generación de proyectos con el fin de dar cumplimiento al fallo de Acciones Populares.

1. MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1.1 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE LA CARRERA 27 CON AVENIDA QUEBRADASECA

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial $ 54.909.500.000 Adicional 1. $ 14.516.066.713 Adicional 2. $ 10.945.041.309 **Valor Total $ 80.370.608.022**	10 de Septiembre de 2014	09 de Noviembre de 2016

Estado: Avance de obra del 52%

PENDIENTES TECNICOS

1. ***ESCUELA NORMAL SUPERIOR***
   a. SOLUCION: Acción popular con radicado 2014-0225-00, conforme lo establecido en auto de fecha 17 de junio de 2014
   b. AFECTACION: Cronograma de trabajo
   c. RESPONSABLE: Juzgado 3 administrativo oral del circuito de Bucaramanga-Alcaldía de Bucaramanga.

1.2 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
022 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 45.317.679.804,61	28 de Febrero de 2015	26 de Abril de 2015

Estado: En ejecución, Avance de Obra: 50%, Puentes: 100%

1.3 OPTIMIZACIÓN DEL CORREDOR PRIMARIO ENTRE BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE PROVENZA Y EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO PUERTA DEL SOL

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
331 DE 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial $ 7.518.263.339,5 Adicional 1. $ 5.640.000.000 **Valor Total $ 13.158.263.339,5**	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
Convenio	AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial $ 112.358.375.673 Adicional 1. $ 27.289.075.315 **Valor Total $ 139.647.450.988**	Avance de Obra: 35%

Estado: Avance de Obra: 35 %

Sectores en Intervención

1. **Sector Parque de las Hormigas y Talud Conucos**

Parque de las Hormigas

Construcción del muro de contención entre abscisas k0+180 a k0+400, Se ha realizado a la fecha 210 metros.	Extendida de material de Subbase granular entre las abscisas K0+180 a K0+300, de los carriles mixtos.

Talud Conucos

Construcción del muro de contención entre las abscisas K0+190 y K0+380, se han realizado a la fecha 190 metros y pantalla anclada entre abscisas K0+075 y K0+190, se han perforado 21 anclajes.	

2. Sector Puente Carrera 33

Armado de acero de refuerzo de Viga de Amarre de Apoyo Central del puente.	Construcción de columnas de apoyo central del puente.

3. Sector Talud Municipio

Construcción de muro de contención en talud Municipio entre abscisas k0+550 a k0+580, se realizaron 30 metros..	Construcción de pantalla anclada en talud Municipio entre abscisas k0+438 a k0+550, se han perforado 57 anclajes y se han fundido 258,83 metros cuadrados.

4. Sector Muro en Tierra Armada – calle 70 Barrio Antonia Santos

Instalación de base para construcción de carril de metrolinea entre las abscisas K0+610 a K0+810 e Instalación de Subbase en carriles mixtos.

5. Sector Retorno Barrio Antonia Santos – Nueva Granada

Relleno estructural Muro No.2 del eje 18 de la vía al Barrio Nueva Granada entre abscisas k0+750 a k0+800, se construyó 50 metros de muro de contención.	Construcción Muro No. 1 del eje 18 de la vía al Barrio Nueva Granada entre abscisas k0+690 a k0+718, se realizaron 28 metros.

6. Sector Nuevo Viaducto

Construcción de muro de gaviones para contención del talud y posicionar la maquina piloteadora, 100% ejecutado.	

7. **Sector Norte Motoreste**

Se han construido 84 metros lineales de muro de contención. Falta por construir un módulo de 6 metros lineales.

Se está trabajando en la estructura de pavimento en el eje 23 entre abscisas K0+380 y K0+430.

8. **Sector Corinco, junto a Motoreste**

Obras de estabilización del talud de Corinco en pantalla anclada, a la fecha se han construido 2100 metros cuadrados. Se viene realizando el replanteo y conformación de la subrasante.

2. OBRAS DE INTERES COMUNITARIO

2.1 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS.

La secretaria de infraestructura suscribió contratos de obra para intervenir los diferentes escenarios y campos deportivos:

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
497 de 2015	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN DIFRENTES BARRIO DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA (Solo dos preguntar a Motta)	$ 999.999.654	27 de Noviembre de 2015	26 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% en recibo final de obra.

Barrió Granjas de Provenza

Barrio Tejar Norte

Alcance General del Contrato

En los escenarios deportivos se realizó el mejoramiento del piso de las canchas múltiples con recubrimiento sintético acrílico en los Barrios María Paz, Hamacas, Bucaramanga y Granjas de Provenza y mejoramiento del cerramiento y piso de la cancha en tierra del Barrio Porvenir y cancha futbolito del Barrio Tejar Norte y la instalación de juegos infantiles en los Barrios, Granjas de Provenza y Bucaramanga, Mejoramiento del parque Infantil del Barrio Antonia Santos Sur (Ecogimnasio y Juego Infantil)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
348 de 2015	REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 2.334.549.334,82	02 de Septiembre de 2015	11 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 70%

Alcance General del Contrato

El proyecto consiste en la construcción de una edificación de dos niveles con oficina de administración vistieres, baterías de baño, zona de televisión y bodega; demolición y construcción de gradería, cambio del sistema de presión constante, construcción de un tramo de alcantarillado pluvial.

2.2 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
158 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE PILOTES EN EL BARRIO RINCÓN DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 2.518.048.726,69	16 de Octubre de 2015	15 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 75%

Alcance General del Contrato

Construcción de muro de contención para protección del cauce quebrada de la iglesia del Barrio Rincón de la paz.

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
467 de 2015	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO.	$ 800.000.000	06 de Noviembre de 2015	06 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 90%

Alcance General del Contrato

Consiste en la construcción de una pantalla anclada con el fin de estabilizar el coluvión ubicado en el centro desarrollo infantil en el Barrio Villas de San Ignacio.

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
483 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LOS SECTORES CON AMENAZA DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial $ 9.063.912.416,09 Adicional $ 2.500.000.000 **Valor total $ 11.563.912.416,09**	23 de Noviembre de 2015	22 de Julio de 2016

Estado: Avance de Obra: 20%, La interventoría es realizada por Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

Trabajos realizados: Descapote y Limpieza del Talud

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
407 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRÍTICO UBICADO EN EL BARRIO BALCONCITOS DEL MUNICPIO DE BUCARAMANGA.	$ 11.425.760.663,1	14 de Diciembre de 2015	13 de Septiembre de 2016

Estado: **Avance de obra: 2%,** se llevó acabo socialización - permiso CDMB - campamento-valla

Proyecto que consiste en la estabilización del talud del costado Nor-Occidental del Barrio Balconcitos y la instalación de drenes de penetración horizontal área a intervenir 6.000 m2.

2.3 CONSTRUCCION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES, VIAS PEATONALES Y ANDENES

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
403 de 2015	RECUPERACION DE ANDENES Y VIAS PEATONALES EN SECTORES DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 395.823.497,55	20 de Octubre de 2015	28 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%, pendiente recibo de obra

Alcance General del Contrato

Se recuperaron las vías peatonales y andenes en los Barrios de las comunas 9, 10, 11, 12,13 Y 14.

BARRIOS: SOL 1 Y 2 , PROVENZA, FONTANA, JARDINES DE COAVICONSA, PAN DE AZUCAR, CABECERA CRA 37 CON CALLE 48, MEJORAS PUBLICAS, CABECERA FRANTE A LA IGLESIA DE SAN PIO X , DIAMANTE 2, PORVENIR Y BUENOS AIRES

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2015	RECUPERACION DE ANDENES Y VIAS PEATONALES EN SECTORES DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 499.074.057,39	20 de Octubre de 2015	28 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%, pendiente recibo de obra

Alcance General del Contrato

Se recuperaron las vías peatonales y andenes en los Barrios de las comunas 2, 3,4 Y 5:

BARRIOS: LOS ANGELES, VILLA HELENA, TRANSICION 1,2,3 Y 4, SAN CRISTOBAL, SAN FRANCISCO, LA UNIVERSIDAD, LA CUYANITA, 12 DE OCTUBRE, 23 DE JUNIO, GAITAN, LA FERIA, LA GLORIA, NAPOLES, DON BOSCO, PIO XII, ALFONSO LOPEZ, QUINTA ESTRELLA Y PANTANOS.

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
375 de 2015	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPECIO PÚBLICO DE USO PEATONAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECTOR CENTRO.	$ 4.496.001.754,5	14 de Septiembre de 2015	27 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 80%,

Calle 36 carrera 12 a la 27

Alcance general de la obra

Consiste en la intervención del espacio público cumpliendo el manual del espacio público sobre la calle 36 desde la carrera 12 hasta la carrera 19 y desde la carrera 21 hasta la carrera 26.

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
429 de 2015	REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO CALLE 33 ENTRE CRA 18 Y 19 Y CARRERA 19 ENTRE CALLES 33 Y 35 DEL MUNCIPIO DE BUCRAMANGA.	$ 799.803.429,75	16 de Diciembre de 2015	30 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 10%,

Intervención andenes de la carrera 19

Alcance General del Contrato

Mejoramiento del espacio público de la calle 33 entre carreras 18 y 19 frente al teatro Santander y carrera 19 entre calles 35 y 33.

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
479 de 2015	CONSTRUCCION DE ANDENES Y MURO DE CONTENCION Y RECUPERACION MALLA VIAL BARRIO VEGAS DE MORRORRICO.	$ 379.997.253,22	17 de Noviembre de 2015	26 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 80%

Alcance General del Contrato

A la fecha se ha construido el muro de contención del costado occidental de acceso Barrio Vegas de Morrorico.

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
481 de 2014	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO SURATA SECTOR CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 499.042.880, 2	09 de Marzo de 2015	26 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 80%,

Alcance General del Contrato

Se han realizado las bases columnas y se trabaja en el tendido y/o lisaje de las guayas de soporte de la estructura, se debió realizar permiso con la CDMB para el

corte de un caracolí de más de 30 metros y la reubicación de dos postes de alumbrado público.

Proyecto por iniciar

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
532 de 2015	RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS POR ACCION POPULAR Y DEMAS ACCIONES DISPUESTA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNCIPIO DE BUCRAMANGA.	$ 582.030.201,46	Proceso de aprobación de pólizas	

2.4 CONSTRUCCION ALCANTARILLADOS Y REDES PLUVIALES

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
313 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE REDES PLUVIALES Y SISTEMA DE COLECTORES EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 695.520.214,96	21 de Septiembre de 2015	20 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 80%.

Alcance General del Contrato

Consiste en la construcción del sistema de alcantarillado pluvial, construcción de canaletas y sumideros

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
439 DE 2015	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DEL MUNCIPIO DE BUCRAMANGA - FASE I .	$ 999.739.024	16 de Diciembre de 2015	15 de Abril de 2016

Estado: Avance de Obra: 5%.

Alcance General del Contrato

Teniendo lo extenso del Barrio el proyecto se planteó en dos Fases; la fase I corresponde a las redes de alcantarillado pluvial y sanitario de los sectores principales del Barrio y la Fase II corresponde a los sectores restantes.

2.5 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
476 DE 2015	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 5.809.991.124,62	Avance de Obra: 15%

Se iniciaron labores de obra en los Barrios: Guayacanes, Venado de oro, Cubierta escuela San Pablo, Piso y Cielo Raso Escuela Nuestra Señora del Pilar, Se suspende la Obra en el mes de diciembre de 2015, y reinicia el 30 de enero de 2015

3. PARQUES Y ZONAS VERDES

La Secretaria a través de la coordinación de parques y zonas verdes suscribió y ejecuto contratos de obra con el fin de mantener los diferentes parques de la ciudad, entre los cuales podemos destacar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
397 de 2015	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 386.255.059,54	10 de Noviembre de 2015	09 de Febrero de 2016

Estado: SUSPENDIDO: Diciembre 14 de 2015, por la instalación del alumbrado navideño y la temporada de vacaciones para poder intervenir la plazoleta donde se encuentra la escultura de botero

Las obras a realizar en cumplimiento del contrato son: siembra de prado en tapete, siembra de especies de plantas, construcción de huellas en concreto y recuperación de la plazoleta y senderos peatonales.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
361 de 2015	OBRAS DE ADECUACIÓN PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 619.700.966,5	08 de Septiembre de 2015	SUSPENDIDO desde el 27 de Noviembre de 2015

Estado: Avance de Obra: 90%.

Sin embargo dentro del alcance del contrato contempla la acometida general y un tablero central para la alimentación de la biblioteca virtual y fuente ornamental, por lo que se requiere adelantar los trámites ante ESSA, con sus respectivas disponibilidades, permisos y certificaciones.

Se sigue trabajando con el Programa de la Red Protectora de Parques y haciendo seguimiento a los diferentes lineamientos de las Secretaría según su competencia, De acuerdo a la responsabilidad directa de esta secretaría para racionalizar y articular lo pertinente a la política pública de parques y zonas verdes urbanas según Acuerdo No.044 del 26 de Noviembre de 2013,

Actualmente se está realizando un inventario de los parques que tiene el Municipio, con el fin de conocer el estado actual de los parques en lo referente a mobiliario urbano, infraestructura y empradizacion.

4. VIAS

Área encargada de realizar el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana del municipio de Bucaramanga.

4.1MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

La secretaria de infraestructura ha realizado obras de mejoramiento y mantenimiento de las vías urbanas del municipio de Bucaramanga, en los diferentes sectores de la ciudad como:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
482 de 2015	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO SECTOR ENTRADA BARRIO VEGAS DE MORRORICO COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 63.552.894,3	10 de Noviembre de 2015	09 de Enero de 2016

Estado: Se encuentra suspendido desde el día 17 de noviembre de 2015 y a la fecha aún no se ha reiniciado porque se hallan ejecutando trabajos en la vía.

4.2 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
435 de 2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO I DEL MUNCIPIO DE BUCRAMANGA.	$ 603.694.485	27 de Octubre de 2015	9 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%, Proceso de recibo final de obra y liquidación

Portal de los Ángeles **El Nogal**

Alcance General del Contrato

Consiste en la construcción de un pavimento y alcantarillado combinado en el Barrio el Nogal igualmente en el Barrio el portal de los Ángeles ubicados en el sector Norte de la Ciudad.

MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO

Se realizó el mantenimiento, limpieza y adecuación de los 140 kilómetros de vías rurales, allí se incluyeron ampliación, nivelación, perfilado, cuneteo, afirmado de vías internas entre otros.

5. SERVICIOS PÚBLICOS VEREDALES (POZOS SÉPTICOS)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
409 de 2015	CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 798.226.887,9	28 de Octubre de 2015	11 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 50%.

Alcance General del Contrato

Se tiene identificado los usuarios a beneficiar con la construcción de los 130 pozos sépticos.

Se han instalado a la fecha en el corregimiento I, las veredas San Cayetano, Santa Rita, San pedro y San pedro bajo, se trabaja en el corregimiento 3 vereda la Malaña y Retiro chiquito.

En el Corregimiento 3 y 2 se tienen listas las excavaciones para la instalación de los pozos y los tanques sépticos.

Se han presentado algunos problemas con el suministro de los pozos sépticos porque la materia prima hay que importarla y el precio del dólar ha subido enormemente.

6. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

6.1 MODERNIZACION Y EXPANSION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
216 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SANTANDER.	$ 297.625.460,00	22 de Junio de 2015	SUSPENDIDO: (pendiente RETIE-RETILAP-ESSA)

Estado: Avance de Obra: 90%

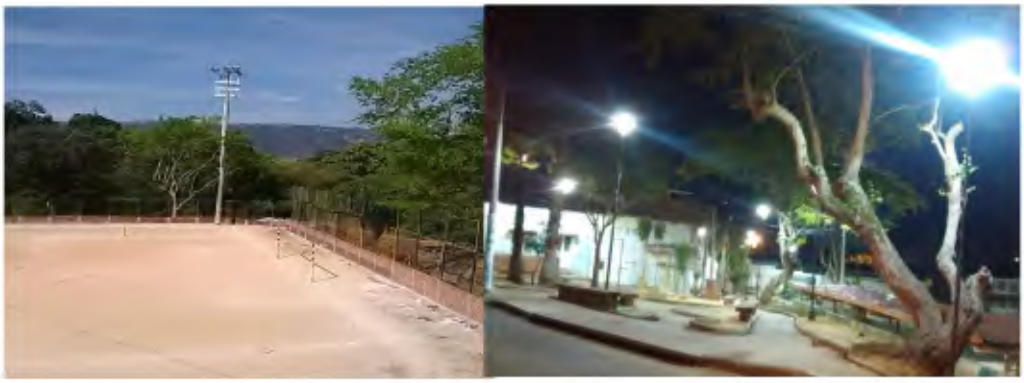

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
382 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS BARRIOS CANDILES Y SAN MIGUEL.	$ 1.013.717.958	29 de Septiembre de 2015	12 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 95%

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
444 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE CARLOS VIRVIESCAS PINZÓN.	$ 818.743.743	02 de Diciembre de 2015	01 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 0%, Suspendido (La CDMB modificó urbanismo, se está ajustando)

6.2 EXPANSION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
400 de 2015	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA.	$ 1.775.221.593	21 de Octubre de 2015	20 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 92%

SECTORES A INTERVENIR:

- Parque Los Pinos
- Parques del Barrio Álvarez
- Cancha Múltiple El Hoyo y Eco gimnasio Barrio Villa Helena
- Cancha de Fútbol y Múltiple Barrio Nápoles
- Barrio Quinta Estrella

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
372 de 2015	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA RURAL	$ 544.830.682	11 de Septiembre de 2015	10 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 95%

6.3 CONSTRUCCION Y/O MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LED EN BARRIOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
327 de 2015	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN CAMPO MADRID.	$ 1.060.331.680	03 de Septiembre de 2015	02 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 70%

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
371 de 2015	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA.	$ 553.821.633	11 Septiembre de 2015	10 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 97%

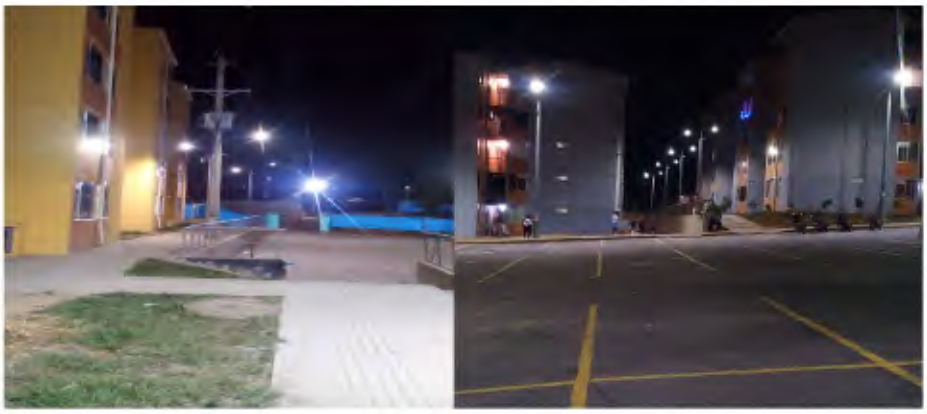

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
457 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO en LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 Y CARRERA 19 DESDE LA CALLE 35 A LA CALLE 31.	$ 433.663.175	11 de Diciembre de 2015	10 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 0%, Suspendido (No han aprobado el PMT)

6.4 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	PROMEDIO TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)
Enero	1171	704	4
Febrero	1090	801	5
Marzo	1135	939	3
Abril	1136	964	3
Mayo	1075	959	2
Junio	970	842	2
Julio	1172	999	3
Agosto	1176	862	3
Septiembre	1179	1112	3
Octubre	1170	1075	1
Noviembre	1085	999	1
Diciembre	700	666	1
TOTAL	**13059**	10922	**2,65**

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
143 de 2014	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE SEDE B	$ 1.869.951.084,94	07 de Julio de 2014	14 de Diciembre de 2015

Estado: Avance de Obra: 100%, se realizó recibo de obra, pendiente liquidar

Alcance General del Contrato

Construcción de cuatro aulas, batería sanitaria y laboratorio en el instituto Gabriela Mistral, construcción de ocho aulas y batería sanitaria en el Colegio Jorge Ardila duarte.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
296 de 2015	ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 536.273.840,97	07 de Septiembre de 2015	07 de Diciembre de 2015

Estado: Avance de Obra: 30%

Actualmente se encuentra Suspendido; debido a una autorización por parte del ICBF

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
402 de 2015	CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE I MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 1.284.719.430,63	23 de Noviembre de 2015	22 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 40%

La primera fase consiste en la construcción del sótano y el primer piso, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

La segunda Fase consiste en la construcción del segundo nivel y placa de terraza, redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y acabados.

8. ROTURAS

Dando cumplimiento a la normatividad vigente para las licencias de intervención y ocupación del espacio público en lo relacionado con redes de servicios públicos y/o de particulares, la secretaria de infraestructura relaciona las actividades desarrolladas de Septiembre a Diciembre de 2015.

A continuación se presenta las diferentes intervenciones en el Espacio Público

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO EN LO RELACIONADO CON REDES DE SERVICIOS PUBLICOS				
Septiembre a Diciembre de 2015	Domiciliarias	Edificios obra nueva	Redes	Total M2
amb	378,37	366,40		744,77
EMPAS	122,80	200,06	198,99	521,85
GASORIENTE	22,55	174,25	79,00	275,80
ESSA		597,54		597,54
HLGAS	89,80	5,60		95,40
TECNOGAS	38,35	7,25		45,60
CLARO COLOMBIA	17,15	24,42		41,57
TELEBUCARAMANGA		46,74	210,00	256,74
ETB	5,00			5,00
LAZUS	5,00			5,00
TOTAL	**679,02**	**1.422,26**	**487,99**	**2.589,27**

9. RELACION DE CONTRATOS POR CONVENIOS EN EJECUCION

APORTES		OBJETO	VALOR CONTRATO
VALOR MUNICIPIO	VALOR NACION		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – DPS-FIP			
$ 694.832.050,00	$ 1.823.702.576,17	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE PILOTES EN EL BARRIO RINCÓN DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 2.518.048.726,70
$ 521.013.510,00	$ 1.087.410.331,12	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL SECTOR DEL BARRIO BUCARAMANGA-COCACOLA DEL	$1,608,423,841

		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	$ 2.452.823.361,00	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE AMENAZA GEOTECNICA EL TALUD SUR DEL BARRIO LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - OBRA FINANCIADA CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL	$ 2.452.481.079,00
$ 521.013.510,00	$ 1.368.639.528,00	CONSTRUCCION FASE I DE OBRAS DE MITIGACION GEOTECNICA EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 1.889.653.032,50
	$ 11.425.760.663,00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACIÓN PARA EL SECTOR CRÍTICO UBICADO EN EL BARRIO BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 11.425.760.663,10
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE			
	$ 1.722.201.220,00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$1,744,161,921
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE – FIDUPREVISORA S.A.			
	$ 9.700.000.000,00	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LOS SECTORES CON AMENAZA DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 9.063.912.416,10
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN-FONDO DE ADAPTACION-COLDEPORTES			
$ 1.118.115.767,94	$ 1.500.860.581,00	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE (SEDE B) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 2.002.894.044,90
$ 191.243.382,84	$ 3.427.920.000,00	RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES DE LOS CORREGIMIENTOS 1 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010 - 2011	$ 3.619.163.382,80
$ 1.500.000.000,00	$ 3.743.827.768,00	AMPLIACION Y ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL SALA 2016 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$5,020,686,161
FIDUCOLDEX-FONTUR, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
$ 23.340.000.000,00	$ 43.000.000.000,00	CONSTRUCCIÓN FASE-1 OBRAS GENERALES Y ESTRUCTURA GRAN SALÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO BUCARAMANGA	$ 20.052.597.972,90
AERONAUTICA CIVIL			
	$ 16.668.965.300,00	CONTRATAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMO SON LAS OBRAS DE MUROS DE FRANJAS SEGURIDAD Y CUARTEL DE BOMBEROS EN EL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	$ 16.668.965.300,00
GOBERNACION DE SANTANDER			

$ 61.237.438.329,57	$ 93.012.943.125,00	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA-FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL-PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 156.123.366.457,00

10. CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION

No. CONTRATOS	SALDO POR PAGAR
56	$ 44.231.254.069
