G.1000.39.01

Bucaramanga, Febrero 25 de 2020

Firma_____
Radicado: 00001020
Enviado: 2[illegible]20
abenitez
ESE ISABU

CONCEJO DE BUCARAMANGA
VENTANILLA UNICA
EXTERNA RECIBIDA 12389
FECHA: 26/02/2020 12389
HORA- 16:07:00
FOL- 8
RECIBE: Wilson A-

Señores:
CONCEJO DE BUCARAMANGA
Atte: HENRY LOPEZ BELTRAN
Secretario General

Cordial saludo,

De acuerdo a cuestionario recibido del cual surgió como Proposición No 048 de febrero de 2020 (Tema: REMODELACION, Y ADECUACION DE CENTROS DE SALUD DE BUCARAMANGA, ADEMAS LA PROYECCION PARA ESTE CUTRENIO); me permito dar respuesta pertinente a cada uno de los ítems de la siguiente manera:

Atentamente,

JUAN EDUARDO DURAN DURAN
Gerente ESE ISABU

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DE BUCARAMANGA, ADEMÁS LA PROYECCIÓN PARA ESTE CUATRIENIO

1. **¿Cuáles fueron las mejoras realizadas a los Centros de Salud de la ciudad de Bucaramanga qué están siendo intervenidos, en relación con la adecuación de su infraestructura?**

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Para el año 2016 la E.S.E ISABU no contaba con un plan de desarrollo, por tal motivo, una vez ingresa la nueva administración, comprometida con el desarrollo de la institución inicia un análisis de la situación en la que se encontraba, realizando a su vez un recorrido por todas las instalaciones o unidades operativas de la ESE y es ahí cuando se encuentra una de las oportunidades en la Modernización de infraestructura.

Ahora teniendo en cuenta el plan de desarrollo Municipal "Gobierno de los Ciudadanas y los ciudadanos" y el resultado de lo estudiado, el equipo de trabajo bajo el liderazgo del Dr. Juan Eduardo Durán Durán, se elabora el plan de desarrollo 2016-2020 denominado "ISABU AVANZANDO CON LOS CIUDADANOS", aprobado mediante la resolución Nº 0372 el 30 de diciembre de 2016, el cual en su visión contempla que para el año 2020 la ESE ISABU, será una empresa auto sostenible, líder en el desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud (MÍAS), con talento humano competente, **infraestructura moderna** y tecnología de punta, para beneficio y goce efectivo de la salud de los ciudadanos de Bucaramanga y su área de influencia.

Apuntando al cumplimiento de tener una infraestructura moderna, bajo el Liderazgo, Compromiso, Transparencia del Gerente y su equipo directivo, el plan de desarrollo priorizó las actividades más importantes, es así como fueron planteados los cuatro objetivos estratégicos para la vigencia 2016-2020, estando la infraestructura inmersa en el cuarto (4) objetivo estratégico "Articulación en redes para la prestación de servicios de salud", el cual contenía un (1) programa y cinco (5) proyectos entre ellos "GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA." que contribuyeron al logro de los objetivos de la modernización de la infraestructura.

Teniendo en cuenta que los recursos que se requerían para la modernización de la infraestructura eran considerables por el estado avanzado de deterioro ocasionado por humedades, cubiertas sin curar, sistemas eléctricos en deterioro, tejas partidas, goteras, cañerías tapadas, falta de mantenimiento en pintura, sistema hidráulico fuera de servicio, canales obstruidos que ocasionaban alto inconformismo y sentimientos lúgubres, de tristeza e impotencia de la comunidad al ver el estado de sus centros de atención para mejoramiento de la salud; se plantea la posibilidad de trabajar mancomunadamente con el municipio de Bucaramanga aportando este parte de los recursos necesarios y realizando la ESE ISABU aportes considerables con recursos propios para la ejecución de los planes y proyectos que conllevaran al cumplimiento de la meta de la modernización de la infraestructura de la Institución.

Por tal motivo se buscó que las acciones que se crearan, fueran acciones de manera coordinada con los demás integrantes del sistema tales como la Secretaría de Salud, Secretaria de Infraestructura, que permitiera trabajar armónicamente en el logro de los objetivos formulados en el correspondiente Plan de Desarrollo **"GOBIERNO DE LOS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS y ISABU AVANZANDO CON LOS CIUDADANOS"**

Es así como la Alcaldía destinó los recursos del Plan Bienal de Inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación en su red pública, que en este caso es la **ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA – ISABU**, como lo establece la Ley 1608 de 2013.

Dando cumplimiento la **E.S.E ISABU** y la alcaldía realizaron 5 acciones de manera coordinada, que permitieron la modernización de la infraestructura y el buen, óptimo y oportuno mantenimiento de las unidades operativas de la **ESE ISABU**, en la cual algunas actividades fueron ejecutadas con recursos de la alcaldía y otras con recursos propios de funcionamiento de la **E.S.E ISABU.**

MEJORAMIENTO DE LA INFRASTUCTURA DE LA ESE ISABU VIGENCIA 2016-2020	
2016	Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita de la ESE ISABU (Se ejecutó con Recursos Propios)
2017	Adecuación mejoramiento y mantenimiento de la planta física del centro de salud IPC, Concordia, Rosario y Café Madrid (Sede vive digital) (Se ejecutó con Recursos Propios)
2018	✓ Mantenimiento y adecuación de centros de salud del municipio de Bucaramanga a través del convenio interadministrativo 227: CS. PABLO VI, CS. TOLEDO PLATA, CS. GAITÁN, CS. VILLA ROSA, CS. REGADEROS, CS. SANTANDER, HOSPITAL LOCAL DEL NORTE. ✓ Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la planta física del centro de salud de Morrorico del instituto de salud de Bucaramanga en el antiguo restaurante el corcovado (Se ejecutó con Recursos Propios)
2019	✓ Construcción, adecuación y remodelación centro de salud **CAFÉ MADRID** (proyecto de obra nueva, ejecutado por el municipio de Bucaramanga entre el año 2018 y 2019, entregada a la ESE ISABU el 4 de julio de 2019). ✓ Adecuación de cocina del hospital local del norte. (convenio interadministrativo 129 de 2019) ✓ Mantenimiento de la red de gases medicinales del hospital local del norte. (Se ejecutó con Recursos Propios)

- ✓ Construcción Sistema de tratamiento de Aguas residuales no doméstica (Recursos propios).
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo del HLN, UIMIST y los centros de salud Cristal Alto, Toledo Plata, Mutis, Pablo VI, Concordia, Santander, Gaitán, Morrorico, Villa Rosa, IPC, Regaderos, Colorados, Comuneros.

2019 - 2020 Remodelación de la infraestructura física de los centros de salud de LIBERTAD, BUCARAMANGA, CAMPO HERMOSO, GIRARDOT, KENNEDY, LA JOYA Y SAN RAFAEL (en ejecución a través del convenio interadministrativo 152 de 2019) (recursos del Municipio de Bucaramanga y la ESE ISABU).

RELACIÓN INVERSIONES MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CENTROS DE SALUD ESE ISABU POR FUENTE DE FINANIACION

2016	$ -	$ 213.350.253,00	$ 213.350.253,00	100%	UIMIST
	$ -	$ 23.268.073,00	$ 23.268.073,00	100%	CERRAMIENTO DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
2017 2018	$ -	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	100%	CAFÉ MADRID SEDE VIVE DIGITAL
	$ -	$ 79.242.279,00	$ 79.242.279,00	100%	C.S. ROSARIO
	$ -	$ 163.432.175,00	$ 163.432.175,00	100%	C.S. IPC
	$ -	$ 87.907.075,00	$ 87.907.075,00	100%	C.S. CONCORDIA
	$ 1.263.654.146,38	$ 588.926.253,22	$ 1.852.580.399,60	32%	HLN, PABLO VI, TOLEDO PLATA, GAITÁN , VILLA ROSA, REGADEROS , SANTANDER
	$ -	$ 47.343.274,00	$ 47.343.274,00	100%	C.S. MORRORICO (CORCOVADO)
	$ -	$ 133.330.726,00	$ 133.330.726,00	100%	CENTROS DE SALUD DE CAMPO HERMOSO, GIRARDOT, BUCARAMANGA, LA JOYA, LA LIBERTAD, SAN RAFAEL
2019	$ -	$ 281.973.779,00	$ 281.973.779,00	100%	MANTENIMIENTO GENERAL HLN Y UIMIST
	$ -	$ 358.010.100,00	$ 358.010.100,00	100%	MANTENIMIENTO GENERAL CRISTAL ALTO-COLORADOS - MUTIS- REGADEROS-COMUNEROS- MORRORICO – CONCORDIA-GAITAN. VILLA ROSA- IPC- PABLO SEXTO TOLEDO PLATA- SANTANDER
	$ 139.889.266,00	$ 2.000.000,00	$ 141.889.266,00	1,41%	COCINA HLN
	$ -	$ 19.913.191,00	$ 19.913.191,00	100%	BASE DE CONCRETO PARA OXÍGENO
	$ -	$ 108.213.827,00	$ 108.213.827,00	100%	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS
	$ 2.388.000.000,00	$ 3.945.533,00	$ 2.391.945.533,00	0,16%	CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID - NUEVO
	$ -	$ 4.516.208,00	$ 4.516.208,00	100%	ALCALNTARILLADO UIMIST
	$ 7.022.843.303,00	$ 80.000.000,00	$ 7.102.843.303,00	1,13%	CENTROS DE SALUD EN REMODELACIÓN KENNEDY, SAN RAFAEL,GIRARDOT, LA JOYA, CAMPO HERMOSO, BUCARAMANGA Y LA LIBERTAD
TOTAL	$ 10.814.386.715,38				

Fuente: Mantenimiento de La Infraestructura de la E.S.E ISABU

En el proceso de poder utilizar los recursos de las Cuentas Maestras que desde el año 2012 estaban en saldos del municipio y cuyos proyectos no fueron aprobados por el Ministerio de Salud por el no cumplimiento de las normas arquitectónicas, costos superiores por metro cuadrado, ausencia de Estudio Médico Arquitectónico, sobredimensionamiento a las necesidades entre otros, el 7 de mayo de 2019 se suscribe con la Alcaldía de Bucaramanga el convenio interadministrativo No. 152 del 7 de mayo de 2019 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD GIRARDOT, KENNEDY, SAN RAFAEL, BUCARAMANGA, CAMPO HERMOSO, LA JOYA Y LIBERTAD" los cuales se encuentran actualmente terminando obra y se proyecta su reinicio de la atención el próximo 24 de marzo de 2020.

Tabla. Convenio 152 De 2019

CONVENIO 152 DE 2019	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 5.315.537.883
VALOR APORTE DE LA ALCALDIA	$ 5.235.537.883,40
VALOR APORTE ESE ISABU	$ 80.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 1.787.305.419,82
VALOR TOTAL DE CONVENIO	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
SUPERVISORES	LUWDIG ALMEYDA DUARTE
FECHA DE INICIO	08/06/2019
FECHA DE FINALIZACION	04/07/2020

Fuente: Mantenimiento De La Infraestructura de la E.S.E ISABU

Con la entrega de estos 7 centros de salud podemos afirmar con certeza que cuando soñamos, planeamos y queremos todo es posible y con orgullo la ESE ISABU con el liderazgo ejercido durante esta vigencia por el Dr. Juan Eduardo Duran Duran, le cumplimos a la ciudad de Bucaramanga con lo propuesto en el plan de desarrollo ISABU AVANZANDO CON LOS CIUDADANOS y hoy **entregamos una infraestructura 100% modernizada** para el uso, goce y disfrute de nuestra comunidad, para que se sientan a gusto en instalaciones que no tienen nada que envidiar a las privadas y costosas del área metropolitana de Bucaramanga, haciendo de la ESE ISABU, una empresa pujante y sostenible que trabaja en mantener estable y mejorando la salud de los Bumangueses.

EMPRESA	CENTROS DE SALUD POR CONTRATO	VR CENTRO DE SALUD	VR TOTAL CONTRATO
CONTRATO 764/2019 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	GIRARDOT	$ 1.074.161.158	**$ 2.770.278.419**
	LA JOYA	$ 1.026.998.424	
	CAMPO HERMOSO	$ 669.118.836	
CONTRATO 763/2019 COASCON S.A.S	BUCARAMANGA	$ 994.521.525	**$ 1.999.643.839**
	LA LIBERTAD	$ 1.005.122.313	
CONTRATO 765/2019	KENNEDY	$ 791.881.056	**$ 1.613.576.884**

UT. CENTROS DE SALUD	SAN RAFAEL	$ 821.695.827	
TOTAL OBRA		**$ 6.383.499.143**	
731/2019 INTERVENTORIA OLMA YOLANDA GIRALDO		**$ 639.344.160**	
GERENCIA DE PROYECTOS ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS		**$ 80.000.000**	
TOTAL INVERSIÓN		**$7.102.843.303**	

REMODELACIÓN 7 CENTROS DE SALUD

CENTRO DE SALUD GIRARDOT

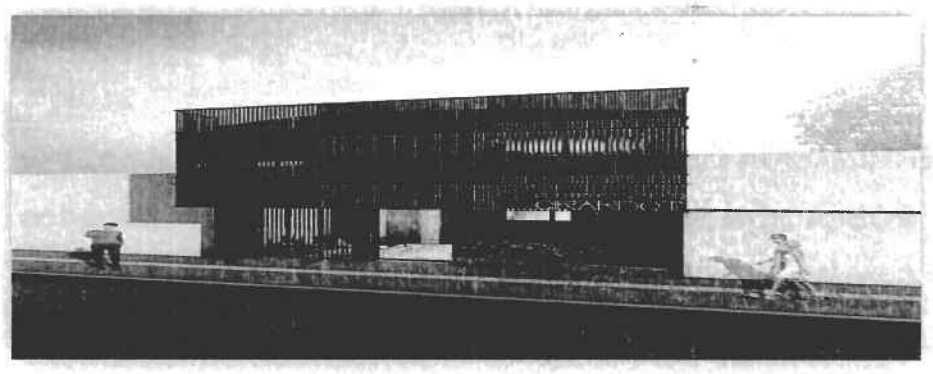

PROYECTO	
VALOR	$ 1.074.161.158
% OBRA EJECUTADA	88%
FECHA TERMINACIÓN DE OBRA CIVIL	28 de Febrero 2020
POBLACIÓN BENEFICIADA	**12.356 Usuarios**
# CONSULTAS MÉDICAS AÑO	31.814
# CONSULTAS ODONTOLÓGICAS AÑO	8.950
# CONSULTA DE ENFERMERÍA AÑO	5.264

CENTRO DE SALUD LA JOYA

PROYECTO	ESTADO
VALOR	$1.027.088.424
% OBRA EJECUTADA	80%
FECHA TERMINACIÓN DE OBRA CIVIL	28 de Febrero 2020
POBLACIÓN BENEFICIADA	**4.050 Usuarios**
# CONSULTAS MÉDICAS AÑO	6.254
# CONSULTAS ODONTOLÓGICAS AÑO	6.106
# CONSULTA DE ENFERMERÍA AÑO	2.333

CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO

VALOR	$669.118.836
% OBRA EJECUTADA	85%
FECHA TERMINACIÓN DE OBRA CIVIL	28 de Febrero 2020
POBLACIÓN BENEFICIADA	**6.794 Usuarios**
# CONSULTAS MÉDICAS AÑO	7.921
# CONSULTAS ODONTOLÓGICAS AÑO	5.391
# CONSULTA DE ENFERMERÍA AÑO	3.065

CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA

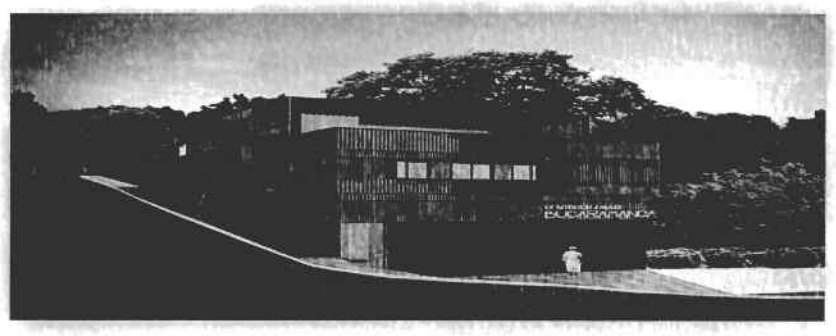

VALOR	**$994.521.525**
% OBRA EJECUTADA	**89%**
FECHA TERMINACIÓN DE OBRA CIVIL	**28 de Febrero 2020**
POBLACIÓN BENEFICIADA	**2.247 Usuarios**
# CONSULTAS MÉDICAS AÑO	**6.978**

 # CONSULTAS ODONTOLÓGICAS AÑO 2.701

 # CONSULTA DE ENFERMERÍA AÑO 1.133

CENTRO DE SALUD LIBERTAD

PROYECTO	ESTADO
VALOR	$1.005.122.318
% OBRA EJECUTADA	85%
FECHA TERMINACIÓN DE OBRA CIVIL	28 de Febrero 2020
POBLACIÓN BENEFICIADA	**5.356 Usuarios**
# CONSULTAS MÉDICAS AÑO	8.517
# CONSULTAS ODONTOLÓGICAS AÑO	5.826
# CONSULTA DE ENFERMERÍA AÑO	1.945

CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL

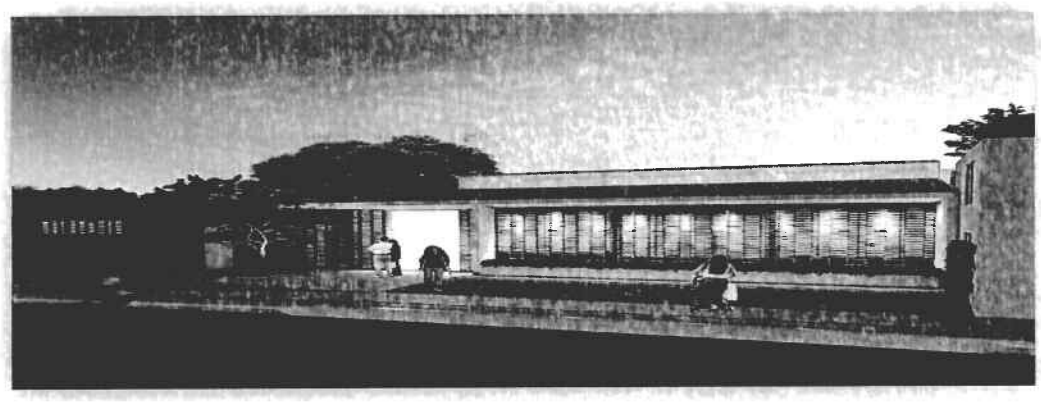

[redacted]	[redacted]
VALOR	$821.695.827
% OBRA EJECUTADA	88%
FECHA TERMINACIÓN DE OBRA CIVIL	28 de Febrero 2020
POBLACIÓN BENEFICIADA	**3.615 Usuarios**
# CONSULTAS MÉDICAS AÑO	8.727
# CONSULTAS ODONTOLÓGICAS AÑO	3.456
# CONSULTA DE ENFERMERÍA AÑO	1.923

CENTRO DE SALUD KENNEDY

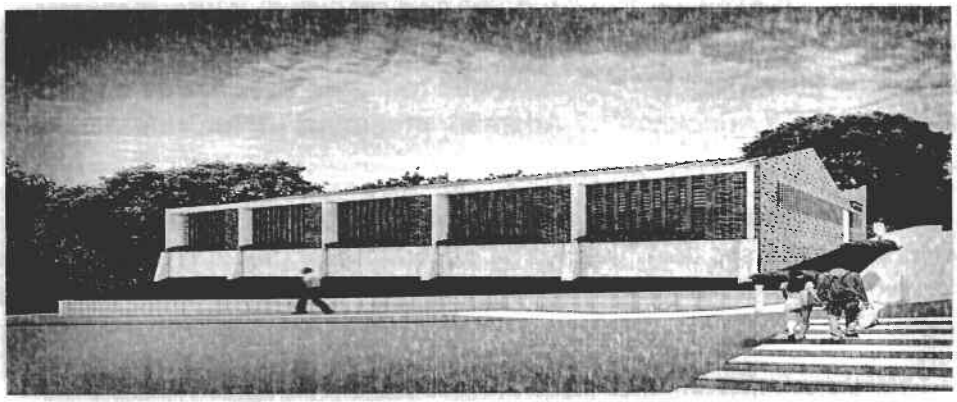

VALOR	**$791.881.056**
% OBRA EJECUTADA	**91%**
FECHA TERMINACIÓN DE OBRA CIVIL	**28 de Febrero 2020**
POBLACIÓN BENEFICIADA	**10.150 Usuarios**
# CONSULTAS MÉDICAS AÑO	**14.035**
# CONSULTAS ODONTOLÓGICAS AÑO	**6.069**
# CONSULTA DE ENFERMERÍA AÑO	**4.178**

2. **¿Cuál es la situación actual de la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresa, UIMIST en relación con su infraestructura, adecuación y modernización de la misma?**

Actualmente la UIMIST es una unidad hospitalaria que presta servicios de primer nivel y algunos de segundo nivel, encontrándose en no cumplimiento con los criterios y estándares de habilitación conforme a la normatividad hospitalaria vigente, resolución 4445 de 1996; habilitación la resolución 3100 de 2019. Es de ahí que la UIMIST se encuentra inscrito en el Plan Bienal 2018 – 2019 para la reposición como obra nueva, en la actualidad el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Infraestructura se encuentra realizando los Diseños.

3. **¿Cuáles y de donde provienen los recursos que han sido destinados en relación con las obras de remodelación y adecuación? Además, presentar un informe detallado de estos recursos.**

Los recursos para la remodelación y adecuación de toda la Red de la ESE ISABU de la gestión 2016 – 2020 proviene de recursos del Municipio de Bucaramanga (cuentas Maestras Decreto 1608 2013, recursos propios para Interventoría) y recursos propios de la ESE ISABU, como se relaciona en la siguiente tabla:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2016	$ -	$ 213.350.253,00	$ 213.350.253,00	100%	UIMIST
	$ -	$ 23.268.073,00	$ 23.268.073,00	100%	CERRAMIENTO DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
2017 2018	$ -	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	100%	CAFÉ MADRID SEDE VIVE DIGITAL
	$ -	$ 79.242.279,00	$ 79.242.279,00	100%	C.S. ROSARIO
	$ -	$ 163.432.175,00	$ 163.432.175,00	100%	C.S. IPC
	$ -	$ 87.907.075,00	$ 87.907.075,00	100%	C.S. CONCORDIA
	$ 1.263.654.146,38	$ 588.926.253,22	$ 1.852.580.399,60	32%	HLN, PABLO VI, TOLEDO PLATA, GAITÁN , VILLA ROSA, REGADEROS , SANTANDER
	$ -	$ 47.343.274,00	$ 47.343.274,00	100%	C.S. MORRORICO (CORCOVADO)
	$ -	$ 133.330.726,00	$ 133.330.726,00	100%	CENTROS DE SALUD DE CAMPO HERMOSO, GIRARDOT, BUCARAMANGA, LA JOYA, LA LIBERTAD, SAN RAFAEL
2019	$ -	$ 281.973.779,00	$ 281.973.779,00	100%	MANTENIMIENTO GENERAL HLN Y UIMIST
	$ -	$ 358.010.100,00	$ 358.010.100,00	100%	MANTENIMIENTO GENERAL CRISTAL ALTO-COLORADOS - MUTIS- REGADEROS- COMUNEROS- MORRORICO – CONCORDIA- GAITAN. VILLA ROSA- IPC- PABLO SEXTO TOLEDO PLATA- SANTANDER
	$ 139.889.266,00	$ 2.000.000,00	$ 141.889.266,00	1,41%	COCINA HLN
	$ -	$ 19.913.191,00	$ 19.913.191,00	100%	BASE DE CONCRETO PARA OXÍGENO
	$ -	$ 108.213.827,00	$ 108.213.827,00	100%	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS
	$ 2.388.000.000,00	$ 3.945.533,00	$ 2.391.945.533,00	0,16%	CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID - NUEVO
	$ -	$ 4.516.208,00	$ 4.516.208,00	100%	ALCALNTARILLADO UIMIST
	$ 7.022.843.303,00	$ 80.000.000,00	$ 7.102.843.303,00	1,13%	CENTROS DE SALUD EN REMODELACIÓN KENNEDY, SAN RAFAEL,GIRARDOT, LA JOYA, CAMPO HERMOSO, BUCARAMANGA Y LA LIBERTAD
TOTAL	$ 10.814.386.715,38				

Los recursos del Municipio se han ejecutado a través de Convenios Interadministrativos entre la ESE ISABU y el Municipio de Bucaramanga.

4. ¿Quién ha realizado la interventoría de las obras de remodelación y adecuación?

En la gestión de 2016 – 2020 dos convenios interadministrativos se han generado interventoría, como se relaciona a continuación:

VIGENCIA	TIPO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	RECURSOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	RECURSOS ISABU	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	INTERVENTORIA	VALOR DE LA INTERVENTORIA
2017 - 2018	ADECUACIÓN	227/2017: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGACONVENIO 227: CS. PABLO VI, CS. TOLEDO PLATA, CS. GAITÁN, CS. VILLA ROSA, CS. REGADEROS, CS. SANTANDER, HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	$ 1.263.654.146,38	$ 588.926.253,22	$ 1.852.580.399,60	INCECOL LTDA AO-47/2017	$ 140.613.065,60
2019 - 2020	REMODELACIÓN	152/2019: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 7.022.843.303,00	$ 80.000.000,00	$ 7.102.843.303	OLMA YOLANDA GIRALDO C-731/2019	$ 639.344.160,00

5. ¿Cuál es la proyección para este cuatrienio, en relación con la remodelación, adecuación y construcción de nuevos Centros de Salud en Bucaramanga tales como él del Barrio Antonia Santos en el sur de la ciudad?

CLÍNICA ANTONIA SANTOS: Construcción (obra nueva) de la clínica Antonia Santos, Dotación Mobiliaria y Biomédica, se debe realizar inscripción en el Plan Bienal (lo de control especial) en Marzo de 2020, por lo anterior los proyectos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos antes del 30 de Junio de 2020. Actualmente la Secretaría de Infraestructura del municipio de Bucaramanga adelanta los Diseños, que deberán obtener licencia de construcción de la curaduría y posterior aprobación por la Secretaria de Salud Departamental y Ministerio de Salud.

UIMIST: Construcción (obra nueva) de la UIMIST, Dotación Mobiliaria y Biomédica, inscripción en el Plan Bienal (lo de control especial) en Marzo de 2020, por lo anterior los proyectos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos antes del 30 de Junio de 2020.

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE: Reforzamiento estructural, ampliación del servicio de Urgencias, se debe realizar inscripción en el Plan Bienal en Marzo de 2020, por lo anterior los proyectos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos antes del 30 de Junio de 2020.

Cambio de ascensores y aire acondicionado central del Hospital Local del Norte.

CENTRO DE SALUD MORRORICO: Compra de lote, realización de diseños y proceso de viabilidad. Dotación Mobiliaria y Biomédica, inscripción en el Plan Bienal en Marzo de 2020, por lo anterior los proyectos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos Antes del 30 de Junio de 2020.

CENTRO DE SALUD CRISTAL ALTO: Compra de lote, realización de diseños y proceso de viabilidad. Dotación Mobiliaria y Biomédica, inscripción en el Plan Bienal en Marzo de 2020, por lo anterior los proyectos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos Antes del 30 de Junio de 2020.

6. ¿Cuál es la proyección para este cuatrienio en relación con la prestación del servicio, planes para la mejora del mismo, eficiencia y calidad de este servicio esencial?

Corresponde a la nueva administración del Municipio de Bucaramanga, que en la actualidad se encuentra en desarrollo del Plan de Desarrollo y a la nueva administración de la ESE ISABU que realizará en el mes de abril el Plan de Desarrollo Institucional, trazar la ruta y generar Planes, Programas y Proyectos encaminados a la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de salud en el cuatrienio 2020 - 2023.
