



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Informe de gestión

Primer trimestre 2024



ÁREA DE PRENSA
Y COMUNICACIONES

www.bucaramanga.gov.co


   Alcaldía de Bucaramanga

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el primer trimestre del año, en el cual ha continuado ejecutando y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución, así mismo la información correspondiente a las acciones adelantadas en cada uno de los diferentes grupos; mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento urbano de la ciudad, estudios y diseños de infraestructura, mejoramiento del espacio público, alumbrado público urbano y rural, malla vial urbana y rural, agua potable y saneamiento básico, obras de mitigación y plan de acción frente a contratos sin liquidación, igualmente el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 31 de Marzo de 2024 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 178.380.894.596,00 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 14.317.344.916,80, equivalente al **8,02%** de ejecución.

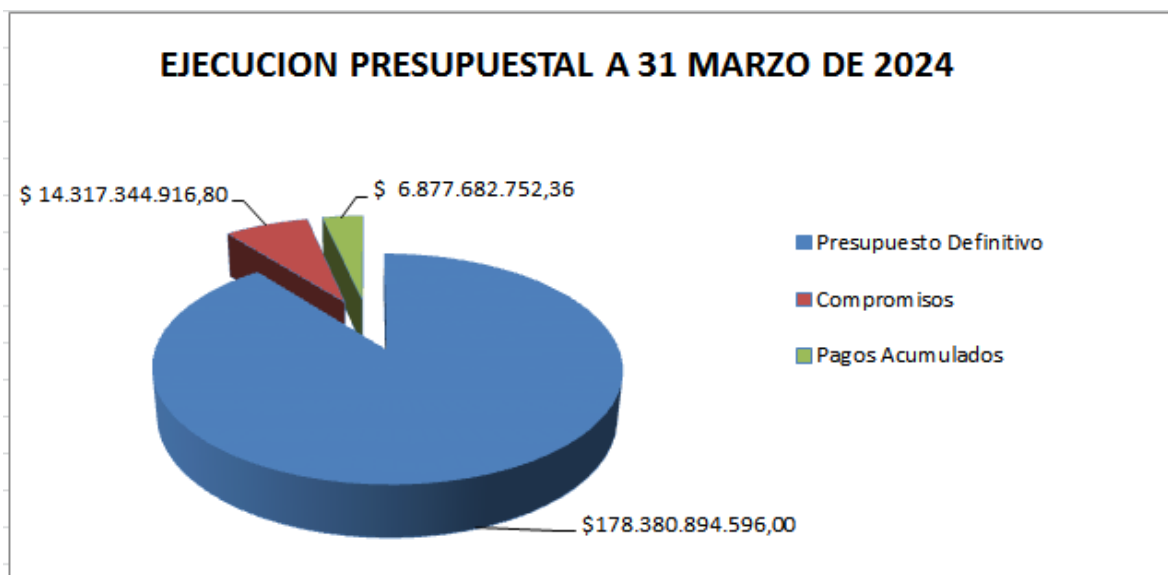

Durante este trimestre se han realizado movimientos presupuestales créditos por valor de \$ 3.845.658.121,84 y contracreditos por valor de \$ 6.264.279.571,84 al presupuesto inicial, necesarios para el desarrollo normal de los diferentes contratos de obra como de interventoría.

2. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La secretaria de infraestructura continúa ejecutando los siguientes contratos, cuyo ordenador de gasto es la Secretaria de Educación.

CONTRATO DE OBRA No. 307 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTE 1.”

VALOR INICIAL : \$ 1.047.230.005,00
 ANTICIPO : \$ 314.169.001,50
 FECHA DE INICIO : 17 de noviembre de 2023
 PLAZO INICIAL : 45 días.
 PLAZO ADICIONAL : 2 Meses y 45 días
 FECHA DE TERM INICIAL: 01 de enero de 2024
 FECHA DE TERM FINAL : 22 de Abril de 2024
 % EJECUCION : 60,68%
 ESTADO DEL CONTRATO: EJECUCION.

El porcentaje de avance del parque es del 68,68%, se viene avanzando en las obras de las diferentes sedes educativas del presente grupo.

IE EL PAULON



Se realizó la adecuación de la zona del arenero izquierdo, donde retira la arena existente la cual se encontraba contaminada por excremento de gatos hasta encontrar sub rasante, se suministró y compacto sub base granular; se aplica solado de limpieza en concreto, placa en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada de refuerzo. Se instala shockpad en el área de intervención y grama tipo tenis. Ejecución: 100%

IE VIJAGUAL SEDE F





Se realiza la intervención en el área de la cancha, baterías de baño y fachada de la escuela.

Se excavo para viga de cimentación de muro de cerramiento, se demuele zona de la cancha que estaba en mal estado, se realiza construcción de muro de cerramiento y viga de cimentación en concreto reforzado en el área de la cancha. Se realiza construcción de placa en concreto reforzado para placa de cancha. Construcción de cerramiento en malla eslabonada sobre el muro, suministro de estructuras de arcos, pintura de líneas de demarcación a la cancha múltiple.

Cambio de enchape en baterías de baños, suministro de sanitarios y dispensadores de papel; desmonte de teja y cambio de cubierta y estructura de techo por cubierta king roof en baterías de baño; cambio de cableado principal de la escuela y suministro de luminarias en baños; construcción de ventanas y puertas en baños

Escafilada, estuco y pintura a fachada de la escuela.

Ejecución: 100%

IE CAFÉ MADRID



Desmante de teja existente y cambio por cubierta en panel doble tendido tipo sándwich a 4 salones, limpieza de canal; mantenimiento y pintura de estructura de techo; suministro de luminarias, tomas y redes eléctrica a 2 salones. Ejecución: 100%

IE CLUB UNION SEDE E



Intervención de baterías sanitarias del primer piso: Baño niños ,baño niñas, baño discapacitados cuarto de aseo donde se realizó la demolición de enchapes y piso; cambio de tubería sanitaria e hidráulica; construcción de muros divisorios y de fachada; suministro de enchapes en piso y pared , construcción de mesón de lavamanos en granito pulido y construcción de lava traperos; suministro de grifería , sanitarios ,orinales, dispensadores de jabón y papel en los baños ; suministro de divisiones en solido fenólico en baño de niñas niños; suministro de red eléctrica , luminarias y sensores de movimientos; suministro de sanitario , barras de seguridad y lavamanos ADA para baño de discapacitados ; suministro de puertas y ventanas para los baños, suministro de espejo biselado.

Intervención en lavamanos externo en el primer piso, se realizó la demolición y suministro de enchape de pared, cambio de grifería de lavamanos, suministro de iluminación y espejo biselado.

Intervención de baños de salones del piso 2 cambio de piso, sanitarios, construcción de lavamanos y suministro de dispensadores de jabón, papel higiénico y espejo.

Ejecución: 100%

IE SALESIANO SEDE C



Demolición de pisos, excavación, suministro de base, placa de concreto reforzada, enchape de salones y pasillos, pintura de salones y pasillos

Ejecución: 100%

IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B



Demolición de piso en concreto, excavación y suministro de sub base, y asfalto MDC-10, suministro de capa nivelante, y pintura, construcción de cárcamo para desagüe de agua lluvia, suministro de arcos de mini futbol.
Ejecución: 100%

IE SAN FRANCISCO DE ASIS



Desmante de redes eléctricas, Suministro de redes eléctricas, tomas e iluminación en 5 salones del 3 piso, suministro de tablero eléctrico y totalizador.
Ejecución: 50%

IE COMUNEROS



Descapote excavación y suministro de base granular, construcción de placa en concreto reforzado, suministro de mesas tipo picnic para el área intervenida.
Ejecución: 60%

CONTRATO DE OBRA No. 308 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTE 2.”

VALOR INICIAL	:	\$ 1.419.087.074,00
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 219.615.660
VALOR TOTAL	:	\$ 1.638.702.734
ANTICIPO	:	\$ 425.726.122,20
FECHA DE INICIO	:	17 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL	:	45 días.
PLAZO ADICIONAL	:	Tres (03) meses
FECHA DE TERM INICIAL:	:	01 de enero de 2024
FECHA DE TERM FINAL :	:	22 de Abril de 2024
% EJECUCION	:	90%
ESTADO DEL CONTRATO:	:	EJECUCION.

El porcentaje de avance del parque es del 90%, se viene avanzando en las obras de las diferentes sedes educativas del presente grupo.

IE POLITECNICO CEDE A CIUDADELA REAL DE MINAS CALLE DE LOS ESTUDIANTES



Se realiza adecuación de cafetería

Se demolió una especie de tarima y se construyó una caseta de comedor escalar realizando vigas de cimentación, zapatas en concreto, relleno, piso en concreto pulido, estructura metálica, cubierta y teja tipo sándwich, portón metálico y la red eléctrica interna con salidas de lámparas.

Ejecución: 100%

IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, ESTORAQUES



Se demolió una huella que había para ir a los salones de preescolar, se adecuó el lugar construyendo un parque infantil en grama sintética y un camino en adoquín, también se dejó un pasillo en grama natural y se hizo un canal con tapas rejilla en concreto prefabricado.

Ejecución: 100.

IE JOSE CELESTINO MUTIS



Se demolió el mortero de la placa del colegio, se fundió mortero impermeabilizado y se impermeabilizó toda el área de la placa.
Ejecución: 90%

IE SANTA MARIA GORETTI SEDE A



Se demolió mortero de dos placas de la institución, se fundió mortero impermeabilizado y se impermeabilizó las placas del ala norte y sur, además se escafilo el estuco y pintura, arreglando la placa, se volvió a estucar y a pintar toda el área afectada.
Ejecución: 100%

IE VICENTENARIO SEDE B



Desmote de 25 rejas y ventanas, mantenimiento y pintura a las rejas para posterior instalación, también se instalaron 25 ventanas de correderas y 3 ventanas en celosía.

Ejecución: 100%

IE NORMAL SUPERIOR



Mantenimiento y pintura de piso en madera zapan e:2mm incluye limpieza manual, resane y laminado de grietas de tablas separadas, suministro e instalación de madera para reemplazo de piso deteriorado, control de plagas por inmunizado manual, pulida y renovación total de pintura de madera existente y piso en general, suministro y aplicación de pintura general y aplicación de pintura base agua alto tráfico, dos capas

Ejecución: 80%

IE IMEN SEDE E DIVINO SALVADOR



Se cambió la cubierta de 5 salones por teja tipo sándwich, se suministró e instaló estructura metálica para esta cubierta, se cambió fachaleta de sócalo en esta institución, se demolió e instaló piso en tablón para los 5 salones y se instalaron los puntos eléctricos de luz, ventiladores y video beam en todos los 5 salones.

Ejecución: 100%

IE JOSE MARIA ESTEVEZ BARRIO SAN MIGUEL



Se cambió parte de la teja del multi - aula de esta institución, se instaló tablón de piso, se construyeron unos muros en mamposterías, se cambió el portón metálico del aula y se instaló el piso en madera de la tarima de esta aula.
Ejecución: 100%

IE MEDALLA MILAGROSA BARRIO PORVENIR



Se realizó todo el cambio de la red eléctrica, voz y datos del aula de informática; también se cambió el cielo raso de esta aula.
Ejecución: 100%

IE NACIONAL DE COMERCIO SEDE A



Se realizó toda la red eléctrica y el suministro e instalación de 6 aires acondicionados para la auditoria de esta Institución
Ejecución: 100%

IE JORGE ARDILA DUARTE SEDE B



Se instaló piso en madera del salón de danzas 1 de esta institución, se suministró e instaló barra de ballet, Espejo en los laterales del salón y 4 muebles en madera en forma de guarda ropa.
Ejecución: 100%

OBSERVACIONES:

1. **Institución educativa de Santander Sede F:** No ha sido posible iniciar actividades por negativa de la rectora a aceptar el proyecto como lo formulo el Municipio de Bucaramanga, razón por la cual no permite ingreso a la institución educativa para realizar trabajos.
2. **Institución educativa Santo Ángel sede A:** No ha sido posible iniciar actividades dado que en la institución educativa se evidencian grietas y asentamientos en el suelo. Se realizó visita con especialistas por parte del Municipio de Bucaramanga y se determinó que se hace necesario realizar estudio del suelo para determinar las causas del asentamiento. Dado que el estudio no está contemplado en el alcance del contrato a un no se ha podido iniciar actividades.



3. **Institución Educativa Dámaso Zapata-Sede C:** No ha sido posible dar inicio a las actividades dado que, una vez socializado el proyecto, el Sr. Rector de la Institución Educativa solicitó un ajuste al proyecto y cambiar el área de intervención, razón por la cual se hace necesario reajuste al diseño por parte del Municipio de Bucaramanga. Adicionalmente el día 19 de marzo de 2024 se realizó visita por parte de ingenieros estructurales y geotecnista por parte del Municipio de Bucaramanga en aras de evaluar los asentamientos y grietas en el muro de cerramiento de IE, con el objeto de evaluar la pertinencia de realizar la intervención en la institución. Razón por la cual a la fecha se encuentra en espera de informe de especialistas y no ha sido posible iniciar actividades.



Así mismo el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura continúa ejecutando el contrato interadministrativo con FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, mediante el contrato:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 166 de 2023: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR FISCAL INICIAL	:	\$ 79.668.991.613,00
VALORES ADICIONALES	:	\$ 5.095.591.608,00
VALOR TOTAL	:	\$ 84.764.583.221,00
PLAZO INICIAL	:	VEINTE (20) MESES
FECHA DE INICIO	:	12 DE JULIO DE 2023

En comunicación enviada por el Sr. Alcalde JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTINEZ a FINDETER, el día 23 de febrero de 2024, se solicitó la suspensión de las convocatorias para la ejecución de las obras de las IE objeto de dicho Convenio Interadministrativo.

FINDETER emite un Acta de Cancelación el día 26 de febrero de 2024.

Por lo anterior nos encontramos a la espera, de un nuevo pronunciamiento por parte de FINDETER.


3. EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 448 DE FECHA 30 de diciembre de 2022: “CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

VALOR INICIAL	:	\$ 9.097.194.874,05
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 529.406.212,98
VALOR TOTAL ACTUAL	:	\$ 9.626.601.087,03
VALOR ANTICIPO INICIAL:	:	\$ 2.620.556.313,30
PLAZO INICIAL	:	10 MESES
PLAZO TOTAL	:	10 MESES Y (19) DIECINUEVE DIAS
CALENDARIO		
FECHA DE INICIO	:	13 de febrero de 2023
FECHA DE SUSPENSION:	:	22 de Diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	:	TERMINO DE SUSPENSION + 9 DIAS (26/04/2024)
% EJECUCION	:	80,93%
ESTADO DEL CONTRATO:	:	Suspendido desde el 22/12/2023



REGISTRO FOTOGRAFICO AREA TÉCNICA PLANTA ARQUITECTONICA

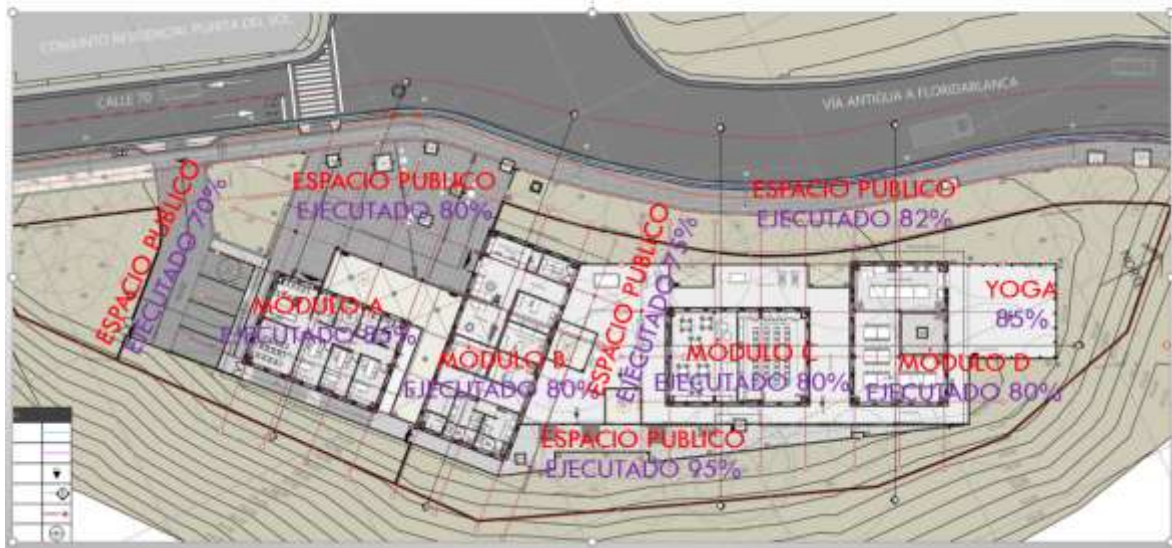

VISTA MÓDULO A - CENTRO VIDA ANTONIA SANTOS



VISTA INTERNA MÓDULO B - CENTRO VIDA ANTONIA SANTOS



VISTA MÓDULO C - CENTRO VIDA ANTONIA SANTOS



ÁREAS DE URBANISMO TOTEM DE LETRERO DE AVISO / ACCESO PEATONAL - CENTRO VIDA ANTONIA SANTOS



ÁREAS DE URBANISMO PLAZOLETA DE YOGA - CENTRO VIDA ANTONIA SANTOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 316 DE FECHA 15 de noviembre de 2023: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

VALOR INICIAL	: \$380.844.085,18
VALOR ANTICIPO	: \$114.253.225,55
PLAZO INICIAL	: 1 mes y 15 días
PLAZO ADICIONAL N° 1	: 45 días
PLAZO TOTAL	: 1 mes y 60 días
FECHA DE INICIO	: 26 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION	: 27 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE REINICIO	: 15 DE ENERO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 12 de abril de 2024
ESTADO DEL CONTRATO	: EN EJECUCIÓN
PORCENTAJE AVANCE FISICO	: 60,00%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un 60% de avance, Actualmente, se está llevando a cabo la instalación del cerramiento metálico en el separador ubicado entre la carrera 15, desde la avenida Quebrada Seca hasta la calle 33. Este proceso incluye la soldadura de elementos metálicos para el cerramiento y la fundición de vigas que forman parte de su estructura. Entre las actividades ejecutadas hasta el momento se destacan la demolición, la excavación y la fundición actividades que se realizaron, que sirvieron para la creación de vados, rampas y bolardos, lo cual abarca las aceras orientales, occidentales y el separador áreas a intervenir.





SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA VADOS SOBRE SEPARADOR CARRERA 15



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA VADOS SOBRE SEPARADOR CARRERA 15



ANTES DE LA INTERVENCION SEPARADOR CARRERA 15 CON CALLE 33



RESULTADO VADO SEPARADOR CARRERA 15 CON CALLE 33



ANTES DE LA INTERVENCION RAMPAS CARRERA 15 CON CALLE 31



RESULTADO DE FUNDICION RAMPAS CARRERA 15 CON CALLE 31

CONTRATO DE OBRA 184 DE 2023 - : CONSORCIO LA VICTORIA II
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

Valor del contrato: \$ 12.918.441.253,19
 Plazo Inicial Seis (6) meses.
 Fecha de Inicio: 08 de agosto de 2023
 Fecha de terminación: 07 de febrero 2024
 Porcentaje avance: 7%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido, ya que se está realizando el ajuste de la estructura de la rampa (cimentación), con el fin de minimizar el riesgo del talud.

CONTRATO DE OBRA 426 de 2022 - : CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC
“ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1”.

Valor del contrato: \$ 7.185.094.791,00
 Plazo inicial: Ocho (08) meses
 Plazo Adicional: Dos (02) meses
 Plazo Total Diez (10) meses
 Fecha de inicio: 01 de junio de 2023
 Fecha de terminación: 30 de enero de 2024
 Nueva Fecha de terminación: 14 de mayo de 2024
 Porcentaje avance: 52 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución y a la fecha se han realizado, cambio de puntos eléctricos de 11 a 6 puntos en restaurantes, avance en instalación de mampostería en los baños, frisado de muros perimetrales sector restaurante, instalación de estribos en columnetas, armado de andamios para actividades pintura de fachadas en la CRA 23, delimitación y señalización de área de trabajo para actividades ejecutadas en fachada



	
<p>Imagen: Cambio de puntos eléctricos de 11 a 6 puntos en restaurantes</p>	<p>Imagen: Avance en instalación de mampostería en los baños</p>

CONTRATO DE OBRA 445 de 2022 -: CONSORCIO PLAZAS JGV 2022 “ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2”.

Valor fiscal:	\$ 4.212.966.188,00
Plazo inicial:	Seis (06) meses
Plazo Adicional No 1:	Quince (15) días
Plazo Adicional No 2:	Un (01) mes y Quince (15) días
Plazo Adicional No 3:	Dos (02) meses
Plazo Total	Diez (10) meses
Fecha de inicio:	01 de junio de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2023
Nueva Fecha de terminación:	14 de mayo de 2024
Porcentaje avance:	65%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución y a la fecha se ha realizado instalación de rejas para cárcamos, instalación de malla electro soldada para placa de contrapiso, fundida de placa de contrapiso, demolición de pisos existentes, allanado, ratoneado y rayado de placa.

	
<p>Imagen: Instalación de malla electrosoldada para placa de contrapiso</p>	<p>Imagen: Demolición de pisos existentes</p>

	
<p>Imagen: Instalación de rejas para cárcamos</p>	<p>Imagen: Fundida de placa de contrapiso</p>

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.313 DEL 2022: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

Se suscribió el convenio Interadministrativo con el Área Metropolitana de Bucaramanga para garantizar el mantenimiento de los parques y áreas verdes pertenecientes al espacio público del Municipio de Bucaramanga.

PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VALOR INICIAL:	\$ 4.212.665.314,47
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11 DE JULIO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCIÓN


Se firmó otro si del adicional con valor de **MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (1.940.992.350,93)**. el día 10 de agosto del 2023 correspondiente al valor fiscal y en plazo, para continuar realizando las actividades correspondientes al mantenimiento de los parques y conservación de la cobertura vegetal.

NUEVO VALOR FISCAL: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 6.221.038.332,27)

NUEVO PLAZO: 19 MESES

De acuerdo con el balance del convenio se realizó prorroga en plazo por 4 meses a partir del mes de marzo para ejecución en los meses de marzo, abril, mayo, junio y parte del mes de julio del 2024

ESTADO DEL CONTRATO: Durante la ejecución del convenio se ha realizado la atención de 225 parques, 140 zonas verdes, 23 separadores, 13 Glorietas y 7 Ciclorrutas, que requieren el corte de césped o maleza, buscando atender las 17 comunas del municipio de Bucaramanga. Para la vigencia en curso se ha brindado apoyo en la limpieza de fuentes en el parque de las cigarras barrio real de minas y parque de los enamorados en el barrio Provenza y despeje de canaletas con hojarascas en parques.

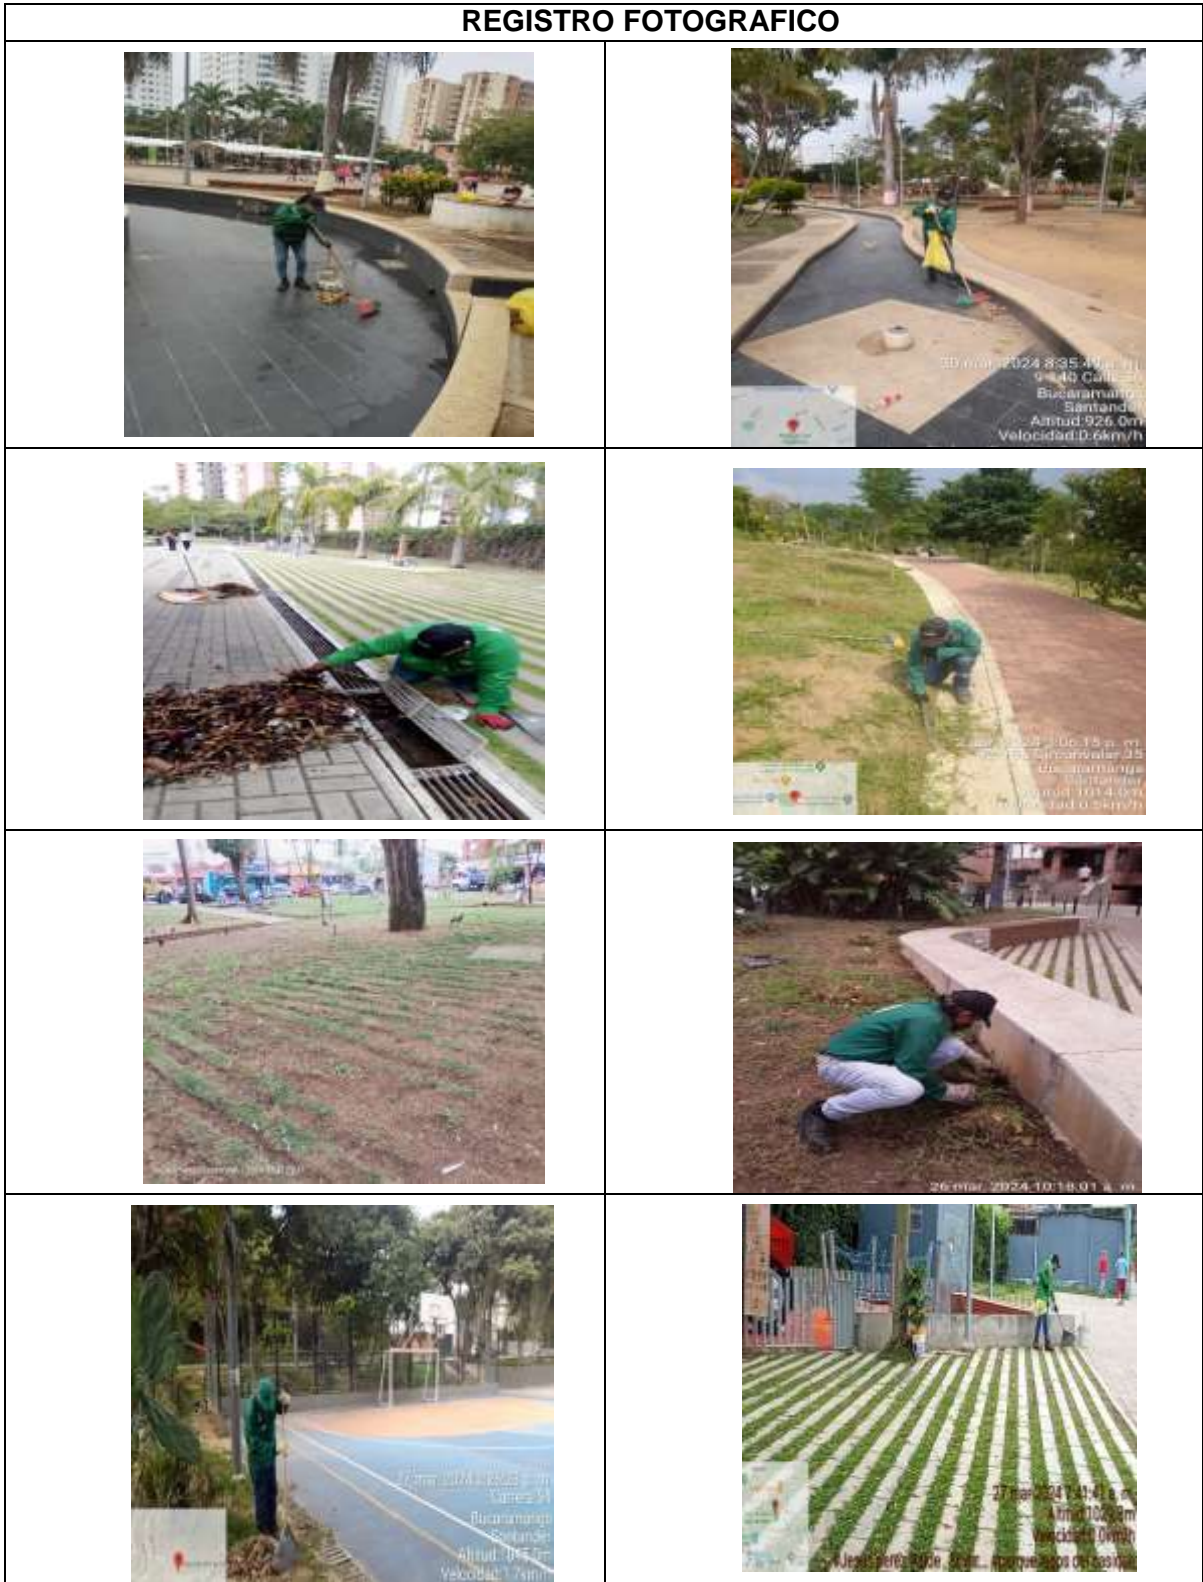

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023:” REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Se suscribió Contrato Interadministrativo con la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA “EMAB” para garantizar la atención de las talas o el manejo integral que requieren los árboles ubicados en el espacio público del municipio de Bucaramanga y cuentan con autorización de la CDMB para su intervención.

VALOR FISCAL: \$ 659.773.955,15
 PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DIAS
 FECHA INICIO: 23 DE JUNIO DE 2023
 FECHA TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 FECHA DE SUSPENSION: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
 FECHA DE REANUDACION: 29 DE FEBRERO DE 2024
 FECHA DE TERMINACION: 10 DE MARZO DE 2024
 ESTADO DEL CONTRATO: TERMINADO
 PORCENTAJE DE AVANCE: 100%




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 292 DE FECHA 03 de noviembre de 2023: “ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR INICIAL : \$2.193.042.076,00
 VALOR ANTICIPO : \$657.912.622,80
 PLAZO INICIAL : 1 MES Y 45 DIAS
 FECHA DE INICIO : 05 de diciembre de 2023
 FECHA DE TERMINACION : 19 de enero de 2024
 ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO
 PORCENTAJE AVANCE : 5%

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los diseños establecidos, el contratista realizó las labores preliminares, tales como topografía y reconocimiento del área.

El contratista se encuentra en proceso de búsqueda de personal idóneo y se estima reiniciar en los primeros días del mes de abril, para retomar la ejecución del parque.

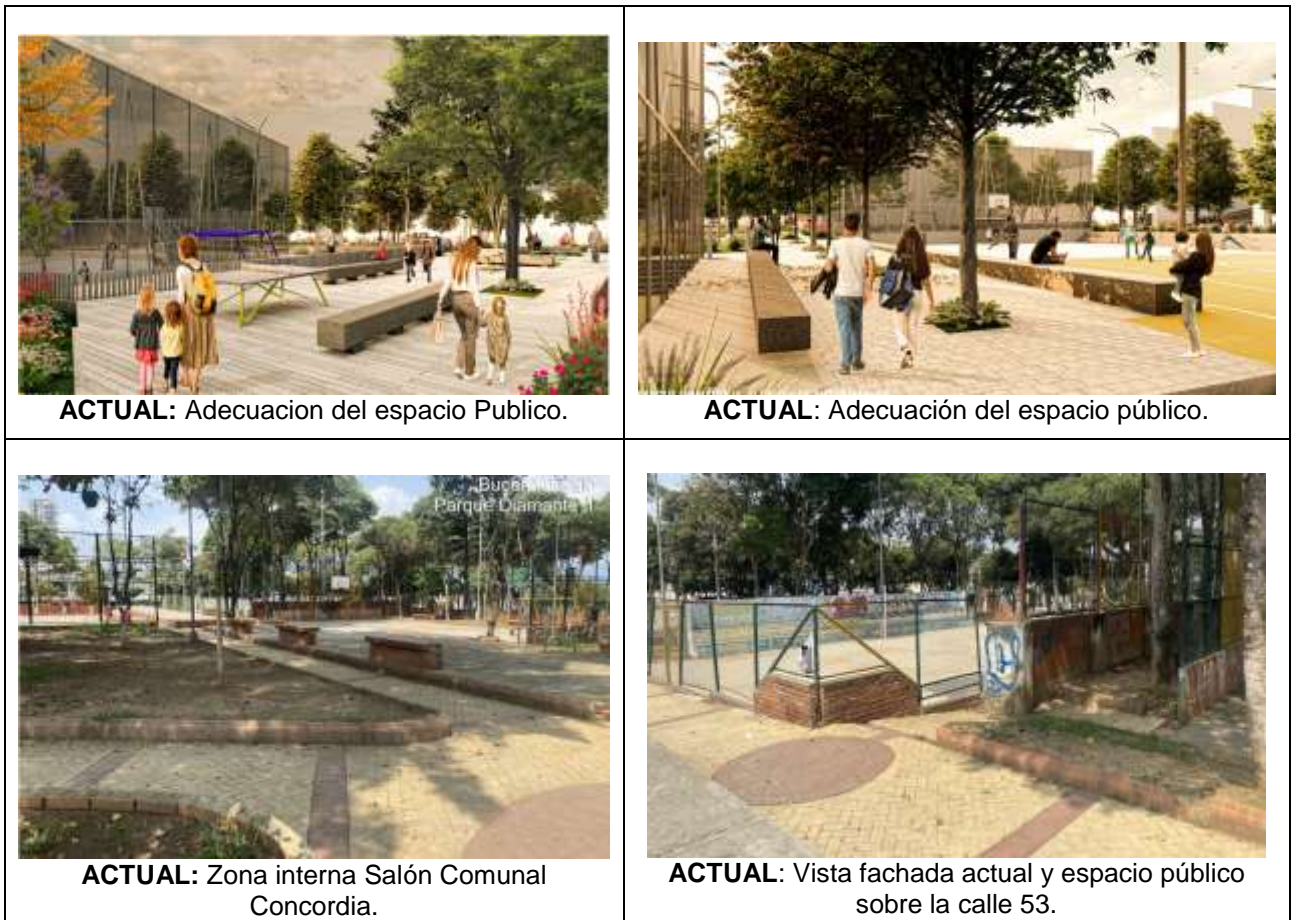


CONTRATO DE OBRA No. 37 de 2022: “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO No. 2” VILLA MERCEDES

VALOR INICIAL	: \$ 406.829.486
VALOR ADICIONAL	: \$ 113.779.508
VALOR TOTAL	: \$ 520.608.994
FECHA DE INICIO	: 28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	: 26 de diciembre de 2023
ESTADO DEL CONTRATO	: TERMINADO
PORCENTAJE AVANCE	: 100% (Según informe anterior)

ESTADO DEL CONTRATO: Estos datos son acordes al informe entregado en el trimestre anterior, presentado por el Ing. Pedro Ballesteros, supervisor vigencia 2023.

Adicionalmente la secretaria se encuentra realizando trámites relacionados al estado actual del mismo, para su terminación y/o recibo final y/o liquidación.

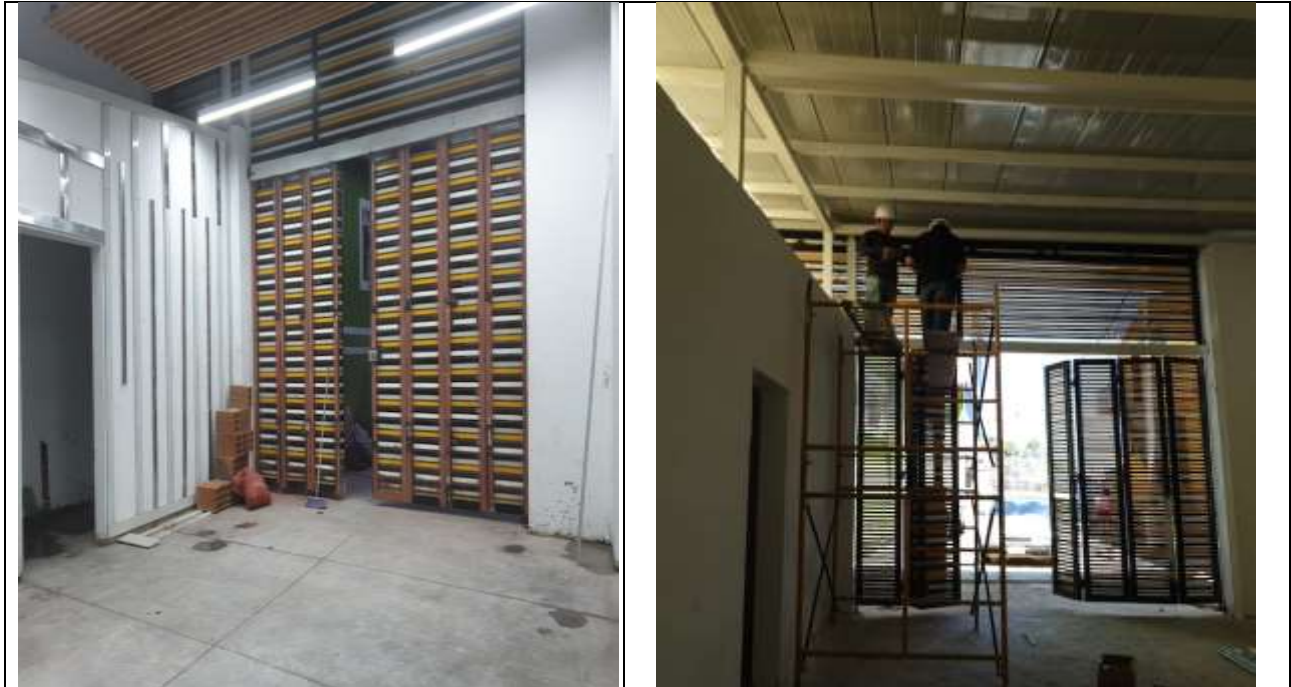

CONTRATO DE OBRA No. 38 de 2022: “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO No. 1.” COLORADOS

VALOR INICIAL	: \$ 479.947.142
VALOR ADICIONAL	: \$ 239.973.571
VALOR TOTAL	: \$ 719.920.713
FECHA DE INICIO	: 28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	: 26 de diciembre de 2023
ESTADO DEL CONTRATO	: SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	: 48%

ESTADO DEL CONTRATO: Estos datos son acordes al informe entregado en el trimestre anterior, presentado por el Ing. Pedro Ballesteros, supervisor vigencia 2023.

Adicionalmente la secretaria se encuentra realizando trámites relacionados al estado actual del mismo, para su terminación y/o recibo final y/o liquidación.





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 408 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 1.

CONTRATISTA	: CONSORCIO ADECUACIONES JGV 2022
INTERVENTOR	: CONSORCIO INTERSANTANDER
SUPERVISOR	: WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL	: \$ 7.031.227.735,05
VALOR ANTICIPO	: \$ 2.109.368.320,52
PLAZO INICIAL	: SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	: 27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	: 26 DE AGOSTO DE 2023
ADICION EN PLAZO	: 20 DIAS
NUEVA FECHA TERMINACION:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION	: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
F. REINICIO	: 5 DE ENERO 2024
F. FINALIZACION	: 6 DE ENERO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE	: 100%

ALCANCE: Adecuación del equipamiento y escenarios deportivos cancha Hamacas, cancha escuela Norte bajo, parque Infantil Barrio Santander, Parque Leones, parque

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en proceso de liquidación

BARRIO HAMACAS





Cancha múltiple y parque infantil y gimnasios

PARQUE LEONES



CANCHA MULTIPLES, PISTA DE PATINAJE, GIMANSIOS, SENDEROS PEATONALES



CANCHA MULTIPLES, PISTA DE PATINAJE, GIMANSIOS, SENDEROS PEATONALES

PARQUE BARRIO SANTANDER



PARQUE INFANTIL, ZONAS VERDES, SENDEROS PEATONALESM, CERRAMIENTO PERIMETRAL

CANCHA BARRIO BOSQUE NORTE



CANCHA MULTIPLE CERRAMIENTO PERIMETRAL, ESPACIO PÚBLICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 409 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 2.

CONTRATISTA	: CONSORCIO DEPORTIVOS SM
INTERVENTOR	: CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13
SUPERVISOR	: WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL	: \$6.255.943.671,35
VALOR ANTICIPO	: \$1.876.783.101,41
PLAZO INICIAL	: SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL	: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	: 10 DE ABRIL DE 2023
FECHA FINAL	: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION	: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	: 40%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato No 409 de 2022 se encuentra suspendido en trámite de adicional No 2 en Plazo y del Adicional en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No 12 del 14 de febrero de 2023.

PARQUE BRISAS DEL MUTIS



PARQUE BARRIO PLAZUELA REAL



GIMNASIO CIUDAD BOLIVAR



GIMNASIOS DE ALTO
RENDIMIENTO, SENDEROS
PEATONALES
ALUMBRADO PÚBLICO 80%

PARQUE BARRIO LA FLORESTA	BARRIO LA SALLE	
		
<p>PARQUE INFANTIL, SENDEROS PEATONALES ZONAS VERDES 80%</p>	<p>CANCHA FUTBOL Y CANCHA MULTIPLE JUEGOS INFANTILES 50%</p>	

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 410 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 3.

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS
 INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVIAS RS
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$6.417.027.743,27
 VALOR ADICIONAL : \$ 1.340.000.000
 PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DOS MESES Y MEDIO
 FECHA DE INICIO : 27 DE FEBRERO DE 2023
 FECHA FINAL : 5 DE FEBRERO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 70%

ESTADO DEL CONTRATO: : El contrato No 410 de 2022 se encuentra suspendido en trámite de adicional No 2 en Valor y Plazo y del Adicional en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No 447 de 2022.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 410 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 3.

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS
 INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVIAS RS
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$6.417.027.743,27
 VALOR ADICIONAL : \$ 1.340.000.000
 PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DOS MESES Y MEDIO
 FECHA DE INICIO : 27 DE FEBRERO DE 2023
 FECHA FINAL : 5 DE FEBRERO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 70%

ESTADO DEL CONTRATO: : El contrato No 410 de 2022 se encuentra suspendido en trámite de adicional No 2 en Valor y Plazo y del Adicional en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No 447 de 2022.



ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DIAMANTE 1 AVANCE 100%



CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLE Y CANCHA BOLEY VOL SENDEROS,
ECO -GIMNASIO AVANCE 100%



CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLE Y PATINODROMO JUEGOS INFANTILES,
ALUMBRADO PUBLICO AVANCE 70%

CONTRATO DE OBRA No. 333 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
“ADECUACION DEL SALON COMUNAL RINCON DE LA PAZ DE LA COMUNA NO. 5 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR INICIAL : \$ 368.226.958,00
 ANTICIPO : \$ 110.468.087,40
 FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2023
 PLAZO INICIAL : 45 días.
 FECHA DE TERM INICIAL: 28 de enero de 2024
 % EJECUCION : 0%
 ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO

El porcentaje de avance del parque es del 0%, la única actuación una vez iniciado el contrato fue la socialización del inicio de actividades, el contrato se suspendió debido a que por época decembrina y de fiestas, se contaba con escasez de materiales y de mano de obra.

4. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCUTRA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 280 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO ALTOS DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

VALOR INICIAL : \$267.377.530,00
 VALOR ANTICIPO : \$210.256.340,00
 PLAZO INICIAL : 1 MES Y 45 DIAS
 FECHA DE INICIO : 08 de Noviembre de 2023
 FECHA DE TERMINACION : 31 de Diciembre de 2023
 ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO
 PORCENTAJE AVANCE : 80%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato ejecutó las actividades de levantamiento topográfico, caracterización geológica y geomorfológica, y exploración y caracterización geotécnica a partir de perforaciones, apiques y ensayos geofísicos, análisis hidrológico, análisis de vulnerabilidad, amenaza y riesgo. A partir de esta información se proponen las medidas de mitigación para abordar los posibles riesgos de los elementos expuestos del barrio Altos del Kennedy y un presupuesto estimado del costo de estas medidas.



Perforación de sondeo

Apique



Toma de apique

Toma de apique

RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Para la recuperación integral del Coliseo, se requirió realizar gestiones para elaborar estudios técnicos y un proyecto de intervención necesario como base para futuras obras de intervención. En el año 2023, el Ministerio de Cultura incluyó dentro de su plan de acción recursos por el orden de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000) para iniciar la recuperación del BICN. Como contrapartida, la Alcaldía de Bucaramanga aportó TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000) para cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos e interventoría de los mismos. A continuación, se presenta la información general del convenio

Convenio Interadministrativo No. 3985-2023	
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Valor total	\$ 800.000.000
Aportes	
Ministerio de Cultura	\$500.000.000
Total aporte Ministerio	\$500.000.000
Municipio de Bucaramanga	\$300.000.000
Total aporte Departamento	\$300.000.000
Plazo de ejecución	
Fecha de inicio	19 de julio de 2023
Término de ejecución	Hasta el 31 de diciembre del 2024
Supervisión	
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio.
Municipio de Bucaramanga Secretaría de Infraestructura	Jorge Alejandro García Henao. Supervisor convenio.
Contratos derivados del convenio:	

Contrato derivado del convenio

CONTRATO DE OBRA No. 253 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL COLISEO PERALRA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

VALOR INICIAL : \$ 625.069.999,00
 FECHA DE INICIO : 23 de octubre de 2023
 PLAZO INICIAL : 3 meses
 PLAZO ADICIONAL : 2 meses
 FECHA DE TERM INICIAL: 01 de junio de 2024
 % EJECUCION : 15%
 ESTADO DEL CONTRATO: 60%

Este contrato contempla actividades de diagnósticos estructurales y sísmicos entre otros.

5. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 28 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023:
ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2.

CONTRATISTA:	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER NIT: 901677404-6
FECHA DEL CONTRATO:	02 DE MARZO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.933.580.689,00
VALOR ADICIONAL	\$467.586.244,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$2.401.166.933,00
VALOR DEL ANTICIPO (30%):	\$561.910.089,42
ANTICIPO ACUMULADO AMORTIZADO:	\$561.910.089,42
FECHA INICIO:	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	14 DE JULIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1	24 DE JULIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 2	15 DE ENERO DE 2024
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 2:	VEINTICINCO (25) DÍAS
PRORROGA 3:	VEINTE (20) DÍAS
PRORROGA 4:	OCHO (8) DÍAS
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES Y CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS
ULTIMA FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE FEBRERO DE 2024

PORCENTAJE AVANCE FISICO ACUMULADO: 94,05 %

ESTADO DEL CONTRATO: Una vez realizada verificación de ejecución por parte de la interventoría, se detectan frentes de obra con faltantes como son en los barrios La Feria, La Aurora y Mejoras Públicas, a saber:

- LA AURORA Calle 32 entre Carreras 27 – 28 costado norte:

- Pendientes frente al predio Garcillantas: Demolición 13.30 x 4.55 (mts 2), instalación de rampa baja 17.40 ml, subbase y loseta 13.30 x 2.80 (mts 2), adoquín 13.30 x 1.75 (mts 2), sardinel 3 ml.
 - Bolardos 16 unidades
 - 10 contenedores de raíces
- LA FERIA CII 27 entre 1 y 2 Occidente
- Rampa de Acceso a parqueadero 3,65 x 7,60 (mts 2)
 - Instalación de sardinel rampa baja 7,60 ml.
 - Instalación de prado japonés franja ambiental 17 x 1.30 (mts 2), entre los predios esquina billar 1-30 a predio 1-89
 - Instalación de prado japonés franja ambiental 38.17mts x 1,26 (mts 2) predio 1-78 y 1-47
 - Instalación de espacio público de los predios CII 28 1-45 a 1-61 longitud 17.80 ml; instalación de sardinel 4.50 ml y rampa baja 5 ml; instalación subbase y loseta de 17.80 x 2,0 (mts 2); franja ambiental 12.80 x 1.26 (mts 2); rampa acceso a parqueadero 5.0 x 1.26 (mts 2)
 - Pendientes Predio 1-61: Demolición de sardinel 30.30ml, instalación de subbase y loseta 30.30 x 2 (mts 2), instalación de sardinel 23.50ml, instalación de rampa baja 6.80ml, acceso rampa vehicular 6.80 x 1.0 (mts 2), instalación de franja ambiental 23.50 x 1.0 (mts 2).
- MEJORAS PUBLICAS CII 34 entre CRA 33 y 32 y CRA 33 entre calle 33 y 34.
- Predio # 32-83: subbase y loseta 10 x 3.20 (mts 2) y adoquín 10 x 2.50 (mts 2)
 - Demolición predio 32-119, 26.60 x 5.85 (mts 2), demolición de sardinel 30 ml, subbase y loseta 26.60 x 3.20 (mts 2), adoquín 23.25 x 2.50 (mts 2). Instalación de sardinel 23.25 ml, instalación rampa baja 13.65 ml.
 - Construcción alcorques o contenedores de raíces -7 contenedores de raíz
 - Realizar la instalación de los bolardos- 12 unidades.

Adicionalmente se encuentran pendientes por correcciones a las actividades ejecutadas en estos y otros frentes, así como mejoras en los elementos intervenidos, las cuales deben ser atendidas por parte del contratista, para que la obra quede recibida a satisfacción, a saber:

- LA AURORA Calle 32 entre Cras 27 – 28 Sur:
- Pendiente Franja de ajuste sardinel vía.
 - Arreglo tapa esquina Carrera 27
 - Cambiar loseta amarilla
 - Cambiar loseta lisa x2
 - Sello arena amarilla en todo el frente
 - Limpieza loseta al lado de la caja
 - Reemplazar loseta Lisa
 - Arreglo piso de caja
 - Cambio loseta entrada parqueadero 2 unidades
 - Cambio loseta amarilla parqueadero 2 unidades
 - Cambio loseta guía parqueadero 2 unidades
 - Sardinel ingreso parqueadero universidad
 - Cambiar loseta amarilla esquina Carrera 28 y sello de arena
- LA AURORA Calle 32 entre Cras 28 – 29 Norte:
- Rellenar alcorque frente a la tienda

- Cambiar loseta predio 28-15
 - Arreglar hombros vado vehicular predios 28-17
 - Sello de arena fina en lo adoquines en todo el frente
 - Pendiente arreglo sardineles edificio Aurora imperial
 - Sello loseta amarilla - manejar
 - Arreglar franja de ajuste - manejar
 - Arreglar franja de ajuste vial
 - Cambio loseta partida manejar 2 unidades
 - Instalar losetas guías hacia el vado peatonal
 - Arreglar rampa bajas vado peatonal manejar carrera 29
- LA AURORA Calle 32 entre Cras 29-30 Norte:
- Sellar ingreso parqueadero Carrera 29
 - Resanar predios
 - Sello arena adoquines
 - Limpieza de cajas
 - Rellenar alcorques predio 29-45
 - Resanar poste predio 29-17
 - Mejorar sardineles predio 29-17
 - Cambiar loseta esquina Carrera 30
- QUINTA ESTRELLA :
- Arreglo de 2 rampas peatonales
- EL PRADO Cra 36 entre CII 35 y 36:
- Cambio de losetas guías y adoquín partidos
 - Pendiente sello de arena
 - Pendiente cintas de ajuste
 - Resanar sardineles
- EL PRADO CII 36 entre CRA 36 36a y 37:
- Cambio losetas partidas
 - Resane sardineles
 - Junta de sardinel
 - Instalación bolardos 6
- EL PRADO Cra 35 entre CII 36, 37 y 38
- Arreglo franja peatonal (dejar a una sola pendiente todas las franjas de circulación) predio 36-29.
 - Sella arena espacio público.
 - Arreglo de alcorques
 - Cambio losetas partidas
 - Siembra de prado japonés
 - Sello de arena
 - Arreglo de tapa de inspección sumidero
 - Arreglo rampa de transición esquina CII 38
 - Cambio de tapa de acueducto
 - Instalación bolardos 8
- NUEVO SOTO MAYOR Av Gonzáles Valencia
- Instalación de 6 bolardos
 - Arreglo de sardineles
 - Cambio de losetas partidas
 - Arreglo de gradas COOSALUD

- NUEVO SOTO MAYOR CII 50 entre AV Gonzáles y Cra 23, costado norte y sur
 - Instalación de 6 Bolardos.
 - Cambio de losetas partidas
 - Arreglo de sardineles
 - Instalación de prado japonés
 - Pendiente Tapas de acueducto
 - Rellenos de alcorques

- SOTO MAYOR CII 44 entre Cra 28 Y 29 sur
 - Sello arena loseta predio shampoo, todo el frente
 - Tapa para bajante de aguas lluvias

 - Resane ingreso predio Fourty Four
 - Instalación de tapa
 - Relleno alcorque predio #28-46
 - Quitar residuo de mezcla de predio alcorque
 - Sello sardinell predio #28-46
 - Fundir alcorque faltante
 - Sello ingreso parqueaderos predio 28-24
 - Reemplazo loseta amarilla parqueadero 28-24
 - Reemplazo loseta lisa parqueadero 28-24
 - Sello arena adoquín y reemplazo de uno
 - Resanar franja vial esquina carrera 28

- SOTO MAYOR Cra 28 entre CII 44 Y 45 oriental
 - Cambio de adoquines - 6 unidades
 - Sello arena loseta amarilla
 - Limpiar mezcla
 - Cambio loseta guía por 4 unidades
 - Reemplazar adoquines

- SOTO MAYOR CII 45 entre Cra 28 Y 27a norte
 - Sello arena general
 - Cambio de loseta despacho parroquial
 - Reemplazo loseta lisa entrada edificio san Ignacio por 2 unidades

- SOTO MAYOR Cra 27 entre CII 44 y 45 oriental
 - Instalación de gramoquin
 - Sello arena fina esquina cII 44
 - Finalizar la esquina de la Cra 29 y los parqueaderos de la cII 45.

- BARRIO BOLIVAR CII 37 entre carrera 24 y 25 norte
 - Sello esquina carrera 25
 - Cambiar loseta amarilla parqueadero predio 24-49
 - Reemplazo de loseta esquina carrera 24
 - sello carrera 24

- BARRIO BOLIVAR CII 37 entre carrera 23 y 24 sur
 - Mejorar acabado esquina carrera 24
 - Marcar dilatación rampa predio 23-86
 - Cambio loseta predio 23-76 una unidad
 - Cambio loseta parqueadero predio 23-54 por 4 unidades

- Limpiar y sello arena predio 23-50
 - Mejorar acabado predio carrera 23-40
 - Limpieza y sello predio pizzería
 - Cambio loseta predio 23-18
 - Cambio loseta predio 23-14 por 3 unidades
 - Cambio Loseta amarilla
 - Cambio loseta partida esquina carrera 23
 - Junta sardinel
- BARRIO BOLIVAR CII 37 entre carrera 24 y 25 sur
 - Reponer tapa predio 24-46
 - Mejorar acabado predio 24-72
 - Resanar edificio esquina Carrera 25
 - Mejorar acabado esquina Carrera 25
 - Cambiar loseta amarilla - 2 unidades
- BARRIO BOLIVAR CII 41 entre carrera 25 y 26 sur
 - Limpiar residuos esquina Cra 25
 - Reemplazo loseta lisa y chazo en triangulo esquina Cra 25
 - Reemplazo de loseta con poros
 - Cambio de loseta predio 25-36 - 4 unidades
 - Cambio de loseta predio 25-46 - 3 unidades
- BARRIO BOLIVAR CII 41 entre carrera 26 y 27 sur
 - Resanar juntas , predio 26-04
 - Cambio de loseta predio 26-04 por una unidad
 - Limpiar adoquines predio 26-12
 - Mejorar juntas predio 26-28
 - Cambiar losetas guias, parqueadero
 - Rellenar alcorque predio la rebaja
- BARRIO BOLIVAR CII 41 entre carrera 26 y 27 norte
 - Reparar caja de mezcla esquina carrera 27
 - Reemplazo loseta esquina carrera 27 por 2 unidades
 - Revisar franjas de ajuste sardinel –via
 - Sellar juntas grandes
 - Limpiar adoquines frente
 - Cambiar loseta guía

Durante el primer trimestre se intervinieron 4 frentes de trabajo: Barrió El prado, Las Ferias, Barrio Aurora, Mejoras Publicas, donde se han realizado diferentes actividades así:

Barrió El Prado

Costado Occidental carrera 36 entre calle 36 y 35

Costado Norte Calle 35 entre carrea 36 y 37

Costado Oriente de la carrera 35 entre calle 36 y 37

Costado Oriente de la carrera 35 entre calle 37 y 38

- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)

- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Plan de manejo ambiental
- Plan de manejo de tránsito
- N.P.2 Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- N.P.10 Malla electrosoldada
- N.P.11 Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm y espesor 30 cm.
- N.P.14 Realce de caja eléctrica, sanitaria y telemática con tapas en concreto, metal o mixtas, desde 0.60x0.60 hasta 1.20x1.20 m.

Barrio Las Ferias

Calles 27 y 28 entre carreras 1 y 2 costado norte

- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Excavación y replanteo, para alcanzar el nivel de la subbase y nivel de sardinel
- Relleno compactado con material de sub-base granular

Barrio Aurora

Calle 32 entre carrera 29 y 30 franja Norte.

Calle 32 entre carrera 28 y 29 franja Sur.

Calle 32 entre carrera 28 y 29 franja Norte

- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de vados vehiculares y peatonales
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Instalación De Gramoquin Incluye Instalación De Pasto Japonés según MEPB
- Realce cajas de servicios públicos

Barrio Mejoras publicas

Costado Norte CII 34 entre Cra 33 y 32

- Localización y replanteo manual
- Instalación de cerramiento según el Plan De Manejo De Tránsito.
- Demolición de andén existente y sardinel.
- Demolición y excavación para la instalación de sardinel.
- Construcción de franja de ajuste entre sardinel y vía
- Excavación y replanteo, para alcanzar el nivel de la subbase y nivel de sardinel.
- Conformación de espacio público según MEPB.
- Conformación de la franja ambiental con la instalación de adoquín según MEPB
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Realce cajas de servicios públicos



Localización: EL PRADO CARRERA 35 ENTRE CALLES 35 Y 36



Localización: EL PRADO CARRERA 35 ENTRE CALLES 35 Y 36



Localización: carrera 35 entre calles 37 y 38 el prado



Localización: carrera 35 entre calles 37 y 38 el prado



Localización: carrera 35 entre calles 37 y 38 el prado



Localización: carrera 35 entre calles 37 y 38 el prado



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29



Localización: AURORACALLE 32 ENTRE 28 Y 29

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 163 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA INCAL NIT: 901606477-1 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
VALOR INICIAL:	\$31.221.573.233,00
VALOR ACUMULADO:	\$31.221.573.233,00
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PRORROGA No. 1:	6 MESES
PRORROGA No. 2	3 MESES
PRORROGA No. 3	5 MESES
PLAZO TOTAL:	20 MESES
INTERVENTORÍA:	SOLIUN INGENIERÍA S.A.S.

	NIT: 901114547-5
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN :	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	21 DE JUNIO DE 2024

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO: 78,84 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato actualmente se encuentra en ejecución, con un avance físico del 78,84% con respecto a la programación y plazo actual, no se presenta retraso acorde porcentaje programado (78,68%) quedando 2 meses y 20 días para finalizar el contrato

En el presente informe se han tenido las siguientes observaciones:

- ✓ Redes eléctricas: debido a que el proyecto plantea la necesidad de soterrar la mayoría de tramos de redes eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado público, en terreno se han ido encontrando obstáculos que no han permitido un avance eficiente, el tema de redes de acueducto y alcantarillado los cuales se han ido cruzando con los diseños estipulados, por lo que se ha tenido que programar visitas a campo y reuniones con personal de la ESSA, de la alcaldía y especialistas eléctricos tanto del contratista como de la interventoría, con el fin de ir liberando tramos e ir avanzando en el soterrado de las redes. Estas actividades hacen parte de la ruta crítica debido a que se deben dejar instalados los ductos para poder conformar rasante y rematar con los acabados según diseños. A la fecha se han logrado subsanar varios inconvenientes, sobre todo en la coordinación con la empresa de acueducto quienes han venido realizando las actividades restitución de redes principales.
- ✓ Redes de acueducto y Alcantarillado: durante la ejecución del contrato se han logrado acuerdos con las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta que para continuar con un avance eficiente se han ido realizando por parte del contratista trabajos de reposición de las redes de principales y acometidas tanta de acueducto como de alcantarillado, contando con el debido acompañamiento de las empresas (AMB y EMPAS).
- ✓ El factor social es un componente muy importante en la ejecución de cualquier proyecto, a la fecha y acorde al alcance vigente se tiene proyectada la intervención de la carrera 10 entre calles 37 a 44, y la calle 42 entre carreras 10 y 12, sin embargo en estos tramos aun no se han iniciado las obras teniendo en cuenta que existen parqueaderos públicos que se verán afectados en las intervenciones, por lo que se hace necesario evaluar la manera de reducir el impacto y generar un plan acertado que permita la operatividad de estos parqueaderos y/o llegar a acuerdo concretos con los propietarios.

Después de los inconvenientes presentados y después de que el contrato tuvo una suspensión a partir del 21 de diciembre de 2023 y hasta el 12 de febrero de 2024 se ha llevado la ejecución de actividades supliendo imprevistos concertados mediante mesas de trabajo entre las partes (contratista, interventoría y alcaldía). A la fecha 11 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal, los cuales son:

- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12

- Calle 37 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12

7 tramos en intervención

- Carrera 10 entre calles 37 y 41
- Carrera 10 entre calles 41 y 42
- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 10 entre calles 43 y 44
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 43 entre carreras 10 y 11

Durante el periodo del presente informe comprendido a partir del 12 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, se han realizado diferentes actividades así:

CARRERA 10 ENTRE CALLES 37 Y 41



CARRERA 10 ENTRE CALLES 41 y 42



CARRERA 10 ENTRE CALLES 42 y 43



CARRERA 10 ENTRE CALLES 43 y 44



Demolición pavimento asfáltico



Excavaciones para red de acueducto



Excavaciones para acometidas domiciliarias



Instalación tubería de acueducto

CARRERA 12 ENTRE CALLES 36 y 37



Brechado de juntas sobre piso travertino peatonal



CALLE 41 ENTRE CARRERAS 10 y 11



Instalación de estructura metálica de soporte para deck



Adecuación de fachada frente a cassalins

CALLE 41 ENTRE CARRERAS 12 y 13



Instalación tubería redes eléctricas

Corte para fundida franja de ajuste



Instalación piso travertino peatonal

Adecuación de caja telemáticos existente

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 22 DE 2023 “ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 1”

CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER NIT: 901677862-6
FECHA DEL CONTRATO:	24 FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.961.400.000,00
VALOR ADICIONAL	\$ 558.603.751,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$2.520.003.751,00
VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 569.832.522,00
ANTICIPO AMORTIZADO HASTA EL ACTA No 8 AL 13/FEB/2024	\$ 569.832.522,00
FECHA INICIO:	16 MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	14 JULIO 2023
FECHA DE REINICIO 1	24 DE JULIO 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	23 DICIEMBRE 2023
FECHA DE REINICIO 2	15 DE ENERO 2024
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 2:	VEINTICINCO (25) DIAS
PRORROGA 3:	VEINTICINCO (25) DIAS
PRORROGA 4:	OCHO (8) DIAS
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES Y cincuenta y ocho (58) DIAS
ULTIMA FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE FEBRERO DE 2024

PORCENTAJE AVANCE FISICO ACUMULADO: 90.90%

ESTADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución contractual del contrato de obra N° 22 de 2023, finalizó el día 14 de febrero de 2024.

Una vez realizada verificación de ejecución por parte de la interventoría, se detectan frentes de obra con pendientes por correcciones a las actividades ejecutadas a saber:

- **LA INDEPENDENCIA Cra 19 entre calle 3 y 4:**
 - Arreglo de cañuelas a los dos costados de las escaleras
 - Arreglo de los pasamanos instalados
 - Unificación o arreglo de escaleras, frente a la casa del predio # 3-25 (rosada)
 - Arreglo de escaleras primer tramo ingreso independencia
 - Arreglo de tubería de filtros para conexión a la vía
- **SAN ALONSO Calle 20 entre Cra 29 y 30**
 - Sellado con arena del espacio público
 - Retiro de mezcla de material sobrante de fundida de rampas
 - Arreglo de piso en concreto alrededor de caja de servicio público - Edificio Habitar Simonetti CII20 # 29-46

- Cambio de losetas y adoquines rotos
- **SAN ALONSO CRA 33A entre CII 17 y 19**
 - Cambio de losetas y adoquines rotos
 - Arreglo de sifón y sumidero predio 17-56 que se visualiza colapso de agua
 - Arreglo de concreto para rampa de acceso vehicular en el predio 18-82, 18-76
 - Cambio de tapa de servicio público rota
- **AURORA Calle 31 entre Cra 28 y29**
 - Cambio de losetas y adoquines con deterioro temprano
 - Arreglo de sardineles en mal estado
 - Sello de arena
 - Relleno alcorques
 - Reemplazo de adoquines deteriorados parqueadero predio # 28-68
- **ALBANIA**
 - Arreglo de fachadas
 - Limpiezas de sumideros
 - Arreglo de nivelación de pozos realzados
 - Retiro de cerramientos, colombinas
 - Resanes de paramentos de las casa en el sector donde se fundió el concreto
 - Dilataciones en el pavimento rígido MR-38
 - resanes en las escaleras de acceso a las viviendas
 - resanes en acabados en concreto MR-38
 - aseo y limpieza en los sectores de acopio de materia
- **CAMPO MADRID Cra 10 frente al parqueadero de las torres de campo Madrid**
 - Deterioro prematuro y adecuación de pintura de 50 ml de baranda.

Durante este periodo se intervinieron 3 frentes de trabajo: Barrios Albania, El rosal, Independencia, donde se han realizado diferentes actividades así:

Barrio Albania, Cra 51 desde la Casa N° 18-61 hasta la Casa N° 20-67:

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final
- Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm
- NP-17 bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10cm*30cm.
- NP-18 Refuerzo PDR 60.
- NP-19 Concreto premezclado MR_38
- NP-20 Base granular norma INVIAS.

Barrió el Rosal

Costado Occidente de la Cra 20 desde la CII 54N hasta la CII 56N

Costado Oriente de la Cra 20 desde la CII 56N hasta la CII 58N

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.

- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Aseo y limpieza general
- Escaleras y /o graderías sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- NP-12 Bordillo en concreto reforzado de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.
- NP-13 Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm

Barrió la Independencia

Cra 24A entre calles 3A, 3B Y 4

Cra 24B entre calles 3B y 4

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.
- Refuerzo PDR 60





Localización: cr 51 # 19b-33 entre cr 51# 19b-47
 Descripción: instalación de bas e y acero de refuerzo dovelas



Localización: cr 51 # 19b-33 entre cr 51# 19b-47
 Descripción: instalación de bas e y acero de refuerzo dovelas



Localización: tramo # 3 Costado Oriente Cll 58N des de la Cra 20 hasta volver a encontrar la intersección con la Cra 20
 Descripción: instalación de sub-base



Localización: tramo # 3 Costado Oriente Cll 58N des de la Cra 20 hasta volver a encontrar la intersección con la Cra 20
 Descripción: instalación de adoquin en el espacio publico



Localización: tramo # 3 Costado Oriente Cll 58N des de la Cra 20 hasta volver a encontrar la intersección con la Cra 20
 Descripción: instalación de sardinel y demolición de andén



Localización: tramo # 3 Costado Oriente Cll 58N des de la Cra 20 hasta volver a encontrar la intersección con la Cra 20
 Descripción: fundida de rampa vehicular

CONTRATO DE OBRA 198 de 2023 – COASCON SAS “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor del contrato: \$ 1.718.692.419,00
 Valor Adicional No 1: \$ 98.453.564,26
 Valor total del Contrato: \$ 1.817.146.055,26

Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Plazo Adicional:	Quince (15) días
Plazo Total	Cuatro (04) meses y Quince (15) días
Fecha de inicio:	16 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2023
Nueva Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2023
Porcentaje avance:	98%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido, se están adelantando trámites con la ESSA para la subterranización de la línea de baja tensión y retiro de postes en el urbanismo, para de esta manera lograr terminar a satisfacción la obra.

	
<p>Imagen: Espacio Publico Calle 41, finalización de marcación vial, instalación de postería, luminarias, instalación de adoquines</p>	<p>Imagen: Espacio Publico Colegio Camacho Carreño, Finalización de Actividades de Barandas, Escalera, rampa de acceso al colegio, zona verde y zona dura</p>
	
<p>Imagen: Carrera 9na Espacio Publico Colegio Camacho Carreño, entrada posterior, finalización barandas zonas duras rejillas de concreto, ciccleteros</p>	<p>Imagen: Espacio Publico Carrera 9na, finalización de zona dura e iluminación.</p>

CONTRATO DE OBRA No. 396 DE 2022: “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 10.995.207.368
VALOR FISCAL ADICIONAL No. 1:	\$ 1.817.357.764
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 12.812.565.132
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONAL1:	UN (01) MESES Y 25 DÍAS
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (03) MESES Y 22 DÍAS
PLAZO TOTAL:	TRECE (13) MESES + 17 DÍAS

FECHA DE INICIO: 06 de MARZO DE 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de JUNIO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE: 63%
 ESTADO CONTRATO: EN EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 63%, (adjunto registro fotográfico).

PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN



LAVADO DE PIEDRA PÁRA INSTALACION DE BRECHA



LAVADO DE PIEDRA PÁRA INSTALACION DE BRECHA



INSTALACION DE PISO PIEDRA TRAVERTINO ANDEN CARRERA 11 ENTRE CALLES 36 Y 37 FRENTE A LA IGLESIA SAN LAUREANO.

CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 9.702.944.903,00
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A.
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 9.702.944.903,00
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE:	18.57%
ESTADO CONTRATO:	SUSPENDIDO

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 18.57%, (adjunto registro fotográfico).

OBSERVACION: Una vez la administración municipal contrate una nueva interventoría se dará reinicio al contrato para su culminación.

TRAMO CRA 26 ENTRE CALLES 32 A LA 33



TRAMO CRA 26 ENTRE CALLES 33 A LA 34



TRAMO CARRERA 26 ENTRE CALLES 34 A LA 35



TRAMO CARRERA 26 ENTRE CALLES 35 A LA 36



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 23 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 - CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA
 INTERVENTOR : GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$5.379.338.082,00
 VALOR ANTICIPO : \$1.613.801.424,60
 VALOR ADICIONAL : \$ 520.679.049
 PLAZO INICIAL : SIETE (7) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES
 FECHA DE INICIO : 29 DE MAYO DE 2023
 FECHA FINAL : 28 DE DICIEMBRE DE 2023
 NUEVA F. TERMINACION: 28 DE FEBRERO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 100%
 ESTADO DEL CONTRATO: En proceso de recibo y liquidación



ESPACIO PUBLICO CALLE 10 ENTRE CRA 27 Y 30



ESPACIO PUBLICO SOBRE LA CARRERA 30

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 310 DE 2023 cuyo objeto es CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B VEREDA SANTA RITA

CONTRATISTA	: IMCCA S.A.S
SUPERVISOR	: WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL	: \$ 866.841.849,00
PLAZO INICIAL	: CUARENTA Y CINCO DIAS
FECHA DE INICIO	: 4 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL	: 18 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO	: 26 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 20 DE JUNIO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE	: 5%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en EJECUCION y su alcance es la construcción del cerramiento perimetral, Espacio público y alumbrado público del espacio público.



ESTADO ACTUAL INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B VEREDA SANTA RITA.




CERRAMIENTYO PERIMETRAL, ESPACIO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B VEREDA SANTA RITA

6. ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL

CONTRATO No. 411 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1 (NARANJOS Y CENTAUROS)”

VALOR FISCAL : 7.121.453.216,00
 VALOR ADICIONAL : 3.596.834.651,54
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 10.718.287.867,54
 PLAZO : SEIS (6) MESES
 PLAZO ADICIONAL : CUATRO (4) MESES Y DOCE (12) DIAS
 FECHA DE INICIO : 24 DE ENERO DE 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN : 31 DE DICIEMBRE 2023
 PORCENTAJE DE AVANCE : 90,09%

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **SUSPENSION**, limpieza, en proceso de generación de certificación Retie, Retilap y aprobación por el operador de red.

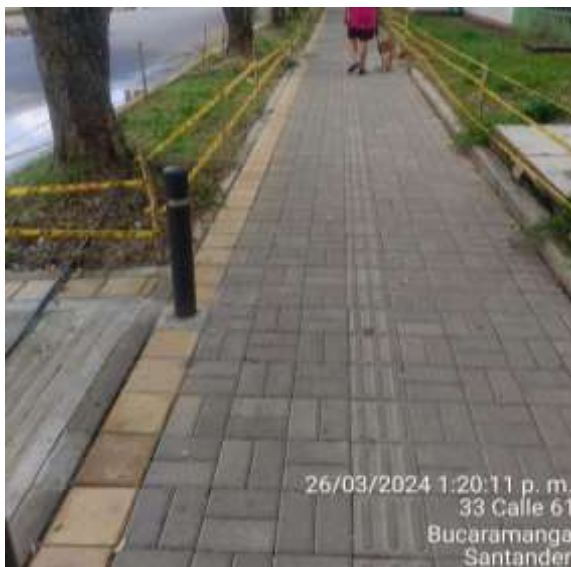


CONTRATO No. 412 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2”. (BULEVAR BOLÍVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO)

VALOR FISCAL	: 3.173.961.189,00
VALOR ADICIONAL	: 1.586.967.843,69
PLAZO ADICIONAL	: TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL MOD	: UN (1) MESES Y 28 DIAS
FECHA DE INICIO	: 24 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 12 DE ABRIL DE 2024
PORCENTAJE AVANCE	: 81,90%

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCIÓN**, Actualmente se encuentra en la instalación de juegos revisión de adoquín de la glorieta San Francisco, instalación de los postes y de las luminarias faltantes en el separador llegada crr 15, en proceso de visita del certificador Retie, Retilap y falta aprobación por el operador de red.

Se encuentra realizando actividades de siembra de maniforrajero en la glorieta del Bulevar Bolívar y a la espera de aprobación del PMT para trabajar en los separadores.

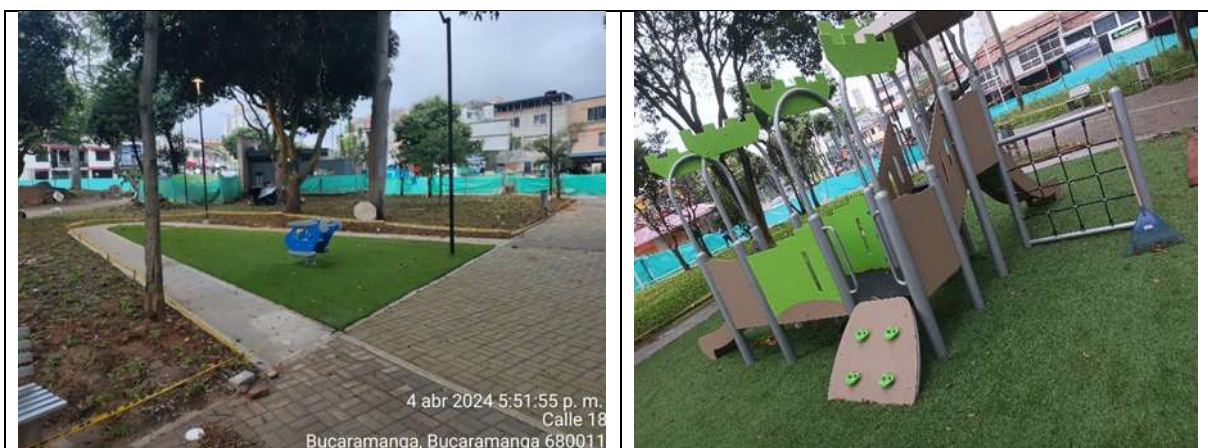

CONTRATO No. 414 DE 2022: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLÍVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4.

VALOR FISCAL: \$ 3.374.175.743,00
 VALOR ADICIONAL: \$ 1.883.664.200,1
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 5.257.839.923,1
 PLAZO: Siete (07) meses
 PLAZO ADICIONAL: Tres (03) meses
 PLAZO ADICIONAL: Treinta (30) Dias
 FECHA DE INICIO: 24 de enero de 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023
 PORCENTAJE DE AVANCE: 91,49%

ESTADO DE CONTRATO: Se encuentra en **SUSPENSION**, limpieza, en proceso de generación de certificación Retie, Retilap y aprobación por el operador de red.



CONTRATO No. 285 DE 2023: “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 1” Carrera 27 Calle 9- Calle 34

CONTRATISTA : UT MODERNIZACION FASE 1 BGA
 FECHA DE INICIO : 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
 FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 : 26 DE DICIEMBRE DE 2023
 FECHA DE REINICIO No. 1 : 07 DE MARZO DE 2024
 FECHA DE TERMINACIÓN : 28 DE ABRIL DE 2024 PORCENTAJE
 PROGRAMADO : 0.36%
 PORCENTAJE EJECUTADO : 0.36%
 ANTICIPO 30% : EN APROBACION

EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA REALIZADO ORDEN DE OPERACIÓN ALGUNA

ITEM	DESCRIPCION	% (PORCENTAJE)	CANTIDAD EN PESOS	INVERSIÓN	PENDIENTE
1	MANO DE OBRA	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -
2	COMPRA DE MATERIALES	100,00%	\$ 462.854.684,40	\$ -	\$ 462.854.684,40
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	0,000%	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		100,00%	\$ 462.854.684,40	\$ -	\$ 462.854.684,40

VALOR DEL CONTRATO \$ 1.542.848.948,00
 ANTICIPO (30%) \$ 462.854.684,40

VALOR REAL: \$ 1.542.848.948

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCION**, debido a que el contratista no inició actividades con el mínimo personal para la ejecución del contrato, la interventoría envió un "REQUERIMIENTO" al CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN FASE 1.BGA el 15 de marzo de 2024, el contratista envió una solicitud de subcontratación de actividades, para aprobación de la supervisión e inconvenientes con el anticipo.




CONTRATO No. 286 DE 2023: “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2” Carrera 27 Calle 34- Puerta del sol.

CONTRATISTA : CONSORCIO ILUMINAR BGA
 FECHA DE INICIO : 29 de noviembre de 2023.
 FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 : 26 DE DICIEMBRE DE 2023
 FECHA DE REINICIO No. 1 : 07 DE MARZO DE 2024
 FECHA DE TERMINACIÓN : 28 DE ABRIL DE 2024
 PORCENTAJE PROGRAMADO : 1.59%
 PORCENTAJE EJECUTADO : 0.99%
 ANTICIPO 30% : APROBADO

ORDEN DE OPERACIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL No.	RUBRO	DESCRIPCION	EMPRESA	CUANTIA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ITEM 1	MATERIALES	SUMINISTRO DE POSTES METALICOS	CONSORCIO ILUMINAR BGA	\$ 267.373.500,00	Aprobada	STEEL A & A SAS. (Anticipo 50%)
2	ITEM 3	TRANSPORTE	CAMIONETA	ROSSANA MAESTRE	\$ 7.000.000,00	Pendiente	Falta de documentación requerida
2	ITEM3	TRANSPORTE	SERVICIO GRUA	LEADY JOHANA PRADA	\$ 15.000.000,00	Pendiente	Falta de documentación requerida
2	ITEM 1	MATERIALES	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS	ELECTRO RUEDA	\$ 42.000.000,00	Pendiente	Falta de documentación requerida
2	ITEM 1	MATERIALES	CEMENTO GRIS 50KG	G Y J FERRETERIA SAS	\$ 3.100.000,00	Pendiente	Falta de documentación requerida
2	ITEM 1	MATERIALES	CONTRAMARCO Y TAPAS AP	CONECING SAS	\$ 25.000.000,00	Pendiente	Falta de documentación requerida
2	ITEM 1	MATERIALES	LADRILLOS	LADY MARCELA	\$ 7.150.000,00	Pendiente	Falta de documentación requerida

ITEM	DESCRIPCION	% (PORCENTAJE)	CANTIDAD EN PESOS	INVERSIÓN	PENDIENTE
1	MATERIALES	85,53%	\$ 390.549.396,14	\$ 244.623.500,00	\$ 145.925.896,14
2	MANO DE OBRA	9,00%	\$ 41.096.043,09	\$ -	\$ 41.096.043,09
3	TRANSPORTE	5,470%	\$ 24.977.261,74	\$ 22.000.000,00	\$ 2.977.261,74
TOTAL		100,00%	\$ 456.622.700,97	\$ 266.623.500,00	\$ 189.999.200,97



VALOR REAL: \$ 1.522.075.669,89

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCION**.



CONTRATO No. 287 DE 2023: “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 3” Calle 36

CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN BUCARAMANGA
 FECHA DE INICIO : 29 de noviembre de 2023.
 FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 : 26 DE DICIEMBRE DE 2023
 FECHA DE REINICIO No. 1 : 07 DE MARZO DE 2024
 FECHA DE TERMINACIÓN : 28 DE ABRIL DE 2024
 ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION
 PORCENTAJE PROGRAMADO : 8%
 PORCENTAJE EJECUTADO : 11%
 ANTICIPO 30% : APROBADO

ORDEN DE OPERACIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL No.	RUBRO	DESCRIPCION	EMPRESA	CUANTIA	ESTADO	OBSERVACIONES
1							
2							

ITEM	DESCRIPCION	%(PORCENTAJE)	CANTIDAD EN PESOS	INVERSIÓN	PENDIENTE
1	MATERIALES	60,0%	\$ 269.725.048,30	\$ 0,00	\$ 269.725.048,30
2	EQUIPOS	15,0%	\$ 67.431.262,07	\$ 0,00	\$ 67.431.262,07
3	PAGO DE NOMINA	15,0%	\$ 67.431.262,07	\$ 0,00	\$ 67.431.262,07
4	TRANSPORTE	10,0%	\$ 44.954.174,72	\$ 0,00	\$ 44.954.174,72
TOTAL		100,00%	\$ 449.541.747,16	\$ 0,00	\$ 449.541.747,16

VALOR REAL: \$ 1.498.472.490,53

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCION**.



CONTRATO No. 291 DE 2023: “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 4” Carrera 15

CONTRATISTA	: CONSORCIO ELECTRICAL
FECHA DE INICIO	: 28 de noviembre de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 21 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE PROGRAMADO	: 0.36%
PORCENTAJE EJECUTADO	: 0.36%
ANTICIPO 30%	: APROBADO
VALOR REAL	: \$ 1.444.130.820

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCION**.

CONTRATO No. 288 DE 2023: “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 5” Avenida quebrada seca

CONTRATISTA	: CONSORCIO ALUMBRADO BUCARAMANGA
FECHA DE INICIO	: 28 de noviembre de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 21 DE MAYO DE 2024

PORCENTAJE PROGRAMADO : 0.36%
PORCENTAJE EJECUTADO : 0.36%
ANTICIPO 30% : APROBADO
VALOR REAL : \$ 1.209.155.465

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCION**.

CONTRATO No. 289 DE 2023: “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 6” Avenida Gonzales valencia

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUELECTRICOS
FECHA DE INICIO : 28 de noviembre de 2023.
ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENSIÓN
PORCENTAJE PROGRAMADO: 0.36%
PORCENTAJE EJECUTADO : 0.36%
ANTICIPO 30% : APROBADO
VALOR REAL : \$ 836.362.735

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **SUSPENSION** fecha de reinicio de actividades 1° semana de abril de 2024.

CONTRATO No. 289 DE 2023: “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 7” Avenida la rosita

CONTRATISTA : CONSORCIO AP 2023
FECHA DE INICIO : 28 de noviembre de 2023.
ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENSIÓN
PORCENTAJE PROGRAMADO: 0.36%
PORCENTAJE EJECUTADO : 0.36%
ANTICIPO 30% : APROBADO diciembre 2023
VALOR REAL : \$ 897.152.256

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **SUSPENSION** fecha de reinicio de actividades 1° semana de abril de 2024.

Contrato de obra No. 254 del 29 de septiembre del 2023 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

CONTRATISTA: APIANTICA SAS
FECHA DE INICIO: 04 de octubre del 2023
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN
PORCENTAJE PROGRAMADO: 10%
PORCENTAJE EJECUTADO: 10%
ANTICIPO 50%: APROBADO diciembre 2023
VALOR REAL: \$ 464.512.724,71

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCION**.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 254 DE 2023: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

CONTRATISTA : APIANTICA SAS
 FECHA DE INICIO : 04 de octubre del 2023
 ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENSIÓN
 PORCENTAJE PROGRAMADO : 10%
 PORCENTAJE EJECUTADO : 10%
 ANTICIPO 50% : APROBADO
 VALOR REAL : \$ 464.512.724,71

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **SUSPENSIÓN** fecha de reinicio de actividades 1° semana de abril de 2024.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 138 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 1”.

VALOR FISCAL : \$ 1.122.746.611,00
 VALOR ADICIONAL : \$ 0,00
 PLAZO : SIETE (07) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES (**En proceso**)
 FECHA DE INICIO : 24 DE JULIO DEL 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN : 11 DE ABRIL DEL 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 94,84%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **EN EJECUCION**.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 139 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 2”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.140.646.311,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 0,00
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	DOS (2) MESES (En proceso)
FECHA DE INICIO	:	24 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	:	11 DE ABRIL DEL 2024
PORCENTAJE AVANCE	:	94,84%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **EN EJECUCION**.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 140 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 3”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.124.731.209,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 0,00
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	DOS (2) MESES (En proceso)
FECHA DE INICIO	:	24 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	:	11 DE ABRIL DEL 2024
PORCENTAJE AVANCE	:	94,84%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **EN EJECUCION**.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 4”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.124.731.209,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 0,00
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	DOS (2) MESES (En proceso)
FECHA DE INICIO	:	24 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	:	11 DE ABRIL DEL 2024
PORCENTAJE AVANCE	:	94,84%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **EN EJECUCION**.





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 332 DE 2023: “AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.659.990.756
VALOR ADICIONAL	:	\$ 0,00
PLAZO	:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	CERO (00) MESES
FECHA DE INICIO	:	SIN INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN	:	SIN INICIO
PORCENTAJE AVANCE	:	0%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en de **ACTA DE INICIO 1°** semana de abril de 2024.

7. MALLA VIAL URBANA Y RURAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 405 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 1”.

VALOR INICIAL:	\$ 7.542.347.806
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 2.992.039.448
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 1.182.389.445
VALOR TOTAL:	\$ 11.716.776.699
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL 1 y 2:	SEIS (6) MESES
PLAZO TOTAL:	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE JUNIO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	90.49%
ESTADO CONTRATO:	EN EJECUCIÓN

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 90.49%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 1, 2, 3, 4, 13,14 Y 15 de la ciudad.

N°	BARRIO
1	VILLA ALEGRÍA I (PARTICIPATIVO)
2	MARIA PAZ (PARTICIPATIVO)
3	LA AURORA (PARTICIPATIVO)
4	BUENOS AIRES (PARTICIPATIVO)
5	VENADO DE ORO (PARTICIPATIVO)
6	EL DIVISO (PARTICIPATIVO)
7	VIA NACIONAL BUCARAMANGA – CUCUTA
8	VEGAS DE MORRORICO (PARTICIPATIVO)
9	EL CINAL (PARTICIPATIVO)
10	EL PRADO
11	DEPRIMIDO MESÓN DE LOS BÚCAROS
12	MEJORAS PÚBLICAS
13	LOS ALPES
14	BUENAVISTA (PARTICIPATIVO)
15	GARCÍA ROVIRA

Barrio: Villa Alegría I	
Dirección: Calle 28A norte desde la carrera 11 hasta la carrera 9	Participativo
	
Descripción: Marca Vial con pintura en frio.	

Barrio: María Paz	
Dirección: Calle 15A norte desde la carrera 2A (Pavimento existente), hasta la carrera 1	Participativo
 <p>#María Paz #lote 1 #Bucaramanga 29/02/2024 11:02:57 a. m. 7°8'51"N - 73°8'27"W</p>	 <p>#María Paz #lote 1 #Bucaramanga 26/02/2024 10:54:11 a. m. 7°8'50"N - 73°8'28"W</p>
Descripción: Adecuación de andenes concreto de 3000 Psi	Descripción: Instalación rejilla sumidero.

Barrio: El Cinal	
Dirección: Calle 6 entrada al Cinal	Participativo
	
Descripción: Armado de acero $F_y=420$ Mpa y fundida concreto $MR=4,3$ Mpa.	

Barrio: Los Alpes	
Dirección: Calle 31 entre cra 41 y 43	Participativo
 <p>4/03/2024 2:26:44 p.m. N 7° 45' 33.4" W 73° 6' 34.525" Santander Corporación Provedora Carrera 43 entre Calle 31 Barrio Alpes</p>	 <p>4/03/2024 1:03:38 p.m. N 7° 45' 31.8" W 73° 6' 33.715" Santander Corporación Provedora Carrera 43 entre Calle 31 Barrio Alpes</p>
Descripción: Excavación de pavimento existente y aplicación base granular.	

Barrios: San Alonso	
Dirección: Deprimido mesón de los Búcaros	
 <p>#Mesón de los Bucaros #Señalización vial #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 10:31:51 a. m. 7°7'43" N / 73°7'1" W</p>	 <p>#Mesón de los Bucaros #Señalización vial #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 10:31:08 a. m. 7°7'42" N / 73°7'2" W</p>
Descripción: Instalación señalización vertical.	

Barrio: Mejoras Públicas	
Dirección: Carrera 32 # 38-67	Caja: 5
 <p>mié, mar 6, 2024 21:30 p. m. 7°7'19" N / 73°6'46" W malla vial lote #1 carrera 32 # 38-67 B/caramanga caja #5</p>	 <p>mié, mar 6, 2024 22:01 p. m. 7°7'19" N / 73°6'46" W malla vial lote #1 carrera 32 # 38-67 B/caramanga caja #5</p>
Descripción: Demarcación de caja	Descripción: Demarcación de caja
 <p>jun, mar 7, 2024 10:38 a. m. 7°7'11" N / 73°6'50" W malla vial lote #1 carrera 32 # 38-67 B/caramanga caja #5</p>	 <p>jun, mar 7, 2024 10:40 a. m. 7°7'11" N / 73°6'50" W malla vial lote #1 carrera 32 # 38-67 B/caramanga caja #5</p>
Descripción: Fresado de pavimento e Imprimación CRL-40	Descripción: Instalación MDC-19

Barrio: García Rovira	
Dirección: Cra 9 entre calle 44 y 45 sentido S-N	Caja: 4
	
Descripción: Demarcación de caja	Descripción: Fresado, limpieza e imprimación.
	
Descripción: Fresado, limpieza e imprimación.	Descripción: Instalación MDC-19

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 406 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 2”.

VALOR INICIAL:	\$ 7.007.204.406
VALOR ADICIONAL 1:	\$1.603.540.991
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 1.085.668.114
VALOR TOTAL:	\$ 9.696.413.511
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	93.64%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 93.64%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 5, 6, 8, 10, 11,12 y 17 de la ciudad.

N°	BARRIO
1	PUERTA DEL SOL
2	ASTURIAS
3	SAN LUIS
4	LAS MERCEDES
5	CABECERA
6	GUAYACANES
7	QUINTAS DEL CACIQUE
8	EL TEJAR

Barrio: Mercedes	
Dirección: Calle 58 #32-98	Cajas: 909.1
 <p>28/02/24 9:17 p. m. 7° 6' 3" N - 73° 6' 35" W Bucaramanga Calle 58 #32-98 foto 2</p>	 <p>29 de febrero de 2024 04:43 a. m. obra nueva Vial lote 2</p>
Foto Antes	Foto Después

 <p>4/03/2024 7° 6' 5" N, 73° 6' 21" W Bucaramanga Guayacanes</p>	 <p>4/03/2024 7° 6' 5" N, 73° 6' 23" W Bucaramanga Guayacanes</p>
Descripción: Instalación Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19	

Barrio: Cabecera del Llano	
Dirección: Calle 53 entre Carreras 36 – 37	Caja: 904
	
Foto Antes	Foto Después

Barrio: Concordia	
Dirección: Carrera 39 #65-37	Cajas: 922
	
Foto Antes	Foto Después

Barrio: PROVENZA	
Dirección: PARALELA A LA AUTOPISTA PROVENZA	Cajas: 926
	
Foto Antes	Foto Después

Barrio: Quintas del Cacique	
Dirección: Carrera 49 # 73ª - 44	
REDUCTOR DE VELOCIDAD PARABÓLICO	
	
Foto Durante	Foto Después

Barrio: EL TEJAR	
Dirección: Av. Circunvalar 35 instituto caldas	
Pompeyano	
	
Foto Antes	Foto Después

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 de 2023: BUCARAMANGA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 05 CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS A TRAVES DE LA CENTRAL ADMISNITRATIVA Y CONTABLE CENAC DE INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 3.061.685.511
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 3.061.685.511
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO INICIAL + ADICIONAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	01/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Mayo de 2024
PORCENTAJE AVANCE:	27,10 %

ESTADO DEL CONTRATO: El convenio interadministrativo se encuentra en ejecución, con un avance físico del 27.10%, se han realizado actividades como: construcción en losas de concreto, construcción y pavimentación de vías en concreto flexible actividades de socialización y actas de vecindad – Comuna 1 y 2. Barrios Colorados, Café Madrid, Portal de los ángeles, Kennedy, Esperanza III.



PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO KENNEDY

PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO KENNEDY



PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO LOS
COLORADOS

PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO LOS
COLORADOS

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 215 DE 2023: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 103.793.736,92
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A.
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 103.793.736,92
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
FECHA DE INICIO:	30/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2023

PORCENTAJE AVANCE: 100 %
ESTADO CONTRATO: ETAPA DE RECIBO FINAL Y
LIQUIDACIÓN.

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en etapa de recibo final y liquidación con un avance en tiempo del 100%, hasta el momento se han adelantado actividades de entrega total de insumos.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 216 DE 2023: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE No. 3

VALOR FISCAL INICIAL: \$ 497.646.161
VALOR FISCAL ADICIONAL: N.A.
VALOR FISCAL TOTAL: \$ 497.646.161
PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL: CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO: 29/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE: 19,71 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance Físico del 15%, hasta el momento se han adelantado actividades como la entrega parcial de insumos.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 230 DE 2023: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 1

VALOR FISCAL INICIAL: \$ 2.119.924.300
VALOR FISCAL ADICIONAL: N.A.
VALOR FISCAL TOTAL: \$ 2.119.924.300
PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL: CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO: 18/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: 20,58 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance Físico del 20,58%, hasta el momento se han adelantado actividades como la entrega parcial de insumos.

CONTRATO DE OBRA 418 de 2022 - : CONSORCIO JASC 2022
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA : CONSORCIO JASC 2022
 INTERVENTOR : COMPAÑÍA PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.S
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$ 2.130.769.633,10
 VALOR ADICIONAL : \$ 901.028.598,00
 PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES
 PLAZO ADICIONAL : 2 MESES 20 DIAS
 FECHA DE INICIO : 14 DE MARZO DE 2023
 FECHA FINAL : 15 DE ENERO DEL 2024.
 FECHA SUSPENSION : 10 DE FEBRERO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 90 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato No 418 de 2022 se encuentra suspendido en trámite de adicional No 2 en Plazo y del Adicional en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No 444 del 30 de diciembre de 2022.

TRAMO	VEREDA	SECTOR	PLACA HUELLAS (m)	EJECUTADO TOTAL
				%
1	Angelinos	Inicio ramal al tanque	47	100,00%
2	Angelinos	Finca La Esperanza	92	100,00%
3	Angelinos	Finca Pajitas	60	100,00%
4	San Pedro Bajo	Balneario La Vega	120	100,00%
5	San Pedro Bajo	Miramar	100	100,00%
6	La Sabana	La Y. Finca El Rubí	100	100,00%
7	La Sabana	Finca Mi Paraiso	100	100,00%
8	La Esmeralda	El Calzo	168	80,00%
9	El Aburrado Bajo	La Esperanza	150	100,00%
10	San Pedro Bajo	El Arenal	120	95,00%
11	San Pedro Bajo	Las Marraneras	120	100,00%
12	San Cayetano	Escuela	126,5	100,00%
13	Santa Rita	Capilla Alta- Magüeyes tramo 1	100	100,00%
14	Santa Rita	Capilla Alta- Magüeyes tramo 2	150	100,00%
15	VIAJAGUAL	TIENDA ROJA	184	95,00%
TOTALES			1737,5	



PLACA HUELLA VEREDA SAN PEDRO BAJO



PLACA HUELLA VEREDA SAN PEDRO –MIRAMAR



PLACA HUELLA VEREDA LA ESMERALDA –SECTOR EL CALZO



PAVIMENTO FLEXIBLE VEREDA –SECTOR TIENDA ROJA

CONTRATO DE OBRA 419 de 2022- RURAL BUCARAMANGA “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA : CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023
 INTERVENTOR : CONSORCIO CDC
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$ 1.860.497.004,00
 VALOR ADICIONAL : \$ 725.657.760,00
 PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
 FECHA DE INICIO : 07 DE MARZO DE 2023
 FECHA FINAL : 14 DE ENERO DE 2024
 FECHA SUSPENSION : 10 DE FEBRERO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 85 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato No 419 de 2022 se encuentra suspendido en trámite de adicional No 2 en Plazo y del Adicional en Valor y Plazo al Contrato de Interventoría No 13 del 16 de Febrero de 2023.

Placas Huellas

No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE
1	Corregimiento 2	Capilla alta	Finca El Guarumo - Finca Esquinita	Placa huella L=170 M	170	30%
2	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela	Placa huella L=150 M	106	100%
3	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela II	Placa huella L=100 M	144	100%
4	Corregimiento 2	Vereda Monserrate	Sector El Embalse Tona	Placa huella L=200 M	140	100%
5	Corregimiento 2	Vereda Bolarqui Bajo		Tramo Adicional	60	100%

Obras de Arte

	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	Cantidad	% AVANCE
6	Corregimiento 2	Bolarqui Bajo	Sector el guayabito	Muro de estabilización.	1	100%

Placas Huellas

No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE
7	Corregimiento 3	San José	Gruta de la virgen casa No.50	Placa huella L=150 M	106	100%
8	Corregimiento 3	San José	Sector casa roja - finca Genaro	Placa huella L=52 M	66	100%
9	Corregimiento 3	El Pedregal	Sector El mango	Placa huella L=190 M	138	100%
10	Corregimiento 3	El Pedregal	Finca Villa Laura curva 1 y 2	Placa huella L=37 M	37	0%
11	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector Curva el miedo	Placa huella L=200 M	80	100%
12	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 1.	Placa huella L=100 M	126	100%
13	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 2.	Tramo Adicional	80	100%
14	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.1.	Tramo Adicional	70	70%
15	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.2.	Tramo Adicional	70	70%
16	Corregimiento 3	Galillo.	La Malsaña.	Tramo Adicional	70	0%
17	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Udes.	Tramo Adicional	80	100%
18	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Antena.	Tramo Adicional	80	100%



8. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 171 DE 2023 - ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA, Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO (INDIVIDUALES) DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECIFICOS DEFINIDOS”.

Valor del contrato: \$ 5.717.873.362,00
 Aporte Municipio \$ 4.671.830.671,00
 Aporte Convenido \$ 1.046.042.692,22

Plazo inicial: Cinco (5) meses y Quince (15) días
 Fecha de inicio: 22 de agosto de 2023
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023
 Porcentaje avance: 0%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido, y en trámites de obtener la aprobación por parte del ente ambiental (CDBM).

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 170 de 2023: “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato: \$ 155.875.613,0
 Plazo inicial: Seis (6) meses, hasta el 30 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto (lo primero que ocurra)

Plazo Adicional No 1: Tres (03) meses
 Plazo Total: Nueve (09) meses
 Fecha de inicio: 25 de julio de 2023
 Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2023
 Nueva fecha de terminación: 31 de marzo
 Porcentaje avance: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado y con este se logró llevar agua potable a los sitios que iniciaron proceso judicial contra el municipio de Bucaramanga por el mínimo vital de agua potable. Se inicia proceso de trámite de liquidación.

	
<p>Imagen: Suministro de agua potable al asentamiento los cuadros</p>	<p>Imagen: Suministro de agua potable a la estación de policía carabineros</p>

9. OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA CUAL NO ES ORDENADORA DE GASTO

CONTRATO DE OBRA 106 de 2023 - : CONSORCIO GAITAN “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Valor del contrato: \$ 16.639.364.368,41
 Plazo inicial: Trece (13) meses
 Fecha de inicio: 01 de agosto de 2023
 Fecha de terminación: 30 de agosto de 2024
 Porcentaje avance: 64,40%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha se han realizado actividades preliminares, excavaciones, anclajes y drenes para la estabilización del talud.

	
<p>Imagen: Conformación talud, Acero de refuerzo zapatas, perforación e instalación de torones.</p>	<p>Imagen: Concreto lanzado.</p>
	
<p>Imagen: Concreto lanzado e Instalación Drenes</p>	<p>Imagen: Perforación para anclajes.</p>

CONTRATO DE OBRA 104 de 2023 - : CONSORCIO GESA “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Valor fiscal: \$ 64.809.568.908,48
 Plazo inicial: Doce (12) meses
 Fecha de inicio: 29 de agosto de 2023
 Fecha de terminación: 28 de agosto de 2024
 Porcentaje avance: 41,29 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha se han realizado actividades preliminares, excavaciones, anclajes y drenes para la estabilización del talud.

	
<p>Imagen: Conformación talud, Acero de refuerzo zapatas, perforación e instalación de torones La Gloria</p>	<p>Imagen: Concreto lanzado</p>
	
<p>Foto 3. Conformación talud, Acero de refuerzo zapatas, perforación e instalación de torones Nazareth</p>	<p>Foto 4. Conformación talud Nazareth</p>

CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: **CONSORCIO LA FLORA 2023**
 “CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor fiscal: \$ 40.514.056.133,00
 Plazo inicial: Dieciocho (18) meses
 Fecha de inicio: 05 de mayo de 2023
 Fecha de terminación: 04 de noviembre de 2024
 Porcentaje avance: 29,31 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución y se han construido 300 m de boxculvert de 3.50*3.50 y 300 m en colector de aguas negras.

	
<p>Imagen: Desencofrados muro módulo No 29</p>	<p>Imagen: Encofrados módulo No 30</p>
	
<p>Imagen: Armada de acero losa superior módulo No 30</p>	<p>Imagen: Fundida muros módulo No 30</p>

CONTRATO DE OBRA No. 41 de 2023: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ORIGINADA POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 –FENOMENO DE LA NIÑA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

VALOR INICIAL	: \$ 1.509.746.198
VALOR ADICIONAL	: \$ 754.462.999
VALOR TOTAL	: \$ 2.264.209.197
PLAZO TOTAL	: 8 MESES Y 20 DÍAS
FECHA DE INICIO	: 23 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 29 de febrero de 2024

ESTADO DEL CONTRATO	: TERMINADO
PORCENTAJE AVANCE	: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: La Supervisión requirió por escrito a la Interventoría a través del comunicado 2-SdIB2-202403-00017542, la proyección del acta de recibo final de los trabajos, dado que, de los 11 puntos proyectados inicialmente para intervención en el marco de la declaratoria de calamidad, se lograron intervenir 7.



CONTRATO DE OBRA: No. 284 de 2023 (03 DE NOVIEMBRE DE 2023)
 “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (SEGUNDA FASE) A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FICAL INICIAL:	\$283.178.271,00.
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A
VALOR FISCAL TOTAL:	\$283.178.271,00.
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL:	TREINTA DÍAS CALENDARIO
PLAZO INICIAL + ADICIONAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
FECHA DE INICIO:	14/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/01/2024
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	100 %

ESTADO DEL CONTRATO: El proyecto contempla el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno – CAIV, el cual incluye la intervención de 175,24 m2 para la adecuación de las unidades sanitarias, el mejoramiento sala de juntas, ampliación zona de archivo y cafetería. Incluye desmonte de puertas, ventanas, incrustaciones, aparatos sanitarios, cielo raso, estructura en aluminio, muros divisorios en mampostería, luminarias, aparatos eléctricos, demolición de pisos y enchapes en cerámica, subsanación filtración de aguas lluvias en cubiertas y canales, acceso salón de capacitaciones, acabados generales en pintura, divisiones metálicas, incrustaciones metálicas, piso en cerámica, cielo raso, en lámina de yeso entre otras.

Actualmente el proyecto se encuentra en un avance físico del 100% de la adecuación, donde ya se realizó la adecuación de la sala de juntas, la pintura e impermeabilización de la cubierta y demoliciones y fundición de placa de contrapiso.

 <p>27/12/2023, 10:54:33 a. m. Calle 41 13-44 Bucaramanga 680006 Santander Colombia</p>	
<p>Demolición y construcción de placa de piso y frisos.</p>	<p>Pisos Entregados</p>

 <p>4/12/2023, 9:36:29 a. m. Calle 41 13-44 Bucaramanga 680006 Santander Colombia</p>	
<p>Adecuación Pisos, pintura y cielo raso sala de Juntas incluidas luminarias y puntos eléctricos CAIV</p>	<p>Estructura Terminada Sala de Juntas</p>

10. PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FRENTE A CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES.

Una vez se inicia ésta Administración, se encuentra que hay varios contratos, que ya terminaron o están a punto de terminar actividades de obra, pero que no se han liquidado. Si bien hay contratos finalizados en 2023, cuyo plazo de liquidación correspondería para realizarse en éste año 2024, se identificaron varios contratos de años anteriores que también requieren adelantar el trámite de liquidación.

Los contratos encontrados, se clasificaron en alguno de los siguientes grupos:

✓ **CONTRATOS FINALIZADOS, CON RECIBO A SATISFACCIÓN PENDIENTE**

Se encontraron al iniciar la administración del año 2024 28 contratos que estaban finalizados en su plazo, y que tenían Acta de Terminación con Pendientes suscrita, varios de éstos pendientes de temas técnicos (detalles de calidad en obra), o finalizados en su plazo, pero con obras no realizadas. En algunos casos, existen procesos sancionatorios pendientes de resolverse.

✓ **CONTRATOS FINALIZADOS, RECIBIDOS A SATISFACCIÓN (O CON TEMAS DE OBRA RESUELTOS) PERO CON PENDIENTES ADMINISTRATIVOS**

Se encontraron al iniciar la administración del año 2024, 8 Contratos que estaban finalizados en su plazo, y que tenían Acta de Terminación con Pendientes suscrita, donde ya se subsanaron los pendientes de obra, pero quedan pendientes diligencias administrativos para poder firmar el recibo final, especialmente en temas de recibo por las Empresas de Servicios Públicos (Acueducto, EMPAS, ESSA, Alumbrado)

✓ **CONTRATOS CON ACTA DE RECIBO FINAL, PERO NO LIQUIDADOS**

Se encontraron al iniciar la administración del año 2024, 14 Contratos que estaban finalizados en su plazo, y que tenían Acta de Terminación con Pendientes suscrita, donde ya se subsanaron los pendientes de obra, así como Acta de Recibo Final suscrita, pero no liquidados, principalmente por no haberse presentado aprobación de pólizas, o por no haber radicado los documentos en su momento ante la Secretaría de Infraestructura.

✓ **CONTRATOS DE INTERVENTORÍA QUE NO SE PUEDEN LIQUIDAR ACTUALMENTE**

Corresponde a contratos de Interventoría que ya finalizaron su plazo, pero que, debido a pendientes de las obras a las cuales les realizaron la Interventoría, no pueden liquidarse, porque parte de sus obligaciones es liquidar la obra. Son 10 contratos con ésta situación.

✓ **CONTRATOS NO LIQUIDADOS**

Dado que se encuentra una amplia cantidad de contratos en éstas condiciones, se determina conformar un equipo de profesionales para que se ponga al frente de sacar adelante éstas 60 liquidaciones, así como apoyar en la solución de dificultades técnicas que se presenten en la ejecución de contratos que actualmente se encuentran suspendidos, y que requieren acciones del Gobierno Municipal, para poder continuar su ejecución.

A la fecha, se han adelantado las siguientes acciones de algunos de los contratos para liquidar.

Número Contrato	Objeto Contrato	ACCIONES ADELANTADAS
248-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 7	EN ELABORACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL
152-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 3	EN APLICACIÓN DE MULTAS
172-2021	“Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander” - Grupo 3	YA TIENE UN REQUERIMIENTO Y EL SEGUNDO REQUIERIMEINTO EN TRAMITE POSIBLE PROCESO SANCIONATORIO
26-2022	Adecuación Del Equipamiento Urbano Del Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 3	EN PROCESO SANCIONATORIO
37-2022	Adecuación De Salones Comunes En El Municipio De Bucaramanga Santander. - Grupo 2- VILLA MERCEDES	PENDIENTES JURÍDICOS POR RESOLVER
49-2022	Interventoría a la Adecuación De Salones Comunes En El Municipio De Bucaramanga Santander	PENDIENTES JURÍDICOS POR RESOLVER
408-2022	Adecuación Del Equipamiento Y Escenarios Deportivos Del Municipio De Bucaramanga Santander. Grupo 1	SE HAN CORREGIDO LOS DETALLES DE OBRA. PENDIENTE RECIBO DE ALUMBRADO
433-2022	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Corregimientos 1, 2 Y 3 Del Municipio De Bucaramanga, Santander. - Grupo 3	SE ESTÁ PREPARANDO LA LIQUIDACIÓN. YA SE FIRMÓ ACTA DE RECIBO FINAL
311-2021	Mejoramiento Y Obras Complementarias A Las Instalaciones Del Centro De Internamiento Preventivo (Cip) Para El Funcionamiento Del Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente	EN REVISIÓN DE PENDIENTES DE OBRA PARA EVALUAR SI SE RECIBE O PASA A PROCESO SANCIONATORIO
247-2022	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Aseo De Bucaramanga – Emab S.A. E.S.P, Para Realizar Las Actividades De Adecuación De La Etapa E Y F De Que Trata El Estudio Geotécnico No. 4925 En Cumplimiento Del Plan De Cierre,	CONVENIO EN LIQUIDACIÓN

	Desmantelamiento Y Abandono Para El Sitio De Disposición Final "El Carrasco".	
253-2022	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Electrificadora De Santander S.A. E.S.P., Para La Implementación Del Alumbrado Navideño 2022	CONVENIO EN LIQUIDACIÓN
313-2022	Aunar Esfuerzos Para Desarrollar Actividades Relacionadas Con El Mantenimiento, Conservación Y Embellecimiento De Parques Y Zonas Verdes	CONVENIO EN LIQUIDACIÓN
420-2022	Mejoramiento de la infraestructura urbana dentro de la estrategia Centro Caminable	PENDIENTE DE CONCEPTO JURÍDICO, PORQUE LA INTERVENTORÍA EJECUTÓ SOLO HASTA EL 18% DE LA OBRA, Y NO CONTINUÓ
136-2021	La Adquisición, A Través De La Bmc Bolsa Mercantil De Colombia S.A., Para "Desarrollar La Primera Fase Para La Adquisición, Suministro, Implementación Y Puesta En Funcionamiento De Puntos De Gestión Inteligente Y Medidas Para La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga", Cuyas Características Técnicas, Cantidades Y Lugares De Cumplimiento Se Encuentran Detalladas En Los Documentos De Condiciones Especiales (Fichas Técnicas De Productos) Y Ficha Técnica De Negociación, De Conformidad Con El Procedimiento Establecido En El Reglamento De Funcionamiento Y Operación De La Bolsa Para El Mercado De Compras Públicas - Mcp- De La Bolsa Mercantil De Colombia.	EN PROCESO SANCIONATORIO
218-2021	Mantenimiento Y Modernización De La Infraestructura Eléctrica De Alumbrado Público En El Municipio De Bucaramanga, Grupo N-01	EN PROCESO SANCIONATORIO
173-2021	"Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander" - Grupo 1	EN RECIBO FINAL
27-2022	Adecuación Del Equipamiento Urbano Del Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 4	PENDIENTE LEGALIZAR REDES DE SERVICION PUBLICOS
167-2022	Adecuación Del Parque El Centenario Del Municipio De Bucaramanga.	PENDIENTE LEGALIZACION SERVICIOS PUBLICOS

144-2023	Actividades De Tala Y Manejo Integral Del Componente Arbóreo Ubicados En El Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
146-2022	Mejoramiento De La Señalización Horizontal Y Obras Complementarias En Tramos Viales	SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS PARA ELABORAR ACTA DE RECIBO FINAL
182-2022	Interventoría De Mejoramiento De La Señalización Horizontal Y Obras Complementarias En Tramos Viales Del Municipio De Bucaramanga, Santander.	SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS PARA ELABORAR ACTA DE RECIBO FINAL
266-2021	Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Cultural "Casa Galán" - Grupo 2	EN RECIBO FINAL
215-2023	Suministro De Materiales, Insumos Y Combustibles En El Marco Del Convenio Interadministrativo No. 157 Del 28 De Junio Del 2023, Suscrito Entre El Ministerio De Defensa Y El Municipio De Bucaramanga, Para El Mantenimiento, Mejoramiento Y Rehabilitación De La Malla Vial Urbana En Las Comunas 1 Y 2, Del Municipio De Bucaramanga. Lote 2	ESTÁ RECOLECTÁNDOSE DOCUMENTOS PARA HACER ACTA DE RECIBO FINAL
327-2021	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos Para El Funcionamiento Y Puesta En Marcha Del Teatrino De La Escuela Municipal De Artes (Ema), Mediante El Suministro E Instalación De Equipos De Sonido, Iluminación, Vestimenta Teatral, Sistema De Tramoya Motorizado, Sistema De Acondicionamiento De Graderías Complementarios, Ascensor Y Obras Civiles Del Lobby Del Teatro Santander En El Municipio De Bucaramanga.	SE REALIZO INVENTARIO REQUISITO PARA LIQUIDAR
142-2022	Construcción De Obras De Mitigación Y Recuperación Vial De Los Sectores Afectados En El Marco De La Declaratoria De Calamidad Publica En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Lote 1	APROBACION POLIZAS
446-2022	Interventoría La Adecuación Del Equipamiento Y Escenarios Deportivos Del Municipio De Bucaramanga Santander. Grupo 1	LIQUIDADO A LA FECHA
388-2022	Adecuación De Los Salones Comunes De Los Barrios La Concordia Y San Luis Del Bucaramanga Santander.	PENDIENTE RETIE Y LEGALIZACION
14-2023	Interventoría Al Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Corregimientos 1, 2 Y 3 Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 3	ESTÁ EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

17-2023	Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga. Grupo 1	LIQUIDADO A LA FECHA
18-2023	Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga. Grupo 2	APROBACION POLIZAS
297-2022	Mantenimiento De Puentes Peatonales En El Municipio De Bucaramanga	ESTÁ PROCESO LIQUIDACIÓN
262-2022	“Mejoramiento Y Obras Complementarias A Las Instalaciones Del Centro De Atención Y Reparación Integral De Las Víctimas Caiv	ESPERANDO CDP DE PASIVOS PARA LIQUIDAR
265-2021	“Adecuación De Salas De Paso, Atención Al Usuario Y Unidad De Reacción Inmediata Para La Sede Principal De La Fiscalía General De La Nación En Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL, FALTAN DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION
184-2022	Interventoría a Equipo Urbano En Parques, Escenarios Deportivos	EN LIQUIDACION
41-2022	Interventoría a la adecuación Del Equipamiento Urbano	EN REVISION DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR
134-2021	Interventoría A La Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 1	SE RECIBIO ACTA DE RECIBO FINAL PARA REVISION.
141-2021	Interventoría A La Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 2	PENDIENTE LIQUIDAR OBRA PARA LIQUIDAR INTERVENTORIA
140-2021	Interventoría A La Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 1	EN RECIBO FINAL
48-2022	Interventoría A La Adecuación Del Equipamiento Urbano Del Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 2	PENDIENTE LIQUIDAR OBRA PARA LIQUIDAR INTERVENTORIA
168-2022	Interventoría A La Adecuación Del Parque El Centenario Del Municipio De Bucaramanga, Santander.	PENDIENTE LIQUIDACION OBRA PARA LIQUIDAR INTERVENTORIA
428-2022	Interventoría A La Adecuación De Los Salones Comunes De Los Barrios La Concordia Y San Luis Del Municipio De Bucaramanga.	PENDIENTE LIQUIDACION OBRA PARA LIQUIDAR INTERVENTORIA
430-2022	Interventoria Al Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del	PENDIENTE LIQUIDACION OBRA Y PARA LIQUIDAR INTERVENTORIA

	Municipio De Bucaramanga.	
167-2021	Interventoría A La Adecuación De Salas De Paso, Atención Al Usuario Y Unidad De Reacción Inmediata Para La Sede Principal De La Fiscalía General De La Nación En Bucaramanga Asi Como La Interventoria A La Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Cultural "Casa Galán"	ESPERANDO LIQUIDACIÓN DE OBRA PARA LIQUIDAR INTERVENTORÍA

11. CONTRATOS TERMINADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE Y QUE DEBEN INICIAR PROCESO DE LIQUIDACION

Durante este trimestre se terminaron algunos contratos los cuales se detallan asi:

CONTRATO DE OBRA 34 de 2022 - CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG - ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra finalizado, se realizo visita al parque la Feria con el fin de verificar el estado actual de la obra y realizar su respectiva acta de recibo final

CONTRATO DE OBRA 31 de 2022 - CONSORCIO PARQUES BIO - ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 4

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato ya cuenta con acta de recibo final, se han realizado visitas con el fin de revisar el estado actual del parque y se está en trámite de inclusión a inventarios y liquidación del mismo.

CONTRATO DE OBRA 33 de 2022 - CONSORCIO DEPORTIVO BMG – 22 - ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 5.

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato ya cuenta con acta de recibo final, se han realizado visitas con el fin de revisar el estado actual del parque y se está en trámite de inclusión a inventarios y liquidación del mismo.

CONTRATO DE OBRA 311 de 2022 - MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS - MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato ya finalizó, pero se han presentado inconvenientes a lo cual se han realizado reuniones con el director del CIP y la entidad, además el municipio se encuentra en etapa de recopilación de pruebas para iniciar un presunto sancionatorio.

12. CONTRATACION DE PERSONAL Y PAGO DE SUBSIDIOS A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Durante el primer trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura realizó la contratación del recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 31 DE MARZO 2024
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	\$ 2.198.000.000,00

Igualmente el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos enviados por la Unidad Técnica de Servicios Públicos.

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	\$ 724.043.518,00
EMPAS	\$ 373.428.130,00
EMAB	\$ 952.583.675,00
LIMPIEZA URBANA	\$ 60.265.302,00
METROLIMPIA	\$ 51.253.737,00
VALORTOTAL	\$ 2.161.574.362,00

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas \$ 5,00	Compromisos Acumulados \$ 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial \$ 1,00	Credito	Contracredito	Obligaciones				Pagos Acumulados				
RUBRO	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES												
2.3.2.02.02.005.2402127.53211.289	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 289	\$ 8.548.550.665,00	\$ -	\$ -	\$ 8.548.550.665,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.548.550.665,00	\$ -	0	
2.3.2.02.02.005.2402127.53211.389	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 389	\$ 6.908.248.526,00	\$ -	\$ -	\$ 6.908.248.526,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.908.248.526,00	\$ -	0	
RUBRO	SERVICIOS DE RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES												
2.3.2.02.02.005.3302073.53129.213	SERVICIOS DE RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	\$ 724.441.037,00	\$ -	\$ -	\$ 724.441.037,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724.441.037,00	\$ -	0	
RUBRO	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO												
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO												
2.3.2.02.02.005.4002020.53270.	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 4.375.998.232,00	\$ 329.875.962,00	\$ 3.865.917.477,00	\$ 839.956.717,00	\$ 329.875.962,00	\$ 329.875.962,00	\$ -	\$ -	\$ 510.080.755,00	\$ 329.875.962,00	39,27	
2.3.2.02.02.005.4002020.53270.	ESPACIO PUBLICO ADECUADO OTROS SERVICIOS DE COMIDAS CONTRATADAS 267	\$ 1.363.866.641,00	\$ -	\$ 624.362.094,84	\$ 739.504.546,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.504.546,16	\$ -	0	
2.3.2.02.02.005.4002020.53270.289	ESPACIO PUBLICO ADECUADO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 289	\$ 3.945.484.929,00	\$ -	\$ -	\$ 3.945.484.929,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.945.484.929,00	\$ -	0	
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL												
2.3.2.02.02.005.4002020.53270.389	ESPACIO PUBLICO ADECUADO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 389	\$ 4.264.067.279,00	\$ -	\$ -	\$ 4.264.067.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.264.067.279,00	\$ -	0	
RUBRO	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS												
RUBRO	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO												
2.3.2.02.02.005.4003015.53231.	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 201	\$ 10.034.316.795,00	\$ -	\$ -	\$ 10.034.316.795,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.034.316.795,00	\$ -	0	
2.3.2.02.02.005.4003015.53231.	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 221	\$ 40.006.875,00	\$ -	\$ -	\$ 40.006.875,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.006.875,00	\$ -	0	
2.3.2.02.02.005.4003015.53231.	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 289	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ -	0	
RUBRO	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO												
2.3.2.02.02.005.4301004.53270.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201	\$ -	\$ 188.644.372,00	\$ -	\$ 188.644.372,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.644.372,00	\$ -	0	
2.3.2.02.02.005.4301004.53270.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 267	\$ -	\$ 624.362.094,84	\$ -	\$ 624.362.094,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 624.362.094,84	\$ -	0	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas \$ 5,00	Compromisos Acumulados \$ 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial \$ 1,00	Credito	Contracredito	Obligaciones				Pagos Acumulados				
2.3.2.02.02.008.4599016.85250.	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.142.452.068,00	\$ -	\$ -	\$ 2.142.452.068,00	\$ 1.851.551.299,00	\$ 1.851.551.299,00	\$ -	\$ -	\$ 290.900.769,00	\$ 1.851.551.299,00	86,42	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL												
2.3.2.02.02.008.4599016.85330.	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 34.654.893,00	\$ -	\$ -	\$ 34.654.893,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.654.893,00	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE												
2.3.2.02.02.008.4599016.85970.	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.700.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.700.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.700.000.000,00	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P.												
2.3.2.02.02.008.4599016.87141	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 34.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS.												
2.3.2.02.02.008.4599016.87152	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELCTRICOS DE ILUMINACION.												
2.3.2.02.02.008.4599016.87152	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 8.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000.000,00	\$ -	0	
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA												
RUBRO	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO												
2.3.2.02.02.008.4599031.82120.	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ 97.000.000,00	\$ 253.000.000,00	\$ 98.000.000,00	\$ 98.000.000,00	\$ 4.950.000,00	\$ 4.450.000,00	\$ 155.000.000,00	\$ 93.050.000,00	38,73	
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO												
2.3.2.02.02.008.4599031.83213.	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 230.000.000,00	\$ -	\$ 180.500.000,00	\$ 49.500.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 29.500.000,00	\$ 20.000.000,00	40,4	
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION												
2.3.2.02.02.008.4599031.83321.	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 230.000.000,00	\$ -	\$ 81.500.000,00	\$ 148.500.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 3.016.666,67	\$ 3.016.666,67	\$ 110.500.000,00	\$ 34.983.333,33	25,58	
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.												
2.3.2.02.02.008.4599031.83990.	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 2.300.000.000,00	\$ -	\$ 1.030.600.000,00	\$ 1.269.400.000,00	\$ 394.000.000,00	\$ 374.000.000,00	\$ 14.833.333,34	\$ 12.766.666,67	\$ 875.400.000,00	\$ 359.166.666,66	29,46	
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.												
2.3.2.02.02.008.4599031.85999.	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ 384.400.000,00	\$ 215.600.000,00	\$ 99.600.000,00	\$ 99.600.000,00	\$ 1.983.333,34	\$ 1.983.333,34	\$ 116.000.000,00	\$ 97.616.666,66	46,19	
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS 226	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	0	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Obligaciones				Pagos Acumulados				
		\$ 1,00								\$ 9,00			
	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO					\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00				
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.2.02.02.009.2102011.91123.	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -	0	
	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO												
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE												
2.3.2.02.02.009.2102013.91123.	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	\$ 31.968.046.411,00	\$ -	\$ -	\$ 31.968.046.411,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.968.046.411,00	\$ -	0	
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO												
	GASTOS												
	INVERSION												
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS												
	ADQUISICION DE SERVICIOS												
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION												
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO												
RUBRO	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES												
2.3.2.02.02.005.2402127.53211.	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 282	\$ 1.123.117.762,00	\$ -	\$ -	\$ 1.123.117.762,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.123.117.762,00	\$ -	0	
RUBRO	SERVICIOS DE PARQUEADEROS ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO												
2.3.2.02.02.005.2402127.67430.	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 232	\$ 954.164.309,00	\$ -	\$ -	\$ 954.164.309,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 954.164.309,00	\$ -	0	
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE												
	GASTOS												
	INVERSION												
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS												
	ADQUISICION DE SERVICIOS												
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS												
RUBRO	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.201	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	\$ 857.924.615,00	\$ -	\$ -	\$ 857.924.615,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 857.924.615,00	\$ -	0	
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 8.864.655.397,00	\$ -	\$ -	\$ 8.864.655.397,00	\$ 2.161.574.362,00	\$ 2.161.574.362,00	\$ 1.935.818.204,00	\$ 1.453.552.242,00	\$ 6.703.081.035,00	\$ 225.756.158,00	24,38	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Obligaciones				Pagos Acumulados				
		\$ 1,00											
					3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3	
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.228	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 228	\$ 285.995.156,00	\$ -	\$ -	\$ 285.995.156,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285.995.156,00	\$ -	0	
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.260	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 260	\$ 131.930.573,00	\$ -	\$ -	\$ 131.930.573,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.930.573,00	\$ -	0	
2.3.2.02.02.009.4003047.91123.268	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 268	\$ 33.186.485,00	\$ -	\$ -	\$ 33.186.485,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.186.485,00	\$ -	0	
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		\$ 180.799.516.046,00	\$ 3.845.658.121,84	\$ 6.264.279.571,84	\$ 178.380.894.596,00	\$ 14.410.344.916,80	\$ 14.317.344.916,80	\$ 7.452.759.274,40	\$ 6.877.682.752,36	\$ 163.970.549.679,20	\$ 6.864.585.642,40	8,026277	

RELACION DE REGISTROS (01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
656	29/01/2024 09:35	164	37863152	ENELDA GOMEZ NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL ÁREA PRESUPUESTAL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
657	29/01/2024 09:36	165	63486215	NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS BRINDANDO APOYO EN EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
658	29/01/2024 09:37	163	63499554	MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
716	30/01/2024 09:52	190	1098777640	DANIELA ALEJANDRA CELIS QUINTERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
717	30/01/2024 09:53	191	1098686887	ANGELICA MARCELA HERNANDEZ VELAZCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 28.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 28.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
804	31/01/2024 16:00	216	1096946883	LUZ EMILSEN CASTAÑEDA LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
805	31/01/2024 16:00	217	13873896	WILKES ALFREDO JIMENEZ CASTELLANOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
806	31/01/2024 16:01	218	79710194	CARLOS ALBERTO CARDENAS LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
807	31/01/2024 16:02	219	63350037	LAURA REGINA LOPEZ PRIETO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
848	01/02/2024 11:13	239	1102375286	JHOANNA ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
849	01/02/2024 11:13	241	1098605651	DIANA PATRICIA CARVAJAL FUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
850	01/02/2024 11:14	240	13351098	LUIS ARTURO HERNANDEZ ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
895	02/02/2024 09:33	262	1098730591	IVO ALEJANDRO RIVERA PINILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
896	02/02/2024 09:33	271	1098634006	MELVIN SNEYDER GUTIERREZ SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL Y APOYO TÉCNICO EN EL AREA DE CONTRACCIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
913	02/02/2024 14:55		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 247.533,19	2.3.2.02.02.008.4599 016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 247.533,19	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO 2024 AL 03 DE FEBRERO DE 2024 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E 5767428341 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
914	02/02/2024 14:55		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.282.312,30	2.3.2.02.02.008.4599 016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.282.312,30	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE ENERO 2024 AL 19 FEBRERO DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5772954185 - REFERENCIA 8221383845.
915	02/02/2024 14:58		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.435.197.233,00	2.3.2.02.02.006.4599 016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.435.197.233,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA 215469368 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
916	02/02/2024 14:58		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.306.232,00	2.3.2.02.02.006.4599 016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 3.306.232,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024, SEGÚN FACTURA 216251732 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
998	03/02/2024 10:35	290	1098773016	ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
999	03/02/2024 10:35	291	1098765143	JUAN CAMILO RANGEL ZAPATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1000	03/02/2024 10:36	293	1094948041	MAYCOL ESTIVEN MORALES ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1001	03/02/2024 10:36	307	91106800	WALTER YEZID MARTINEZ VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1002	03/02/2024 10:37	309	1098692371	JUAN SEBASTIAN REY SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1003	03/02/2024 10:37	330	1099204435	SERGIO MAURICIO TELLEZ GAITAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1004	03/02/2024 10:38	331	68295591	ALBA MARINA DELGADO LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1005	03/02/2024 10:38	332	91489166	IVAN DARIO MUÑOZ AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1018	05/02/2024 09:51	343	91256968	BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1029	05/02/2024 13:20		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.220.354,00	2.3.2.02.02.008.4599 016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 5.220.354,00	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL- 23263608 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498
1032	05/02/2024 14:48		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.044.774,00	2.3.2.02.02.008.4599 016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 5.044.774,00	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 , SEGUN FACTURA TBCL-23326566 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498
1090	06/02/2024 10:23	344	91489818	JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1091	06/02/2024 10:24	347	1101687332	WILLIAM JOSE CALA VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
1092	06/02/2024 10:24	348	63348331	LILIANA CARVAJAL SALAMANCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1093	06/02/2024 10:25	350	5685121	ARNULFO OROZCO TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1094	06/02/2024 10:26	390	13874784	WILFRED EMILIO PALACIO VERANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1095	06/02/2024 10:29	391	91213150	IVAN OSWALDO BALLESTEROS PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1096	06/02/2024 10:30	395	1098749339	ROBINSON FABIAN FIGUEROA MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1103	06/02/2024 13:45	396	91348449	JOSE ROBINSON MELON SILVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1104	06/02/2024 13:46	399	13872516	PABLO ANDRES CONTRERAS VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1253	08/02/2024 17:15	468	91180736	LUIS RAUL CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1254	08/02/2024 17:15	474	1098721390	MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1255	08/02/2024 17:16	476	1095820587	LAURA BIBIANA SANCHEZ GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1256	08/02/2024 17:16	477	1095826586	JULIAN ANDRES BOHORQUEZ CASTELLANOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO PARA APOYAR LA GESTION Y EL MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1257	08/02/2024 17:17	492	91540606	EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1258	08/02/2024 17:17	498	1007402713	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1306	09/02/2024 17:03	21	890204851	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 215.500.915,00	2.3.2.02.02.007.4599 016.72212.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 215.500.915,00	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 12 NO 33-51 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1393	13/02/2024 11:22	550	91298539	RAFAEL ANTONIO CHACON RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1394	13/02/2024 11:23	558	63339406	MARIA PATRICIA MONSALVE MONSALVE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1395	13/02/2024 11:23	559	1098700548	JUAN FELIPE RODRIGUEZ ARAMBULA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1396	13/02/2024 11:24	568	37549301	JUDITH BUENO LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1397	13/02/2024 11:25	567	1095804063	JUAN SEBASTIAN VARGAS PADILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1398	13/02/2024 11:26	583	13862036	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1404	13/02/2024 14:51	405	901663044	CONSORCIO AM	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.182.389.445,00	2.3.2.02.02.005.2402 114.53211.213 - VIA URBANA MEJORADA 213	\$ 1.182.389.445,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 405 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-LOTE 1
1405	13/02/2024 14:53	406	901664680	CONSORCIO OBRAS PA-PEI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.085.668.114,00	2.3.2.02.02.005.2402 114.53211.213 - VIA URBANA MEJORADA 213	\$ 1.085.668.114,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 406 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER-LOTE 2
1407	13/02/2024 15:00	169	901114547	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 446.196.571,00	2.3.2.02.02.005.2402 114.53211.201 - VIA URBANA MEJORADA 201	\$ 446.196.571,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 169 DEL 15 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1411	13/02/2024 16:14	452	901667932	CONSORCIO PROVENZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 469.532.746,00	2.3.2.02.02.005.2402 114.53211.213 - VIA URBANA MEJORADA 213	\$ 469.532.746,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 452 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1413	13/02/2024 16:57	11	901668987	CONSORCIO PI CENTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 329.875.962,00	2.3.2.02.02.005.4002 020.53270.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 329.875.962,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 11 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: LA INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1440	14/02/2024 10:34	613	1098631857	OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1441	14/02/2024 10:34	630	1098705956	MARIA FERNANDA NIÑO GUTIERREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1442	14/02/2024 10:35	641	1093798962	KAREN MARCELA GUTIERREZ BARRAGAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1494	15/02/2024 09:16	664	13721027	CESAR JULIAN ACEVEDO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1530	16/02/2024 09:19	691	1098756846	CRISTIAN EDUARDO REY PALACIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1531	16/02/2024 09:20	696	1098683140	OMAR YESID NAVARRO RONDON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1532	16/02/2024 09:20	698	1098682355	JUAN FELIPE CAMARGO JIMENEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ESTRUCTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1533	16/02/2024 09:21	699	91497517	IVAN DARIO ACEVEDO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 28.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 28.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1534	16/02/2024 09:22	704	1098602362	VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ELÉCTRICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1535	16/02/2024 09:23	706	37841760	MARYELY VERA JACOME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL.
1536	16/02/2024 09:23	707	1098741571	LIZETH ANDREA RENGIFO CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1537	16/02/2024 09:24	711	1098649127	JENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1578	19/02/2024 09:43	751	91245880	CARLOS ALIRIO QUINTERO LESMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
1653	19/02/2024 16:49		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.385.375.385,00	2.3.2.02.02.006.4599 016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.385.375.385,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN FACTURA 216641547 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
1665	20/02/2024 09:54	778	1098764172	ALBERTO FELIPE RODRIGUEZ SANABRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1666	20/02/2024 09:54	792	1098766174	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1695	20/02/2024 11:25		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 120.370.274,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 120.370.274,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 0082 \$ 120.370.274,00 VALOR TOTAL \$ 120.370.274,00 - EMPAS
1696	20/02/2024 11:26		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.141.051,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 20.141.051,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LBUC NO.121 \$ 20.141.051,00 VALOR TOTAL \$ 20.141.051-LIMPIEZA URBANA
1697	20/02/2024 11:26		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 241.777.556,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 241.777.556,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 05907 \$ 241.777.556,00 VALOR TOTAL \$ 241.777.556,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
1698	20/02/2024 11:26		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 485.940.544,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 485.940.544,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ES317 \$ 243.381.028,00 Y MES DICIEMBRE SEGÚN FACTURA NO. ES322 \$ 242.559.516,00 VALOR TOTAL \$ 485.940.544,00- EMAB
1736	21/02/2024 08:48	804	1098798625	MARIA CAMILA CARO SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL.
1737	21/02/2024 08:49	805	85450182	ERNESTO RAFAEL MARTINEZ BARLIZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1738	21/02/2024 08:49	821	79646405	WILLIAM DWYGH DUARTE HORMIGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ASISTIR Y ADMINISTRAR TECNOLOGICAMENTE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS - SIA OBSERVA, SCITECH Y SECOP Y DAR CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACION DEL SERVIDOR Y BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y CONFIGURACIONES A USUARIOS FINALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
1739	21/02/2024 08:50	822	91296302	EDGARDO RODRIGUEZ HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
1740	21/02/2024 08:51	823	91350028	ARMANDO JAIMES VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ASISTIR Y ADMINISTRAR TECNOLOGICAMENTE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS - SIA OBSERVA, SCITECH Y SECOP Y DAR CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACION DEL SERVIDOR Y BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y CONFIGURACIONES A USUARIOS FINALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
1741	21/02/2024 08:52	827	91292450	PABLO EMILIO VALENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
1742	21/02/2024 08:53	832	1098774545	JULIETH ALEXANDRA VELASQUEZ CHACON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONTABLES EN EL ÁREA PRESUPUESTAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
1743	21/02/2024 08:53	833	1098725013	DANIEL SANTIAGO SUAREZ CARVAJAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
1798	22/02/2024 11:37	846	1098821134	JORGE NICOLAS CIFUENTES AMADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
1813	22/02/2024 14:39	858	63487585	NELVYS GUTIERREZ PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ASISTIR Y ADMINISTRAR TECNOLOGICAMENTE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS - SIA OBSERVA, SCITECH Y SECOP Y DAR CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACION DEL SERVIDOR Y BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y CONFIGURACIONES A USUARIOS FINALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
1842	23/02/2024 09:04	870	13744164	JHON JAIRO BARAJAS LIZCANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGÍA EN SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1843	23/02/2024 09:05	884	63517554	IHOBANA KHARYN LABRADOR MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE MERCADOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1872	23/02/2024 16:37	902	91486943	EDGAR FABIAN BAEZ ARIZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1873	23/02/2024 16:37	903	1098733228	XIOMARA DAZA SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1874	23/02/2024 16:38	914	1098669467	EDWIN FERNANDO AYALA CADENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1875	23/02/2024 16:38	915	91223276	LUIS FRANCISCO ESCOBAR GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
1876	23/02/2024 16:39	920	91390597	JOSE SAUL ARDILA GUZMAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1877	23/02/2024 16:39	919	5707883	HERMAN MANTILLA SEPULVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1879	23/02/2024 19:25	923	1098683920	LAURA TATIANA EL FEGHALI CELY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA ESPECIALIZADO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
1888	26/02/2024 10:36	925	1098658864	OSCAR ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1895	26/02/2024 11:50	922	3876538	LUIS MIGUEL GARCIA BARRENECHE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1925	26/02/2024 16:48		900677737	METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 51.253.737,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 51.253.737,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-1398 \$ 51.253.737,00 VALOR TOTAL \$ 51.253.737,00 - METROLIMPIA
1926	26/02/2024 16:49		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 124.931.587,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 124.931.587,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES OCTUBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 00754 \$ 124.931.587,00 VALOR TOTAL \$ 124.931.587,00 - EMPAS
1944	27/02/2024 09:48	942	1005372870	YINETH MELISSA ARIAS BUITRAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1945	27/02/2024 09:48	943	30209795	MABEL NAYIBE RUEDA DELGADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1946	27/02/2024 09:49	944	1005280450	DANIEL OMAR DIAZ VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1952	27/02/2024 13:10		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.042.493,00	2.3.2.02.02.006.4599 016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 3.042.493,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE ENERO DE 2024 AL 12 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN FACTURA 217430127 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1953	27/02/2024 13:10		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.110.425,83	2.3.2.02.02.008.4599 016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.110.425,83	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE FEBRERO 2024 AL 19 MARZO DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E 5783564882 - REFERENCIA 8221383845.
2022	28/02/2024 07:05	959	1095831642	MARLON NORBERTO ESPARZA LEON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMO APOYO EN LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
2023	28/02/2024 07:06	957	91536121	ALEXANDER OLAVE SARMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO Y EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA.
2024	28/02/2024 07:07	961	63556197	LUZ ANGELA CABALLERO CORZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
2025	28/02/2024 07:08	967	1098755560	YEISSON LEANDRO POTES REYES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL.
2026	28/02/2024 07:09	970	13747917	EMERSON JAIR BRILLA LACHE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
2027	28/02/2024 07:10	975	1102353678	LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL.
2031	28/02/2024 08:42	968	1102375427	MARIA ALEJANDRA GALAN BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2032	28/02/2024 08:43	969	1098695564	ANGELA MARIA CORREA MENDOZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2082	29/02/2024 14:47	997	1019108075	AILYN CRISTINA OROZCO PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2083	29/02/2024 14:47	1001	91299350	JHON ALEXANDER WILCHES PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2101	29/02/2024 17:07	993	13715998	OSCAR PULIDO CASTELLANOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
2136	01/03/2024 15:38		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 244.390,48	2.3.2.02.02.008.4599 016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 244.390,48	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE FEBRERO 2024 AL 03 DE MARZO DE 2024 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E 5777622367 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2137	01/03/2024 16:10	989	91480154	JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO ESPECIALIZADO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
2138	01/03/2024 16:11	996	91288778	FREDDY HUMBERTO ROJAS OCHOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2146	04/03/2024 10:27	1045	79643218	EDWIN EDUARDO PERILLA SERRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL PROCESO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2147	04/03/2024 10:28	1029	1098670606	CARLOS EDUARDO SANTOS VESGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
2148	04/03/2024 10:30	1030	91282084	WILSON GARCIA DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
2193	05/03/2024 09:04	1054	1095833106	JOSE TOMAS ZULUAGA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2194	05/03/2024 09:07	1058	91474097	FREDY ERNESTO SANCHEZ PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2195	05/03/2024 09:07	1064	1098737736	DAVID ALEXANDER RODRIGUEZ PARADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2240	06/03/2024 09:19	1057	1095842302	DIANA LUCIA PENAGOS DUARTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL.
2241	06/03/2024 10:42	1081	55300011	LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2242	06/03/2024 10:43	1089	1098695624	CARLOS ANDRES HOYOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2243	06/03/2024 10:43	1092	1098767223	JUAN PABLO CLARO PRADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y DEFENSA JUDICIAL
2340	07/03/2024 10:13	1097	1098725933	JESUS FRANCISCO MENDOZA PASTRANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2341	07/03/2024 10:14	1105	13818263	ARMANDO MOGOLLON ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2342	07/03/2024 10:14	1106	1098694658	DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2343	07/03/2024 10:15	1107	91500144	JAIME ALBERTO HURTADO SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2344	07/03/2024 10:15	1108	1005149269	JHON HAIVER ESTEBAN AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2345	07/03/2024 10:16	1111	91496288	CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2374	08/03/2024 09:06	1116	63498324	LUZ NEILA GAMBOA FRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2375	08/03/2024 09:07	1118	1098630399	JUAN CARLOS PLATA NAVARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2414	08/03/2024 15:51	1137	13542276	YECID NUÑEZ CAMPOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
2415	08/03/2024 15:52		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.002.187,00	2.3.2.02.02.008.4599 016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 5.002.187,00	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 , SEGUN FACTURA TBCL-23387657 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498
2429	11/03/2024 10:43	1142	19324953	GUILLERMO HERNANDEZ MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2444	11/03/2024 11:35		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.078.028,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 20.078.028,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LBUC NO.279 \$ 20.078.028,00 VALOR TOTAL \$ 20.078.028,00-LIMPIEZA URBANA
2445	11/03/2024 11:36		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 240.886.973,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 240.886.973,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ENERO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. ES326 \$ 240.886.973,00 VALOR TOTAL \$ 240.886.973,00 - EMAB
2508	12/03/2024 14:54	31	901153192	DETECCIÓN SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA - DETECCIÓN LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.851.551.299,00	2.3.2.02.02.008.4599 016.85250.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.851.551.299,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y MEDIO CANINO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2549	13/03/2024 14:37	1185	1098605320	SILVIA ANDREA FERREIRA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL, DE ARCHIVO Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
2550	13/03/2024 14:38	1184	1090406558	JHAAN CARLOS GARZON ROBLES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
2556	14/03/2024 08:30	1186	91238388	CARLOS ALBERTO TAPIAS MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2557	14/03/2024 08:30	1187	13749972	URIEL SEGUNDO GUARDO MARQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2558	14/03/2024 09:04		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.046.223,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 20.046.223,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LBUC NO.295 \$ 20.046.223,00 VALOR TOTAL \$ 20.046.223,00-LIMPIEZA URBANA
2579	14/03/2024 15:24	1195	91508592	GUSTAVO ADOLFO SIERRA SIERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ADMINISTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS QUE INGRESAN A LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2617	15/03/2024 09:40	1194	1095942578	ANGIE DANIELA FIGUEROA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2628	15/03/2024 16:11	427	804012755	SITELSA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 243.182.450,00	2.3.2.02.02.005.1709 078.53122.201 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ 243.182.450,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 427 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
2641	18/03/2024 11:03		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 128.126.269,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 128.126.269,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 001930 \$ 128.126.269,00 VALOR TOTAL \$ 128.126.269,00 - EMPAS
2645	18/03/2024 13:18		890201230	ELECTRICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.286.799.733,00	2.3.2.02.02.006.4599 016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.286.799.733,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN FACTURA 217785465 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
2692	19/03/2024 10:53	1230	1098727978	SAIDER JESUS GUARGUATI FUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL, DE ARCHIVO Y DE GESTION EN ELFUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2693	19/03/2024 10:55	1228	37860468	MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2707	20/03/2024 11:06	1236	1098661973	OSCAR MAURICIO OREJARENA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2928	22/03/2024 11:04		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 482.265.962,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 482.265.962,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 05944 \$ 235.352.289,00 Y MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 05967 \$ 246.913.673,00 VALOR TOTAL \$ 482.265.962,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
2929	22/03/2024 11:05		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 225.756.158,00	2.3.2.02.02.009.4003 047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 225.756.158,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. ES329 \$ 225.756.158,00 VALOR TOTAL \$ 225.756.158,00,00 - EMAB
2962	22/03/2024 15:52	1272	91516201	DIEGO EDISSON CARDENAS MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599 031.85999.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGÍA ELECTRÓNICO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RELACION PERSONAL (01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024)

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	163	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA JOHANNA	IGLESIAS ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.000.000,00	27/01/2024	30/01/2024	29/05/2024
2024	164	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENELDA	GOMEZ NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL ÁREA PRESUPUESTAL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	27/01/2024	30/01/2024	29/05/2024
2024	165	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NUBIA CONSTANZA	VALENCIA PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS BRINDANDO APOYO EN EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	27/01/2024	30/01/2024	29/05/2024
2024	190	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIELA ALEJANDRA	CELIS QUINTERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	29/01/2024	30/01/2024	29/05/2024
2024	191	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELICA MARCELA	HERNANDEZ VELAZCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 28.000.000,00	29/01/2024	30/01/2024	29/05/2024
2024	216	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ EMILSEN	CASTAÑEDA LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	31/01/2024	01/02/2024	30/05/2024
2024	217	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILKES ALFREDO	JIMENEZ CASTELLANOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	31/01/2024	01/02/2024	30/05/2024
2024	218	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	CARDENAS LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	31/01/2024	01/02/2024	30/05/2024
2024	219	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA REGINA	LOPEZ PRIETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	31/01/2024	01/02/2024	30/05/2024
2024	239	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHOANNA ANDREA	GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	31/01/2024	01/02/2024	30/05/2024
2024	240	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ARTURO	HERNANDEZ ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	31/01/2024	01/02/2024	30/05/2024
2024	241	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA PATRICIA	CARVAJAL FUENTES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	31/01/2024	01/02/2024	30/05/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	262	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVO ALEJANDRO	RIVERA PINILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	01/02/2024	02/02/2024	01/06/2024
2024	271	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MELVIN SNEYDER	GUTIERREZ SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL Y APOYO TÉCNICO EN EL AREA DE CONTRACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	01/02/2024	02/02/2024	01/06/2024
2024	290	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDREA JULIANA	SUAREZ LEAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	02/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	291	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CAMILO	RANGEL ZAPATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	02/02/2024	05/02/2024	04/06/2024
2024	293	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYCOL ESTIVEN	MORALES ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	02/02/2024	05/02/2024	04/06/2024
2024	307	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTER YEZID	MARTINEZ VEGA	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 20.000.000,00	02/02/2024	05/02/2024	04/06/2024
2024	309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	REY SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	02/02/2024	05/02/2024	04/06/2024
2024	330	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO MAURICIO	TELLEZ GAITAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	02/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	331	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA MARINA	DELGADO LOPEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 22.000.000,00	02/02/2024	05/02/2024	04/06/2024
2024	332	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	MUÑOZ AYALA	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 18.000.000,00	02/02/2024	05/02/2024	04/06/2024
2024	343	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BONIFACIO	FLOREZ ANTELIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	03/02/2024	05/02/2024	04/06/2024
2024	344	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALBERTO	ARIAS ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	05/02/2024	06/02/2024	05/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	347	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM JOSE	CALA VALBUENA	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLÓGICO EN CONSTRUCCIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 18.000.000,00	05/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	348	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	CARVAJAL SALAMANCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	05/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	350	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARNULFO	OROZCO TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	05/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	390	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFRED EMILIO	PALACIO VERANO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 16.000.000,00	05/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	391	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN OSWALDO	BALLESTEROS PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	05/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	395	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON FABIAN	FIGUEROA MALDONADO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 16.000.000,00	05/02/2024	06/02/2024	05/06/2024
2024	396	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ROBINSON	MELON SILVA	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 10.000.000,00	06/02/2024	07/02/2024	06/06/2024
2024	399	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PABLO ANDRES	CONTRERAS VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	06/02/2024	07/02/2024	06/06/2024
2024	468	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS RAUL	CARRILLO RIVEROS	" PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 24.000.000,00	08/02/2024	09/02/2024	08/06/2024
2024	474	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYERLY ALEJANDRA	MEDINA CHARRY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	08/02/2024	09/02/2024	08/06/2024
2024	476	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA BIBIANA	SANCHEZ GOMEZ	" PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 20.000.000,00	08/02/2024	09/02/2024	08/06/2024
2024	477	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIAN ANDRES	BOHORQUEZ CASTELLANOS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO PARA APOYAR LA GESTION Y EL MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.000.000,00	08/02/2024	09/02/2024	08/06/2024
2024	492	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR LIBARDO	ORTEGA TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	08/02/2024	09/02/2024	08/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	498	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	08/02/2024	09/02/2024	08/06/2024
2024	550	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANTONIO	CHACON RIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	12/02/2024	13/02/2024	12/06/2024
2024	558	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PATRICIA	MONSALVE MONSALVE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	12/02/2024	13/02/2024	12/06/2024
2024	559	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	RODRIGUEZ ARAMBULA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	12/02/2024	13/02/2024	12/06/2024
2024	567	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	VARGAS PADILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	12/02/2024	13/02/2024	12/06/2024
2024	568	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUDITH	BUENO LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	12/02/2024	13/02/2024	12/06/2024
2024	583	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FERNANDO	QUIÑONES FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	12/02/2024	13/02/2024	12/06/2024
2024	613	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OCTAVIO ANDRES	SANDOVAL GONZALEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	13/02/2024	14/02/2024	13/06/2024
2024	630	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	NIÑO GUTIERREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	13/02/2024	14/02/2024	13/06/2024
2024	641	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN MARCELA	GUTIERREZ BARRAGAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	13/02/2024	14/02/2024	13/06/2024
2024	664	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CESAR JULIAN	ACEVEDO GOMEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 24.000.000,00	14/02/2024	15/02/2024	14/06/2024
2024	691	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN EDUARDO	REY PALACIOS	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 20.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	696	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR YESID	NAVARRO RONDON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024
2024	698	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	CAMARGO JIMENEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ESTRUCTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024
2024	699	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	ACEVEDO GOMEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 28.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024
2024	704	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICTOR ELIAS	MENESES AGRESOTH	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ELÉCTRICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 20.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024
2024	706	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARYELY	VERA JACOME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL	\$ 20.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024
2024	707	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZETH ANDREA	RENGIFO CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024
2024	711	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENNY PAOLA	RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	15/02/2024	16/02/2024	15/06/2024
2024	751	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALIRIO	QUINTERO LESMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 18.000.000,00	16/02/2024	19/02/2024	18/06/2024
2024	778	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBERTO FELIPE	RODRIGUEZ SANABRIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	19/02/2024	20/02/2024	19/06/2024
2024	792	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	19/02/2024	20/02/2024	19/06/2024
2024	804	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA CAMILA	CARO SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL.	\$ 18.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024
2024	805	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERNESTO RAFAEL	MARTINEZ BARLIZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	821	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM DWYGTH	DUARTE HORMIGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ASISTIR Y ADMINISTRAR TECNOLÓGICAMENTE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS - SIA OBSERVA, SCITECH Y SECOP Y DAR CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR Y BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y CONFIGURACIONES A USUARIOS FINALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 20.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024
2024	822	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGARDO	RODRIGUEZ HERRERA	PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024
2024	823	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARMANDO	JAIMES VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ASISTIR Y ADMINISTRAR TECNOLÓGICAMENTE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS - SIA OBSERVA, SCITECH Y SECOP Y DAR CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACION DEL SERVIDOR Y BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y CONFIGURACIONES A USUARIOS FINALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 20.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024
2024	827	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PABLO EMILIO	VALENCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 16.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024
2024	832	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH ALEXANDRA	VELASQUEZ CHACON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONTABLES EN EL AREA PRESUPUESTAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 16.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024
2024	833	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL SANTIAGO	SUAREZ CARVAJAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 20.000.000,00	20/02/2024	21/02/2024	20/06/2024
2024	846	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE NICOLAS	CIFUENTES AMADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 18.000.000,00	21/02/2024	22/02/2024	21/06/2024
2024	858	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELVYS	GUTIERREZ PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ASISTIR Y ADMINISTRAR TECNOLÓGICAMENTE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS - SIA OBSERVA, SCITECH Y SECOP Y DAR CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR Y BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y CONFIGURACIONES A USUARIOS FINALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 18.000.000,00	21/02/2024	23/02/2024	22/06/2024
2024	870	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON JAIRO	BARAJAS LIZCANO	" PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 15.200.000,00	22/02/2024	23/02/2024	22/06/2024
2024	884	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IHOBANA KHARYN	LABRADOR MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE MERCADOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	22/02/2024	23/02/2024	22/06/2024
2024	902	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR FABIAN	BAEZ ARIZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	23/02/2024	26/02/2024	25/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	903	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	XIOMARA	DAZA SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	23/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
2024	914	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN FERNANDO	AYALA CADENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.000.000,00	23/02/2024	24/02/2024	23/06/2024
2024	915	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FRANCISCO	ESCOBAR GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.000.000,00	23/02/2024	24/02/2024	23/06/2024
2024	919	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HERMAN	MANTILLA SEPULVEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 12.800.000,00	23/02/2024	24/02/2024	23/06/2024
2024	920	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE SAUL	ARDILA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 12.000.000,00	23/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
2024	922	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS MIGUEL	GARCIA BARRENECHE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.000.000,00	23/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
2024	923	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA TATIANA	EL FEGHALI CELY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA ESPECIALIZADO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.000.000,00	23/02/2024	24/02/2024	23/06/2024
2024	925	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR ANDRES	RAMIREZ VELASQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 20.000.000,00	23/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
2024	942	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YINETH MELISSA	ARIAS BUITRAGO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 10.000.000,00	26/02/2024	27/02/2024	26/06/2024
2024	943	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MABEL NAYIBE	RUEDA DELGADO	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA."	\$ 15.200.000,00	26/02/2024	27/02/2024	26/06/2024
2024	944	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL OMAR	DIAZ VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	26/02/2024	27/02/2024	26/06/2024
2024	957	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALEXANDER	OLAVE SARMIENTO	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO Y EN LA OPERACIÓN DEL CAMION CANASTA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	\$ 12.800.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	959	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLON NORBERTO	ESPARZA LEON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMO APOYO EN LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 16.000.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024
2024	961	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ ANGELA	CABALLERO CORZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 16.000.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024
2024	967	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YEISSON LEANDRO	POTES REYES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL	\$ 18.000.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024
2024	968	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	GALAN BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024
2024	969	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELA MARIA	CORREA MENDOZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024
2024	970	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EMERSON JAIR	BRILLA LACHE	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.000.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024
2024	975	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS DUVAN	RODRIGUEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL	\$ 20.000.000,00	27/02/2024	28/02/2024	27/06/2024
2024	989	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	GELVEZ ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO ESPECIALIZADO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 24.000.000,00	28/02/2024	01/03/2024	30/06/2024
2024	993	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR	PULIDO CASTELLANOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 20.000.000,00	28/02/2024	29/02/2024	28/06/2024
2024	996	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDDY HUMBERTO	ROJAS OCHOA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.000.000,00	28/02/2024	01/03/2024	30/06/2024
2024	997	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AILYN CRISTINA	OROZCO PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	28/02/2024	01/03/2024	30/06/2024
2024	1001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON ALEXANDER	WILCHES PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	28/02/2024	01/03/2024	30/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1029	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS EDUARDO	SANTOS VESGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.000.000,00	01/03/2024	04/03/2024	03/07/2024
2024	1030	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILSON	GARCIA DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 20.000.000,00	01/03/2024	04/03/2024	03/07/2024
2024	1045	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN EDUARDO	PERILLA SERRANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL PROCESO DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 16.000.000,00	01/03/2024	04/03/2024	03/07/2024
2024	1054	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE TOMAS	ZULUAGA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	04/03/2024	05/03/2024	04/07/2024
2024	1057	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA LUCIA	PENAGOS DUARTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL	\$ 22.000.000,00	04/03/2024	06/03/2024	05/07/2024
2024	1058	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDY ERNESTO	SANCHEZ PLATA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	04/03/2024	05/03/2024	04/07/2024
2024	1064	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAVID ALEXANDER	RODRIGUEZ PARADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	04/03/2024	05/03/2024	04/07/2024
2024	1081	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZETH JOHANA	BAYONA GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 15.200.000,00	05/03/2024	06/03/2024	05/07/2024
2024	1089	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ANDRES	HOYOS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	05/03/2024	06/03/2024	05/07/2024
2024	1092	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN PABLO	CLARO PRADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA JUDICIAL	\$ 24.000.000,00	05/03/2024	06/03/2024	05/07/2024
2024	1097	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESUS FRANCISCO	MENDOZA PASTRANA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	06/03/2024	07/03/2024	06/07/2024
2024	1105	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARMANDO	MOGOLLON ROJAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 12.800.000,00	06/03/2024	07/03/2024	06/07/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1106	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FABIAN	PATIÑO TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 12.800.000,00	06/03/2024	07/03/2024	06/07/2024
2024	1107	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME ALBERTO	HURTADO SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 12.800.000,00	06/03/2024	07/03/2024	06/07/2024
2024	1108	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON HAIVER	ESTEBAN AYALA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 12.800.000,00	06/03/2024	07/03/2024	06/07/2024
2024	1111	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CESAR AUGUSTO	REYES RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	06/03/2024	07/03/2024	06/07/2024
2024	1116	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ NEILA	GAMBOA FRANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	07/03/2024	08/03/2024	07/07/2024
2024	1118	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	PLATA NAVARRO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	07/03/2024	08/03/2024	07/07/2024
2024	1137	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YECID	NUÑEZ CAMPOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTION Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 20.000.000,00	08/03/2024	11/03/2024	10/07/2024
2024	1142	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUILLERMO	HERNANDEZ MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	08/03/2024	11/03/2024	10/07/2024
2024	1184	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHAAN CARLOS	GARZON ROBLES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTION Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 20.000.000,00	13/03/2024	14/03/2024	13/07/2024
2024	1185	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ANDREA	FERREIRA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL, DE ARCHIVO Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 10.000.000,00	13/03/2024	14/03/2024	13/07/2024
2024	1186	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	TAPIAS MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	13/03/2024	14/03/2024	13/07/2024
2024	1187	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URIEL SEGUNDO	GUARDO MARQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL DEL AREA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTION Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	13/03/2024	14/03/2024	13/07/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1194	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE DANIELA	FIGUEROA TORRES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	14/03/2024	15/03/2024	14/07/2024
2024	1195	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUSTAVO ADOLFO	SIERRA SIERRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ADMINISTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS QUE INGRESAN A LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.000.000,00	14/03/2024	15/03/2024	14/07/2024
2024	1228	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	SANDOVAL LOPEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA"	\$ 20.000.000,00	18/03/2024	19/03/2024	18/07/2024
2024	1230	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SAIDER JESUS	GUARGUATI FUENTES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL, DE ARCHIVO Y DE GESTION EN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.000.000,00	18/03/2024	19/03/2024	18/07/2024
2024	1236	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR MAURICIO	OREJARENA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 12.000.000,00	19/03/2024	20/03/2024	19/07/2024
2024	1272	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO EDISSON	CARDENAS MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRÓNICO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 12.000.000,00	22/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2024	1275	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL JOSE	BRICEÑO VERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE ARQUITECTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 10.000.000,00	22/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
